







 Actual Work  Milestone
 Remaining Work  Summary
 Critical



Activity ID	Activity Name	Planned Duration	Start	Finish	Critical	Remaining Labor Units	Gantt Chart																											
							November				December				January				February				March											
							2		3		4		5		6		7		8		9		10											
							5	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11	18					
HEAT TRACING & ISOLATION		24d	20-Jan-23	12-Feb-23		0h																												
A1210	Trabajos previos (habilitación de enchaquetado, etc)	6d	20-Jan-23	25-Jan-23	☐	0h																												
A1220	Instalación de Heat tracing, (suministro por SMI)	8d	26-Jan-23	02-Feb-23	☐	0h																												
A1230	Pruebas y contrastación de calefactor hacia panel	5d	03-Feb-23	07-Feb-23	☐	0h																												
A1240	Enchaquetado	5d	08-Feb-23	12-Feb-23	☐	0h																												
PRECOM &PUESTA EN MARCHA		30d	14-Feb-23	15-Mar-23		5100h																												
Precom y Puesta en Marcha		30d	14-Feb-23	15-Mar-23		5100h																												
Precom, Integración y Star Up		30d	14-Feb-23	15-Mar-23		5100h																												
SC-IPM-1000	Acompañamiento precom, Integración, Puesta en Marcha	30d	14-Feb-23	15-Mar-23	☒	5100h																												

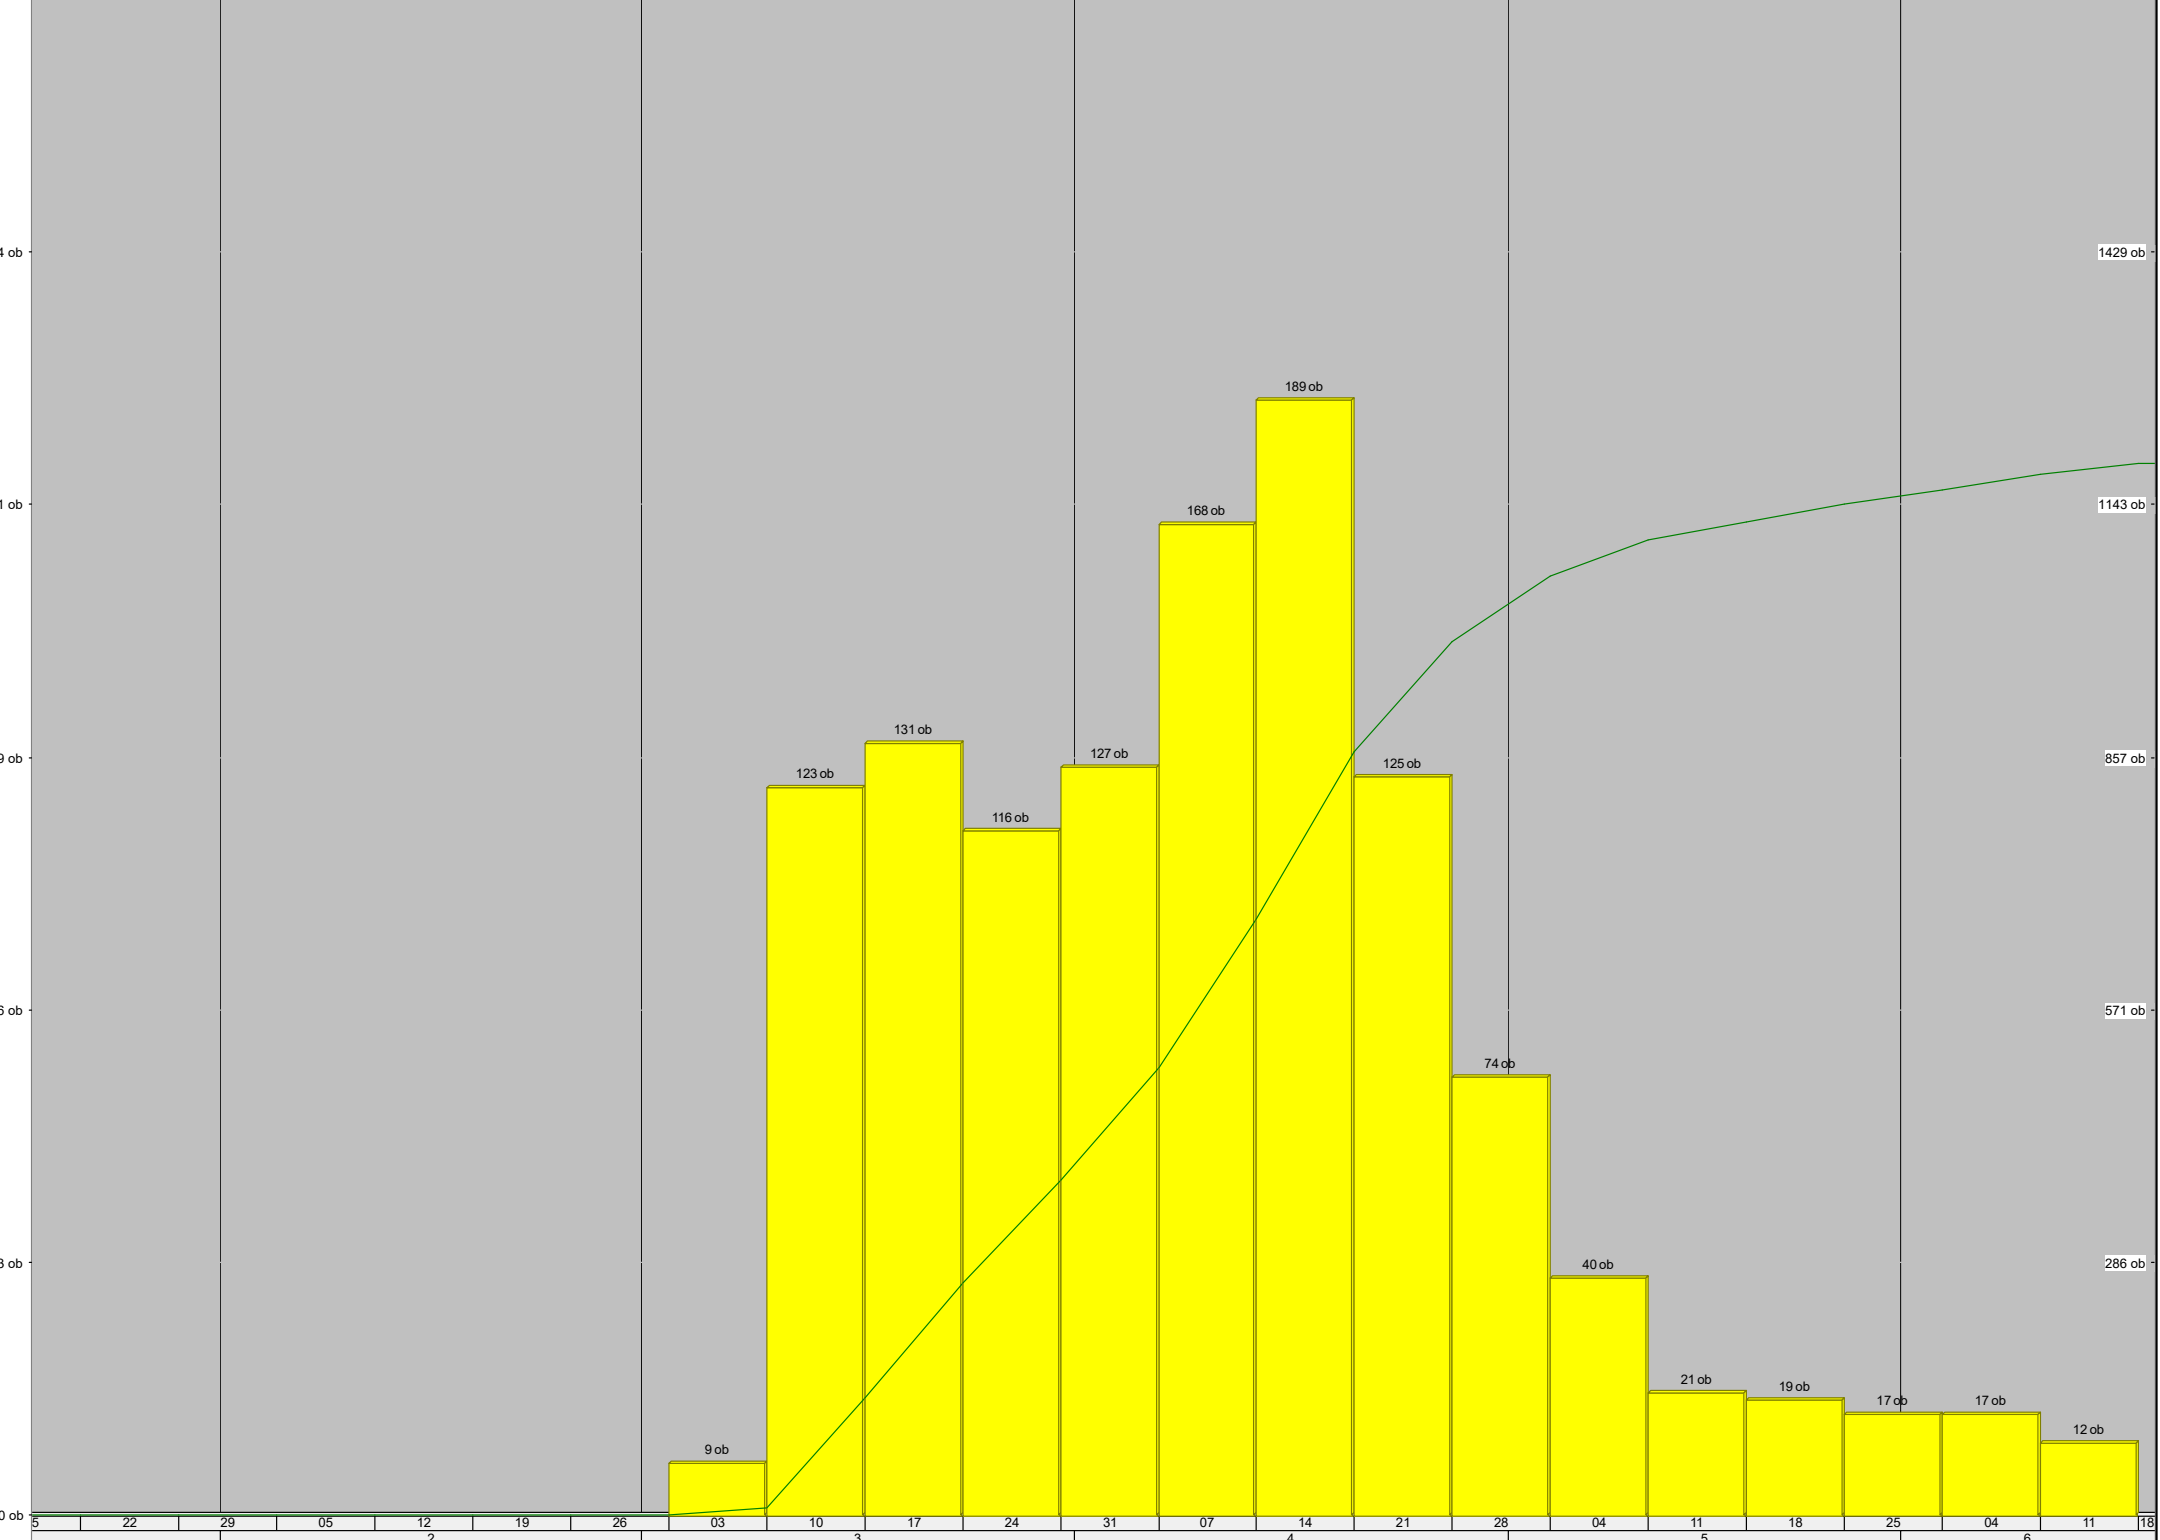

Date	Revision	Checked	Approved
29-Jul-22	REVISIÓN 0	MM	IM

- Actual Work Milestone
 Remaining Work Summary
 Critical
