


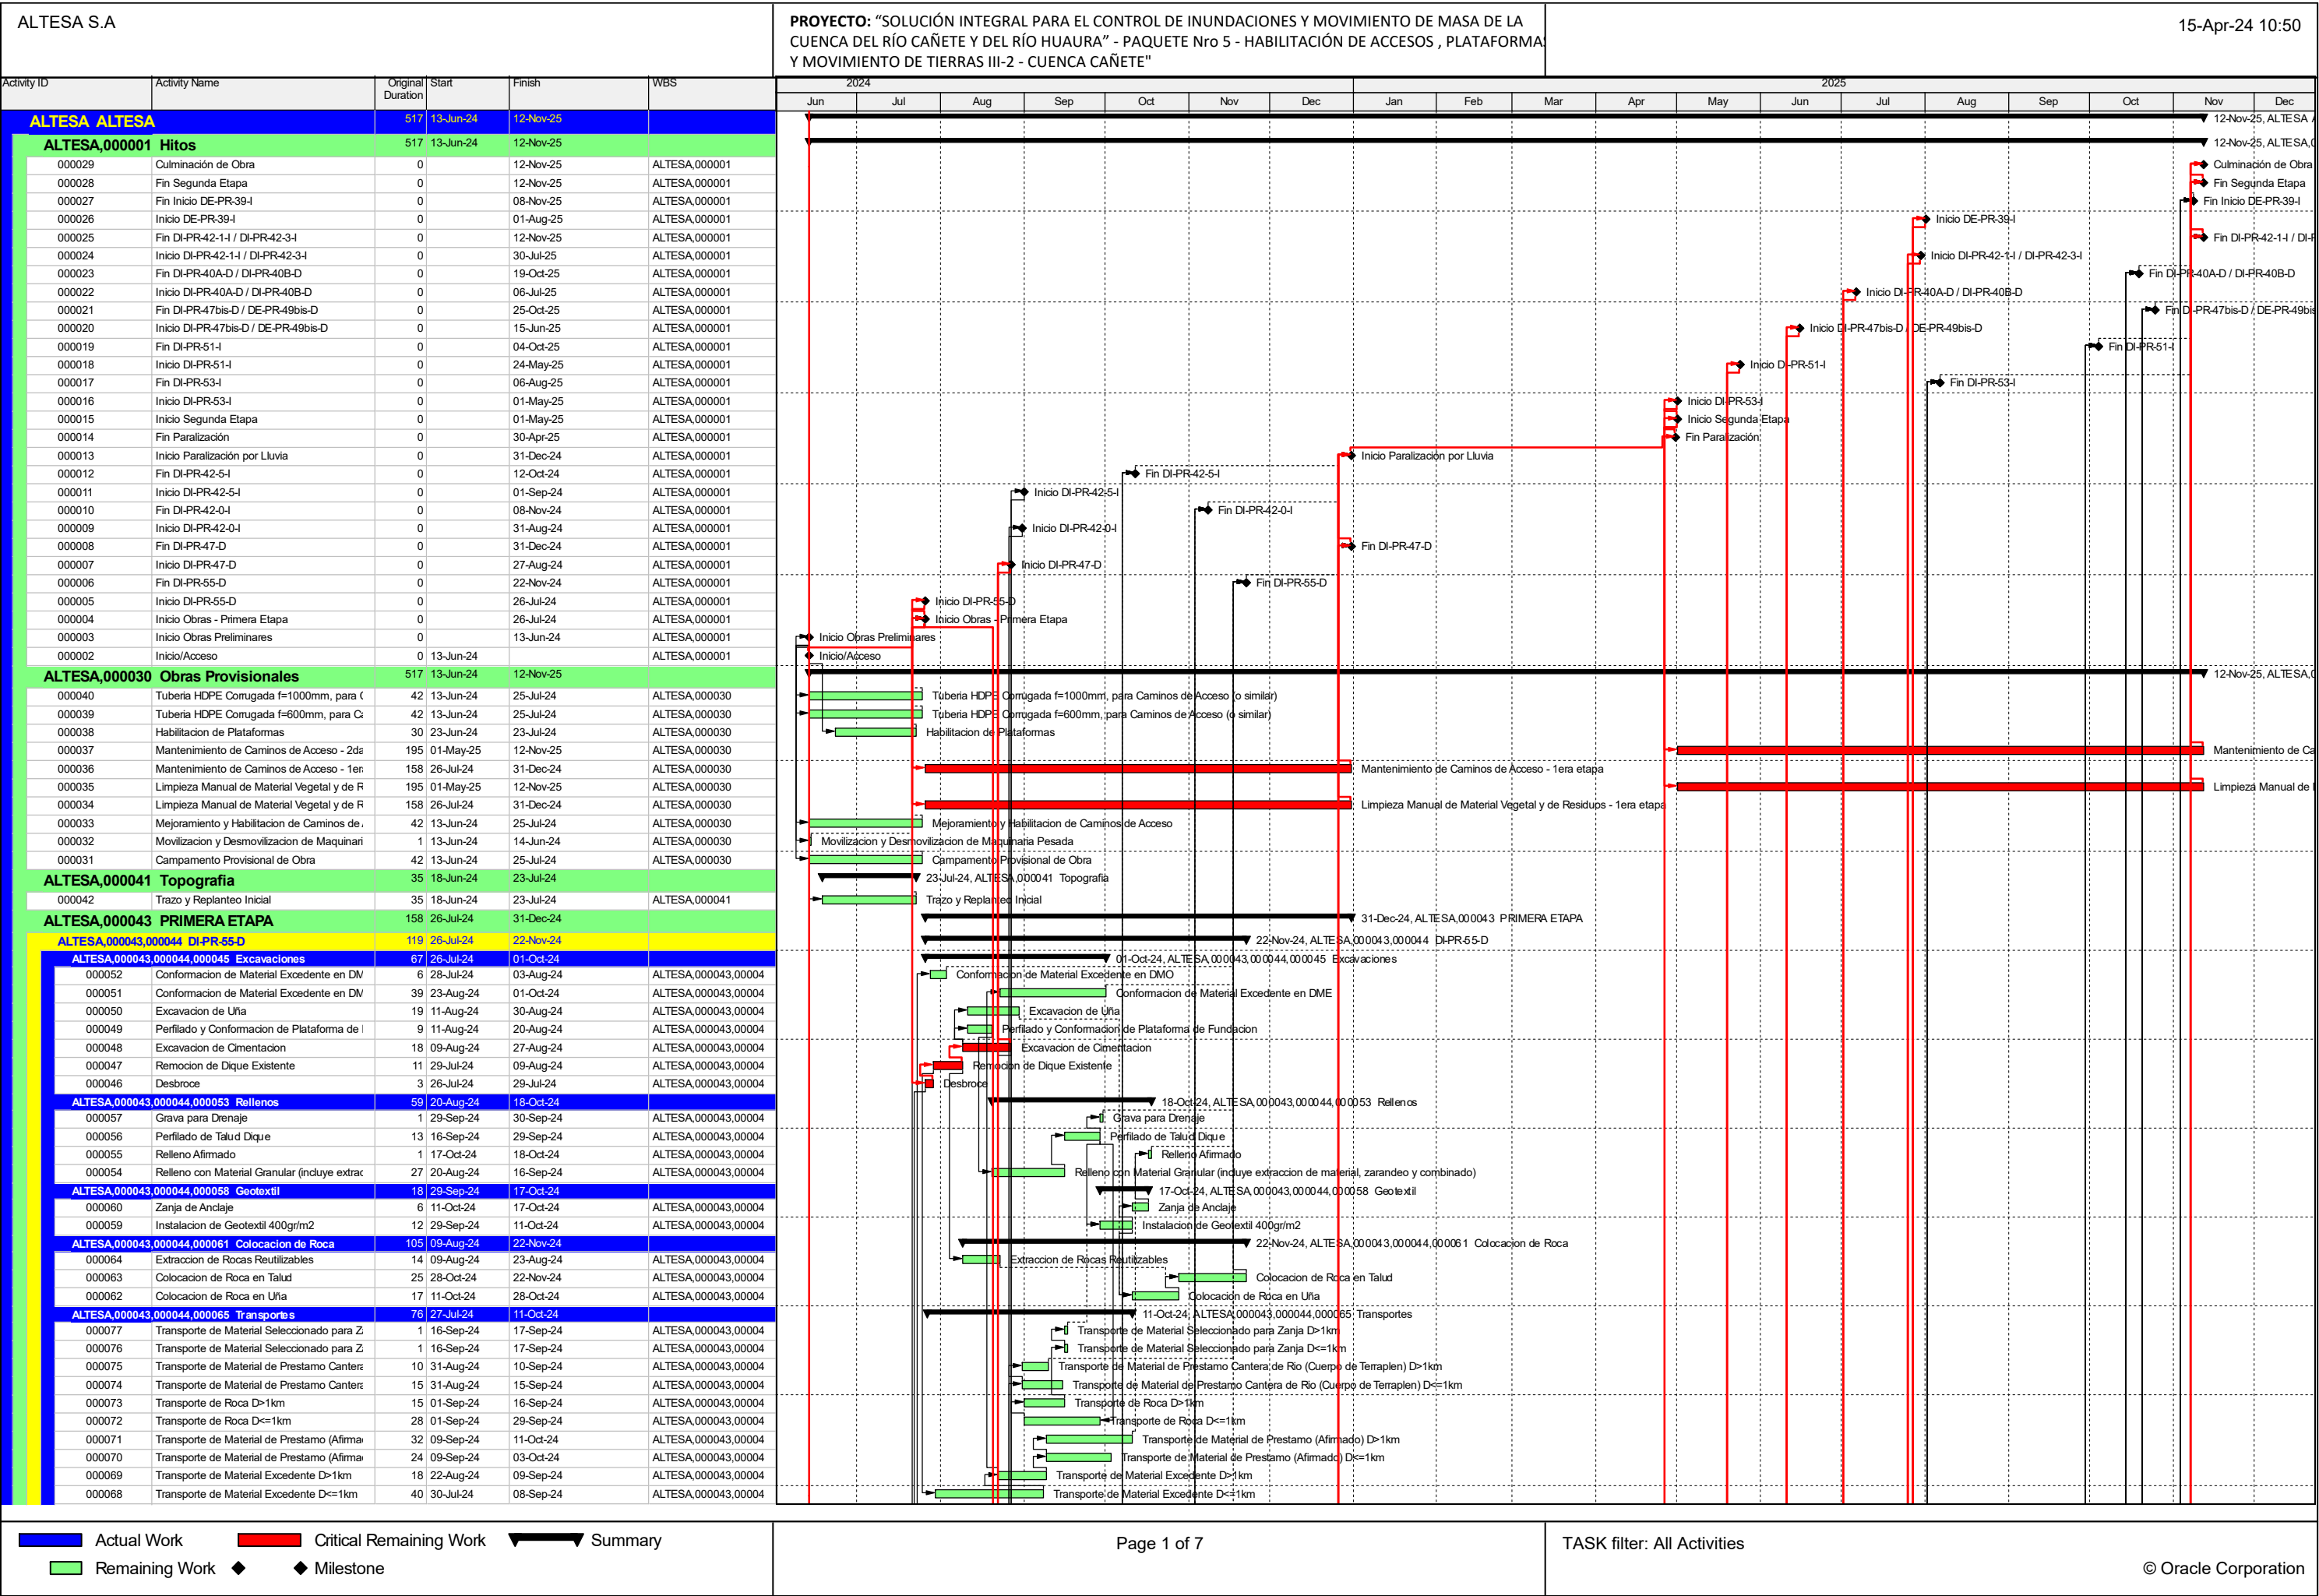

ALTESA S.A						PROYECTO: "SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA" - PAQUETE Nro 5 - HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III-2 - CUENCA CAÑETE"										15-Apr-24 10:50													
Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	WBS	2024												2025											
						Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
	000067	Transporte de Material Organico (a DMO) D<=1km	35	27-Jul-24	31-Aug-24	ALTESA,000043,00004																							
	000066	Transporte de Material Organico (a DMO) D<=1km	24	27-Jul-24	20-Aug-24	ALTESA,000043,00004																							
	ALTESA,000043,000044,000078 Obras Civiles					25	27-Aug-24	21-Sep-24																					
	000086	Pintura bituminosa	6	15-Sep-24	21-Sep-24	ALTESA,000043,00004																							
	000085	Junta de dilatación	1	14-Sep-24	15-Sep-24	ALTESA,000043,00004																							
	000084	Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2	6	28-Aug-24	03-Sep-24	ALTESA,000043,00004																							
	000083	Encofrado y Desencofrado Cara Oculta	2	04-Sep-24	06-Sep-24	ALTESA,000043,00004																							
	000082	Encofrado y Desencofrado Caravista	8	05-Sep-24	13-Sep-24	ALTESA,000043,00004																							
	000081	Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezcla	1	13-Sep-24	14-Sep-24	ALTESA,000043,00004																							
	000080	Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezcla	1	30-Aug-24	31-Aug-24	ALTESA,000043,00004																							
	000079	Concreto de Nivelacion (f'c=100 kg/cm2)	1	27-Aug-24	28-Aug-24	ALTESA,000043,00004																							
	ALTESA,000043,000087 DI-PR-47-D					126	27-Aug-24	31-Dec-24																					
	ALTESA,000043,000087,000088 Excavaciones					52	27-Aug-24	18-Oct-24																					
	000095	Excavacion Localizada - Sobreexcavacion	25	04-Sep-24	29-Sep-24	ALTESA,000043,00008																							
	000094	Conformacion de Material Excedente en DM	7	29-Aug-24	05-Sep-24	ALTESA,000043,00008																							
	000093	Conformacion de Material Excedente en DM	48	31-Aug-24	18-Oct-24	ALTESA,000043,00008																							
	000092	Excavacion de Uña	40	31-Aug-24	10-Oct-24	ALTESA,000043,00008																							
	000091	Perfilado y Conformacion de Plataforma de Fundacion	16	31-Aug-24	16-Sep-24	ALTESA,000043,00008																							
	000090	Excavacion de Cimentacion	12	29-Aug-24	10-Sep-24	ALTESA,000043,00008																							
	000089	Desbroce	4	27-Aug-24	31-Aug-24	ALTESA,000043,00008																							
	ALTESA,000043,000087,000096 Rellenos					96	04-Sep-24	09-Dec-24																					
	000102	Grava para Drenaje	2	21-Sep-24	23-Sep-24	ALTESA,000043,00008																							
	000101	Relleno con Material Seleccionado (incluye extraccion de material, zarandeo y combinado)	13	06-Sep-24	19-Sep-24	ALTESA,000043,00008																							
	000100	Perfilado de Talud Dique	7	14-Sep-24	21-Sep-24	ALTESA,000043,00008																							
	000099	Relleno Afimado	2	21-Nov-24	23-Nov-24	ALTESA,000043,00008																							
	000098	Relleno sin Compactar	4	05-Dec-24	09-Dec-24	ALTESA,000043,00008																							
	000097	Relleno con Material Granular (incluye extraccion de material, zarandeo y combinado)	20	04-Sep-24	24-Sep-24	ALTESA,000043,00008																							
	ALTESA,000043,000087,000103 Geotextil					30	10-Oct-24	09-Nov-24																					
	000105	Zanja de Anclaje	15	25-Oct-24	09-Nov-24	ALTESA,000043,00008																							
	000104	Instalacion de Geotextil 400gr/m2	15	10-Oct-24	25-Oct-24	ALTESA,000043,00008																							
	ALTESA,000043,000087,000106 Colocacion de Roca					38	23-Nov-24	31-Dec-24																					
	000108	Colocacion de Roca en Talud	28	03-Dec-24	31-Dec-24	ALTESA,000043,00008																							
	000107	Colocacion de Roca en Uña	12	23-Nov-24	05-Dec-24	ALTESA,000043,00008																							
	ALTESA,000043,000087,000109 Transportes					85	28-Aug-24	21-Nov-24																					
	000121	Transporte de Material Seleccionado para Zanja D>1km	1	10-Oct-24	11-Oct-24	ALTESA,000043,00008																							
	000120	Transporte de Material Seleccionado para Zanja D<=1km	1	10-Oct-24	11-Oct-24	ALTESA,000043,00008																							
	000119	Transporte de Material de Prestamo Canteras de Rio (Cuerpo de Terraplen) D>1km	20	09-Oct-24	29-Oct-24	ALTESA,000043,00008																							
	000118	Transporte de Material de Prestamo Canteras de Rio (Cuerpo de Terraplen) D<=1km	30	09-Sep-24	09-Oct-24	ALTESA,000043,00008																							
	000117	Transporte de Roca D>1km	45	22-Sep-24	06-Nov-24	ALTESA,000043,00008																							
	000116	Transporte de Roca D<=1km	30	21-Sep-24	21-Oct-24	ALTESA,000043,00008																							
	000115	Transporte de Material de Prestamo (Afimado) D>1km	12	09-Nov-24	21-Nov-24	ALTESA,000043,00008																							
	000114	Transporte de Material de Prestamo (Afimado) D<=1km	8	09-Nov-24	17-Nov-24	ALTESA,000043,00008																							
	000113	Transporte de Material Excedente D>1km	83	30-Aug-24	21-Nov-24	ALTESA,000043,00008					</																		

ALTESA S.A						PROYECTO: "SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA" - PAQUETE Nro 5 - HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III-2 - CUENCA CAÑETE"										15-Apr-24 10:50													
Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	WBS	2024												2025											
						Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
ALTESA,000043,000148,000154	Colocacion de Roca	35	06-Sep-24	11-Oct-24																									
	000156 Malla Gavion de 1m x 1m x 5m	34	07-Sep-24	11-Oct-24	ALTESA,000043,00014																								
	000155 Proteccion de Talud con Colchon Reno 6m Largo x e=0.30m	1	06-Sep-24	07-Sep-24	ALTESA,000043,00014																								
	ALTESA,000043,000148,000157 Transportes	3	01-Sep-24	04-Sep-24																									
	000161 Transporte de Material Excedente D>1km	2	02-Sep-24	04-Sep-24	ALTESA,000043,00014																								
	000160 Transporte de Material Excedente D<=1km	1	02-Sep-24	03-Sep-24	ALTESA,000043,00014																								
	000159 Transporte de Material Organico (a DMO) D>1km	2	01-Sep-24	03-Sep-24	ALTESA,000043,00014																								
	000158 Transporte de Material Organico (a DMO) D<=1km	1	01-Sep-24	02-Sep-24	ALTESA,000043,00014																								
	ALTESA,000043,000148,000162 Obras Civiles	67	02-Sep-24	08-Nov-24																									
	000170 Pintura bituminosa	16	23-Oct-24	08-Nov-24	ALTESA,000043,00014																								
000169 Junta de dilatación	2	21-Oct-24	23-Oct-24	ALTESA,000043,00014																									
000168 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2	17	03-Sep-24	20-Sep-24	ALTESA,000043,00014																									
000167 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta	6	16-Sep-24	22-Sep-24	ALTESA,000043,00014																									
000166 Encofrado y Desencofrado Caravista	23	15-Sep-24	08-Oct-24	ALTESA,000043,00014																									
000165 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezcl	7	08-Oct-24	15-Oct-24	ALTESA,000043,00014																									
000164 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezcl	6	05-Sep-24	11-Sep-24	ALTESA,000043,00014																									
000163 Concreto de Nivelacion (f'c=100 kg/cm2)	1	02-Sep-24	03-Sep-24	ALTESA,000043,00014																									
ALTESA,000043,000171,000172 DI-PR-42-54	41	01-Sep-24	12-Oct-24																										
ALTESA,000043,000171,000172 Excavaciones	17	01-Sep-24	18-Sep-24																										
000176 Conformacion de Material Excedente en DM	1	09-Sep-24	10-Sep-24	ALTESA,000043,00017																									
000175 Conformacion de Material Excedente en DM	1	17-Sep-24	18-Sep-24	ALTESA,000043,00017																									
000174 Excavacion de Cimentacion	3	02-Sep-24	05-Sep-24	ALTESA,000043,00017																									
000173 Desbroce	1	01-Sep-24	02-Sep-24	ALTESA,000043,00017																									
ALTESA,000043,000171,000177 Rellenos	16	23-Sep-24	09-Oct-24																										
000178 Relleno estructural	16	23-Sep-24	09-Oct-24	ALTESA,000043,00017																									
ALTESA,000043,000171,000179 Colocacion de Roca	3	09-Oct-24	12-Oct-24																										
000180 Colocacion de Roca en Talud	3	09-Oct-24	12-Oct-24	ALTESA,000043,00017																									
ALTESA,000043,000171,000181 Transportes	23	02-Sep-24	25-Sep-24																										
000191 Transporte de Material de Prestamo Cantera de Rio (Cuerpo de Terraplen) D>1km	5	18-Sep-24	23-Sep-24	ALTESA,000043,00017																									
000190 Transporte de Material de Prestamo Cantera de Rio (Cuerpo de Terraplen) D<=1km	3	18-Sep-24	21-Sep-24	ALTESA,000043,00017																									
000189 Transporte de Roca D>1km	1	23-Sep-24	24-Sep-24	ALTESA,000043,00017																									
000188 Transporte de Roca D<=1km	2	23-Sep-24	25-Sep-24	ALTESA,000043,00017																									
000187 Transporte de Material de Prestamo (Afirmado) D>1km	1	17-Sep-24	18-Sep-24	ALTESA,000043,00017																									
000186 Transporte de Material de Prestamo (Afirmado) D<=1km	2	17-Sep-24	19-Sep-24	ALTESA,000043,00017																									
000185 Transporte de Material Excedente D>1km	12	05-Sep-24	17-Sep-24	ALTESA,000043,00017																									
000184 Transporte de Material Excedente D<=1km	4	05-Sep-24	09-Sep-24	ALTESA,000043,00017																									
000183 Transporte de Material Organico (a DMO) D>1km	7	02-Sep-24	09-Sep-24	ALTESA,000043,00017																									
000182 Transporte de Material Organico (a DMO) D<=1km	2	02-Sep-24	04-Sep-24	ALTESA,000043,00017																									
ALTESA,000043,000171,000192 Obras Civiles (Interferencia)	22	05-Sep-24	27-Sep-24																										
000206 Compuerta metálica tipo tarjeta 1.40x1.40 m (Suministro e instalacion)	5	22-Sep-24	27-Sep-24	ALTESA,000043,00017																									
000205 Pintura bituminosa	1	23-Sep-24	24-Sep-24	ALTESA,000043,00017																									
000204 Sello en juntas	1	21-Sep-24	22-Sep-24	ALTESA,000043,00017																									
000203 Emboquillado de piedra e=0.30m	2	21-Sep-24	23-Sep-24	ALTESA,000043,00017																									
000202 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2	3	10-Sep-24	13-Sep-24	ALTESA,000043,00017																									
000201 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta	2	14-Sep-24	16-Sep-24	ALTESA,000043,00017																									
000200 Encofrado y Desencofrado Caravista	2	16-Sep-24	18-Sep-24</																										

ALTESA S.A						PROYECTO: "SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA" - PAQUETE Nro 5 - HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III-2 - CUENCA CAÑETE"												15-Apr-24 10:50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	WBS	2024												2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	000230	Instalacion de Geotextil 400gr/m2	17	21-Jun-25	08-Jul-25	ALTESA.000212.00021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

© Oracle Corporation

© Oracle Corporation

© Oracle Corporation
