

K-CC2-170 "Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina"

Cronograma Actualizado - Data Date 27Ene2023 - Chancador Primario y Faja Transportadora

Activity ID	Activity Name	Remaining Duration	Start	Finish	November 2022		December 2022				January 2023				February 2023				March 2023			
					12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11
K170 Primary Crusher & Conveyor Belt - Forecast 4_RevE Master DD 02Se		40	07-Jun-19A	07-Mar-23																		07-Mar-23
K170 - MILESTONES		40	07-Jun-19A	07-Mar-23																		07-Mar-23
K170 - ENGINEERING		0	08-Jul-19A	11-Apr-22 A																		
K170 - PROCUREMENT		0	01-Oct-20A	16-May-22A																		
K170 - CONTRACTS		0																				
K170 - PERMITS		0	14-Jun-19A	13-Jul-19A																		
K170 - EARLY WORKS		0	14-Jun-19A	16-Sep-19A																		
K170 - CONSTRUCCION		40	07-Aug-19A	07-Mar-23																		07-Mar-23
C - EXECUTION FRONT 1		40	07-Aug-19A	07-Mar-23																		07-Mar-23
C - EF1 - 2600 PRIMARY CRUSHER		40	07-Aug-19A	07-Mar-23																		07-Mar-23
C - EF1 - PC - 2610 - Primary Crusher Building		40	07-Aug-19A	07-Mar-23																		07-Mar-23
C - EF1 - PC - PCB - 2610016 - Platform Earthworks Mine Primary Crusher		40	07-Aug-19A	07-Mar-23																		07-Mar-23
C - EF1 - PC - PCB - PEM - 26100160000 - Civil Works		40	07-Aug-19A	07-Mar-23																		07-Mar-23
C - EF1 - 26100160000 - CVW - Excavación		0	07-Aug-19A	24-Oct-19A																		
K170-70528030	C-F1-26100160000-CVW-Excavacion Masiva Terreno Comun	0	07-Aug-19A	23-Aug-19A																		
K170-70528035	C-F1-26100160000-CVW-Excavacion Masiva Terreno Comun (metrado excedente)	0	24-Aug-19A	15-Sep-19A																		
K170-70542310	C-F1-26100160000-CVW-Excavacion Masiva Ripper	0	16-Sep-19A	02-Oct-19A																		
K170-70542320	C-F1-26100160000-CVW-Excavacion Masiva Roca	0	03-Oct-19A	09-Oct-19A																		
K170-A-3000	C-F1-26100160000-CVW-Impacto por Bolonería	0	10-Oct-19A	15-Oct-19A																		
K170-A-3010	C-F1-26100160000-CVW-Impacto por Voladura de otros contratistas (hasta el 21-11-19)	0	16-Oct-19A	20-Oct-19A																		
K170-A-3020	C-F1-26100160000-CVW-Interferencias para el ingreso a obra (hasta el 21-11-19)	0	21-Oct-19A	24-Oct-19A																		
C - EF1 - 26100160000 - CVW - Relleno		32	15-Mar-20A	27-Feb-23																		27-Feb-23
K170-80561190	C-F1-26100160000-CVW-Relleno Masivo Clase CAcceso (Etapa I)	0	15-Mar-20A	12-Jun-20A																		
K170-70542350	C-F1-26100160000-CVW-Relleno Grava DeAislacion (Etapa II)	0	09-Jun-20A	16-Jul-20A																		
K170-70542470	C-F1-26100160000-CVW-Reparación de Fisuras, DesmontajeAndamios	0	09-Jun-20A	09-Jun-20A																		
K170-70542480	C-F1-26100160000-CVW-Relleno Localizado Clase B (Etapa II)	0	18-Jun-20A	17-Jul-20A																		
K170-80561500	C-F1-26100160000-CVW-Relleno Localizado Clase B (Saldo)	0	28-Sep-20A	03-Nov-20A																		
K170-80562680	C-F1-26100160000-CVW-Instalación de Geotextil y Geomembrana (SDC-022)	0	28-Sep-20A	03-Nov-20A																		
K170-80561510	C-F1-26100160000-CVW-Relleno Grava DeAislacion	0	01-Oct-20A	03-Jun-21A																		
K170-70542340	C-F1-26100160000-CVW-Perfilado Plataformas	32	13-Nov-21A	27-Feb-23																		
K170-70542370	C-F1-26100160000-CVW-Afirmado Plataformas Y Caminos	16	28-Jan-22A	27-Feb-23																		
C - EF1 - 26100160000 - CVW - Etapa 01: Sector Norte y este		0	03-Nov-20A	22-Dec-21A																		
K170-80561980	C-F1-26100160000-CVW-Relleno Masivo Clase B - Nivel 1 (Norte y Este)	0	03-Nov-20A	25-Nov-20A																		
K170-80562010	C-F1-26100160000-CVW-Relleno Masivo Clase B - Nivel 2 (Norte y Este)	0	22-Nov-20A	17-Feb-21A																		
K170-80562000	C-F1-26100160000-CVW-Relleno Masivo Clase B - Nivel 1 (Exterior Túnel)	0	24-Nov-20A	17-Feb-21A																		
K170-80562160	C-F1-26100160000-CVW-Retraso RellenoA No cumple Especificación	0	25-Nov-20A	09-Dec-20A																		
K170-80561990	C-F1-26100160000-CVW-Relleno Masivo ClaseA- Nivel 1 (Oeste)	0	10-Dec-20A	07-Jul-21A																		
K170-80562030	C-F1-26100160000-CVW-Relleno Masivo Clase B - Nivel 3 (Norte y Este)	0	29-Jan-21A	22-Dec-21A																		
K170-80562020	C-F1-26100160000-CVW-Relleno Masivo Clase B - Nivel 2 (Oeste Sobre túnel)	0	25-Feb-21A	07-Jul-21A																		
K170-80562050	C-F1-26100160000-CVW-Relleno Masivo Clase C - Nivel 3-5 (Norte y Este)	0	24-Mar-21A	22-Dec-21A																		
K170-80562040	C-F1-26100160000-CVW-Relleno Masivo Clase B - Nivel 4-5 (Norte y Este)	0	31-Mar-21A	22-Dec-21A																		
C - EF1 - 26100160000 - CVW - Etapa 02: Sector Sur (Zona de torre Grúa)		0	07-Nov-20A	14-Aug-21A																		
K170-80562060	C-F1-26100160000-CVW-Relleno Masivo Clase B - Nivel 1 (Sur)	0	07-Nov-20A	21-Jan-21A																		
K170-80562170	C-F1-26100160000-Entibado en Base de Torre Grúa	0	22-Jan-21A	07-Feb-21A																		
K170-80562070	C-F1-26100160000-CVW-Relleno Masivo Clase B - Nivel 2 (Sur)	0	08-Feb-21A	19-Mar-21A																		
K170-80562080	C-F1-26100160000-CVW-Relleno Masivo Clase B - Nivel 3 (Sur)	0	06-May-21A	05-Jul-21A																		
K170-80562090	C-F1-26100160000-CVW-Relleno Masivo Clase B - Nivel 4-5 (Sur)	0	04-Jun-21A	14-Aug-21A																		
K170-80562100	C-F1-26100160000-CVW-Relleno Masivo Clase C - Nivel 3-5 (Sur)	0	06-Jun-21A	14-Aug-21A																		
C - EF1 - 26100160000 - CVW - Berma		8	28-Feb-23	07-Mar-23																		07-Mar-23
K170-70528020	C-F1-26100160000-CVW-Pretil Seguridad	8	28-Feb-23	07-Mar-23																		
C - EF1 - PC - PCB - 2610002 - Primary Crusher Building		0	25-Oct-19A	29-Apr-22A																		
C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020000 - Civil Works		0	30-Oct-19A	05-Mar-21A																		
C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020000 - CVW - Excavación		0	30-Oct-19A	23-Dec-19A																		
K170-70526080	C-F1-26100020000-CVW-Excavacion Escarpe	0	30-Oct-19A	23-Dec-19A																		
C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020000 - CVW - Relleno		0	28-Sep-20A	05-Mar-21A																		
K170-70526090	C-F1-26100020000-CVW-Relleno CamaApoyo Tubería	0	28-Sep-20A	05-Mar-21A																		
C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - Concrete Works		0	25-Oct-19A	29-Apr-22A																		
C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 0 Losa de Cimentación		0	25-Oct-19A	05-May-21A																		
K170-70557960	Montaje de Torre Grúa- Agrummaq	0	02-Jan-20A	16-Jan-20A																		
K170-70558410	Desmontaje de Torre Grúa- Agrummaq	0	07-Oct-20A	09-Oct-20A																		
K170-70558420	Montaje de Torre Grúa- ETAC (Grúa 350Ton)	0	13-Oct-20A	19-Oct-20A																		

K-CC2-170 "Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina"
Cronograma Actualizado - Data Date 27Ene2023 - Chancador Primario y Faja Transportadora

Activity ID	Activity Name	Remaining Duration	Start	Finish	November 2022				December 2022				January 2023				February 2023				March 2023			
					12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11		
	K170-70558440 Desmontaje de Torre Grúa - E TAC	0	01-May-21A	05-May-21A																				
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 0 Solado	0	25-Oct-19A	15-Nov-19A																				
	K170-80560000 C-F1-26100020001-CTW-N0 Limpieza Fundación Tramo 1	0	25-Oct-19A	26-Oct-19A																				
	K170-80560010 C-F1-26100020001-CTW-N0 Vaciado Solado Tramo 1	0	27-Oct-19A	28-Oct-19A																				
	K170-80560020 C-F1-26100020001-CTW-N0 Limpieza Fundación Tramo 2	0	27-Oct-19A	02-Nov-19A																				
	K170-80560030 C-F1-26100020001-CTW-N0 Vaciado Solado Tramo 2	0	03-Nov-19A	04-Nov-19A																				
	K170-80560031 C-F1-26100020001-CTW-N0 Limpieza Fundación Tramo 3	0	03-Nov-19A	08-Nov-19A																				
	K170-80560040 C-F1-26100020001-CTW-N0 Limpieza Fundación Tramo 4	0	09-Nov-19A	12-Nov-19A																				
	K170-80560032 C-F1-26100020001-CTW-N0 Vaciado Solado Tramo 3	0	09-Nov-19A	10-Nov-19A																				
	K170-80560050 C-F1-26100020001-CTW-N0 Vaciado Solado Tramo 4	0	13-Nov-19A	15-Nov-19A																				
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 0 Acero Refuerzo	0																						
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 0 Perno	0	04-Nov-19A	05-Nov-19A																				
	K170-70534200 C-F1-26100020001-CTW-N0 Suministro Y Colocacion Perno	0	04-Nov-19A	05-Nov-19A																				
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 0 Concreto	0	13-Nov-19A	25-Nov-20A																				
	K170-70534210 C-F1-26100020001-CTW-N0 ColocacionAcero - Cimentación	0	13-Nov-19A	07-Dec-19A																				
	K170-70534680 C-F1-26100020001-CTW-N0 Encofrado - Cimentación	0	15-Nov-19A	09-Dec-19A																				
	K170-70534690 C-F1-26100020001-CTW-N0 Vaciado - Cimentación	0	10-Dec-19A	13-Dec-19A																				
	K170-70534710 C-F1-26100020001-CTW-N0 Limpieza Concreto	0	14-Dec-19A	17-Dec-19A																				
	K170-80560900 C-F1-26100020001-CTW-N0 Desencofrado y aceptación	0	18-Dec-19A	04-Jan-20A																				
	K170-80560910 C-F1-26100020001-CTW-N0 Losa de Piso (Interior del Edificio)	0	30-Oct-20A	25-Nov-20A																				
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 1 Muros y Losa	0	31-Dec-19A	30-Oct-20A																				
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 1 Acero Refuerzo	0																						
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 1 Perno	0	16-Jan-20A	07-Feb-20A																				
	K170-70526130 C-F1-26100020001-CTW-N1 Suministro Y Colocacion Perno	0	16-Jan-20A	07-Feb-20A																				
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 1 Concreto	0	31-Dec-19A	30-Oct-20A																				
	K170-A-3060 C-F1-26100020001-CTW-N1 Impacto por Voladura de otros contratistas (22-11-19 al 31-01	0	31-Dec-19A	04-Jan-20A																				
	K170-A-3070 C-F1-26100020001-CTW-N1 Interferencias para el ingreso a obra (22-11-19 al 31-01-20)	0	05-Jan-20A	05-Jan-20A																				
	K170-70526110 C-F1-26100020001-CTW-N1 ColocacionAcero Refuerzo (Etapa I)	0	06-Jan-20A	19-Feb-20A																				
	K170-70534780 C-F1-26100020001-CTW-N1 Colocación Encofrado (Etapa I)	0	16-Jan-20A	29-Feb-20A																				
	K170-70534800 C-F1-26100020001-CTW-N1 Vaciado Concreto Muros	0	22-Jan-20A	08-Mar-20A																				
	K170-70534790 C-F1-26100020001-CTW-N1 Vaciado Concreto Losas (Etapa I)	0	21-Feb-20A	08-Mar-20A																				
	K170-70559940 C-F1-26100020001-CTW-N1 ColocacionAcero Refuerzo	0	09-Jun-20A	18-Jun-20A																				
	K170-70559960 C-F1-26100020001-CTW-N1 Colocación Encofrado	0	13-Jun-20A	23-Jun-20A																				
	K170-70559890 C-F1-26100020001-CTW-N1 Vaciado Concreto Losas	0	20-Jun-20A	24-Jun-20A																				
	K170-80561000 C-F1-26100020001-CTW-N1 Desencofrado y liberación (Etapa II)	0	01-Jul-20A	08-Jul-20A																				
	K170-80561520 C-F1-26100020001-CTW-N1 Desencofrado y liberación	0	12-Oct-20A	30-Oct-20A																				
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 2 Muros y Losa	0	02-Mar-20A	11-Jan-21 A																				
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 2 Acero Refuerzo	0																						
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 2 Perno	0	23-Oct-20A	16-Nov-20A																				
	K170-70534440 C-F1-26100020001-CTW-N2 Suministro Y Colocacion Perno	0	23-Oct-20A	16-Nov-20A																				
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 2 Inserto Especial	0	12-Nov-20A	28-Nov-20A																				
	K170-70567970 C-F1-26100020001-CTW-N2 Suministro Y Colocacion Inserto Especial	0	12-Nov-20A	28-Nov-20A																				
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 2 Concreto	0	02-Mar-20A	11-Jan-21 A																				
	K170-70534980 C-F1-26100020001-CTW-N2 ColocacionAcero Refuerzo (Etapa I)	0	02-Mar-20A	15-Mar-20A																				
	K170-80561540 C-F1-26100020001-CTW-N2 ColocacionAcero Refuerzo Concreto (Etapa II)	0	11-Jun-20 A	16-Jul-20A																				
	K170-80561550 C-F1-26100020001-CTW-N2 Encofrado Concreto (Etapa II)	0	21-Jun-20A	16-Jul-20A																				
	K170-80561530 C-F1-26100020001-CTW-N2 Vaciado Concreto Muros (Etapa II)	0	28-Jun-20A	17-Jul-20A																				
	K170-70534950 C-F1-26100020001-CTW-N2 Encofrado Concreto	0	26-Sep-20A	11-Jan-21 A																				
	K170-70534970 C-F1-26100020001-CTW-N2 Vaciado Concreto Muros	0	08-Oct-20A	16-Nov-20A																				
	K170-70559900 C-F1-26100020001-CTW-N2 Vaciado Concreto Losas	0	04-Nov-20A	11-Jan-21 A																				
	K170-80560930 C-F1-26100020001-CTW-N2 Desencofrado de Losas y Muro	0	20-Nov-20A	10-Jan-21A																				
	K170-70534450 C-F1-26100020001-CTW-N2 ColocacionAcero Refuerzo Concreto	0	21-Nov-20A	22-Dec-20A																				
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 3 Muros y Losa	0	27-Dec-20A	25-Mar-21A																				
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 3 Acero Refuerzo	0																						
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 3 Perno	0	06-Jan-21A	25-Mar-21A																				
	K170-70534480 C-F1-26100020001-CTW-N3 Suministro Y Colocacion Perno	0	06-Jan-21A	25-Mar-21A																				
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 3 Inserto Especial	0	10-Jan-21A	25-Feb-21A																				
	K170-70558000 C-F1-26100020001-CTW-N3 Suministro Y Colocacion Inserto Especial	0	10-Jan-21A	25-Feb-21A																				
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 3 Concreto	0	27-Dec-20A	02-Mar-21A																				
	K170-70535090 C-F1-26100020001-CTW-N3 Encofrado Concreto	0	27-Dec-20A	08-Feb-21A																				
	K170-70535110 C-F1-26100020001-CTW-N3 Vaciado Concreto Muros	0	03-Jan-21A	26-Feb-21A																				
	K170-70534490 C-F1-26100020001-CTW-N3 ColocacionAcero Refuerzo Concreto	0	29-Jan-21A	25-Feb-21A																				
	K170-80560920 C-F1-26100020001-CTW-N3 Desencofrado de Losas y Muro	0	29-Jan-21A	17-Feb-21A																				
	K170-70559910 C-F1-26100020001-CTW-N3 Vaciado Concreto Losas	0	08-Feb-21A	02-Mar-21A																				
	K170-80560970 C-F1-26100020001-CTW-N3 - Pedestales	0	18-Feb-21A	24-Feb-21A																				

Activity ID	Activity Name	Remaining Duration	Start	Finish	November 2022			December 2022			January 2023			February 2023			March 2023					
					12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 4 Muros y Losa	0	03-Feb-21A	20-Apr-21A																		
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 4 Acero Refuerzo	0																				
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 4 Perno	0	11-Feb-21 A	25-Feb-21A																		
	K170-70534520C-F1-26100020001-CTW-N4 Suministro y Colocacion Perno	0	11-Feb-21 A	25-Feb-21A																		
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 4 Concreto	0	03-Feb-21A	20-Apr-21A																		
	K170-70535230C-F1-26100020001-CTW-N4 Encofrado Concreto	0	03-Feb-21A	25-Mar-21A																		
	K170-70535250C-F1-26100020001-CTW-N4 Vaciado Concreto Muros	0	08-Feb-21A	25-Mar-21A																		
	K170-70534530C-F1-26100020001-CTW-N4 ColocacionAcero Refuerzo Concreto	0	26-Feb-21A	13-Apr-21A																		
	K170-70559920C-F1-26100020001-CTW-N4 Vaciado Concreto Losas	0	02-Mar-21A	15-Apr-21A																		
	K170-80560950C-F1-26100020001-CTW-N4 Desencofrado de Losas	0	28-Mar-21A	20-Apr-21A																		
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 5 Muros y Losa	0	14-Apr-21A	21-Aug-21A																		
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 5 Acero Refuerzo	0																				
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 5 Perno	0	01-May-21A	20-May-21A																		
	K170-70534560C-F1-26100020001-CTW-N5 Suministro Y Colocacion Perno	0	01-May-21A	20-May-21A																		
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 5 Concreto	0	14-Apr-21A	21-Aug-21A																		
	K170-70534570C-F1-26100020001-CTW-N5 ColocacionAcero Refuerzo Concreto	0	14-Apr-21A	14-Jul-21A																		
	K170-70535370C-F1-26100020001-CTW-N5 Encofrado Concreto	0	18-Apr-21A	21-Jul-21A																		
	K170-70535390C-F1-26100020001-CTW-N5 Vaciado Concreto Muros	0	21-Apr-21A	28-Jul-21A																		
	K170-70559930C-F1-26100020001-CTW-N5 Vaciado Concreto Losas	0	01-Jun-21A	07-Aug-21A																		
	K170-80560980C-F1-26100020001-CTW-N5 Desencofrado Losa	0	15-Jul-21A	21-Aug-21A																		
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Mortero Nivelación	0	08-Jan-22A	19-Feb-22A																		
	K170-70535430C-F1-26100020001-CTW-Placas Nivelacion Mortero Nivelacion	0	08-Jan-22A	16-Feb-22A																		
	K170-70535440C-F1-26100020001-CTW-Vaciado Mortero Nivelacion	0	22-Jan-22A	19-Feb-22A																		
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 6 Losas de Aproximación	0	15-Jan-22A	29-Apr-22A																		
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 6 Solado	0	05-Feb-22A	19-Feb-22A																		
	K170-70559950C-F1-26100020001-CTW-N6 Vaciado Solado	0	05-Feb-22A	19-Feb-22A																		
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 6 Perno	0	15-Jan-22A	31-Jan-22A																		
	K170-70534850C-F1-26100020001-CTW-N6 Suministro Y Colocacion Perno	0	15-Jan-22A	31-Jan-22A																		
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100020001 - CTW - Nivel 6 Concreto	0	16-Jan-22A	29-Apr-22A																		
	K170-70534860C-F1-26100020001-CTW-N6 ColocacionAcero - Losa+Zapatas+Pedestales	0	16-Jan-22A	25-Apr-22A																		
	K170-70535510C-F1-26100020001-CTW-N6 Encofrado - Losa+Zapatas+Pedestales	0	02-Feb-22A	27-Apr-22A																		
	K170-70535530C-F1-26100020001-CTW-N6 Vaciado - Losa+Zapatas+Pedestales	0	14-Feb-22A	29-Apr-22A																		
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 2610006 - Corrugated Tunnel at Exit Crusher Building	0	09-Mar-20A	08-Aug-22A																		
	C - EF1 - PC - PCB - CTE - 26100060000 - Civil Works	0	22-Nov-20A	24-Jul-21A																		
	C - EF1 - 26100060000 - CVW - Alcantarilla	0	22-Nov-20A	28-Feb-21A																		
	K170-70527930C-F1-26100060000-CVW-Relleno ClaseAy Cama de Arena - Etapa 01	0	22-Nov-20A	23-Feb-21A																		
	K170-70527940C-F1-26100060000-CVW-Pruebas Calidad a Relleno ClaseA (Supermix no cumple es tñr	0	26-Nov-20A	12-Dec-20A																		
	K170-70556550C-F1-26100060000-CVW-Instalacion Tunel Corrugado Galvanizado - Etapa 01	0	27-Nov-20A	28-Feb-21A																		
	K170-80562380C-F1-26100060000-CVW-Instalacion Tunel Corrugado Galvanizado - Etapa 02 (Inc. Anillo	0	21-Dec-20A	14-Jan-21A																		
	K170-80562390C-F1-26100060000-CVW-Relleno ClaseAy Cama de Arena - Etapa 02	0	22-Dec-20A	03-Feb-21A																		
	K170-70527960C-F1-26100060000-CVW-Dimensión de Túnel Menor a Plano / Solución Anillos Concreto	0	03-Jan-21A	12-Feb-21A																		
	C - EF1 - 26100060000 - CVW - PAT	0	01-Jun-21A	24-Jul-21A																		
	K170-70558230C-F1-26300010000-CVW-Excavacion PuestaA Tierra Cimentaciones Faja Sacrificio	0	01-Jun-21A	05-Jun-21A																		
	K170-70558220C-F1-26300010000-CVW-Excavacion PuestaA Tierra Cimentaciones Tunel Corrugado	0	06-Jun-21A	15-Jun-21A																		
	K170-70558320C-F1-26300010006-ELW-Montaje Cable Desnudo PuestaA Tierra Faja Sacrificio	0	06-Jun-21A	12-Jun-21A																		
	K170-70558290C-F1-26300010006-ELW-Montaje Cable Desnudo PuestaA Tierra Tunel Corrugado	0	16-Jun-21A	24-Jul-21A																		
	C - EF1 - PC - PCB - CTE - 26100060001 - Concrete Works	0	09-Mar-20A	08-Aug-22A																		
	C - EF1 - 26100060001 - CTW - Losa de Piso	0	25-Oct-20A	08-Aug-22A																		
	C - EF1 - 26100060001 - CTW - Solado	0	24-Jan-21A	30-Jan-21A																		
	K170-70542090C-F1-26100060001-CTW-Vaciado Solado (interior túnel)	0	24-Jan-21A	30-Jan-21A																		
	C - EF1 - 26100060001 - CTW - Acero Refuerzo	0																				
	C - EF1 - 26100060001 - CTW - Perno	0																				
	C - EF1 - 26100060001 - CTW - Concreto	0	25-Oct-20A	31-May-21A																		
	K170-70527950C-F1-26100060001-CTW-ColocacionAcero Refuerzo Concreto (interior edificio)	0	25-Oct-20A	02-Feb-21A																		
	K170-70542180C-F1-26100060001-CTW-Colocación Encofrado (interior edificio)	0	03-Nov-20A	29-Jan-21A																		
	K170-70542200C-F1-26100060001-CTW-Vaciado Concreto (interior edificio)	0	27-Nov-20A	29-Jan-21A																		
	K170-70542210C-F1-26100060001-CTW-Solución de Ingeniería - Alforamiento de agua en Túnel Corrug	0	01-May-21A	07-May-21A																		
	K170-80562250C-F1-26100060001-CTW-ColocacionAcero Refuerzo Concreto (interior túnel)	0	08-May-21A	20-May-21A																		
	K170-80562260C-F1-26100060001-CTW-Colocación Encofrado (interior túnel)	0	14-May-21A	27-May-21A																		
	K170-80560880C-F1-26100060001-CTW-Vaciado Concreto (interior túnel)	0	20-May-21A	31-May-21A																		
	C - EF1 - 26100060001 - CTW - Mortero Nivelación	0	12-Feb-22A	08-Aug-22A																		
	K170-70542240C-F1-26100060001-CTW-Placas Nivelacion Mortero Nivelacion	0	12-Feb-22A	08-Aug-22A																		
	K170-70542250C-F1-26100060001-CTW-Vaciado Mortero Nivelacion	0	12-Jul-22A	08-Aug-22A																		
	C - EF1 - 26100060001 - CTW - Muro de Contención	0	09-Mar-20A	27-Nov-20A																		

			K-CC2-170 "Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina"																				
			Cronograma Actualizado - Data Date 27Ene2023 - Chancador Primario y Faja Transportadora																				
Activity ID		Activity Name	Remaining Duration	Start	Finish	November 2022			December 2022				January 2023				February 2023				March 2023		
						12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11
	C - EF1 - 26100060001 - CTW - Acero Refuerzo		0																				
	C - EF1 - 26100060001 - CTW - Concreto		0	09-Mar-20A	27-Nov-20A																		
	K170-70556480	C-F1-26100060001-CTW-ColocacionAcero Refuerzo - Muro y sumidero (Etapa I)	0	09-Mar-20A	15-Mar-20A																		
	K170-80561610	C-F1-26100060001-CTW-ColocacionAcero Refuerzo - Muro (Etapa II)	0	22-Jun-20A	12-Jul-20A																		
	K170-80561620	C-F1-26100060001-CTW-Colocación de Encofrado - Muro y sumidero (Etapa II)	0	27-Jun-20A	15-Jul-20A																		
	K170-80561600	C-F1-26100060001-CTW-Vaciado - Concreto Muro Contención Tramo Norte (Etapa II)	0	01-Jul-20A	09-Jul-20A																		
	K170-70556490	C-F1-26100060001-CTW-Colocación de Encofrado - Muro y sumidero	0	15-Sep-20A	27-Oct-20A																		
	K170-70556500	C-F1-26100060001-CTW-ColocacionAcero Refuerzo - Muro	0	15-Sep-20A	26-Oct-20A																		
	K170-80561250	C-F1-26100060001-CTW-Vaciado - Concreto Muro Contención Tramo Norte	0	21-Sep-20A	21-Nov-20A																		
	K170-70556510	C-F1-26100060001-CTW-Vaciado - Concreto Muro Contención Tramo Centro	0	01-Oct-20A	09-Oct-20A																		
	K170-80561240	C-F1-26100060001-CTW-Vaciado - Concreto Muro Contención Tramo Sur	0	12-Oct-20A	27-Nov-20A																		
	C - EF1 - PC - PCB - CTE - 26100060002 - Steel Works		0	21-Oct-21A	29-Jan-22A																		
	C - EF1 - 26100060002 - SSW - Estructura Acero Auxiliar		0	21-Oct-21A	29-Jan-22A																		
	K170-70527980	C-F1-26100060002-SSW-Montaje Estructura Acero Auxiliar	0	21-Oct-21A	29-Jan-22A																		
	C - EF1 - PC - PCB - 2610003 - Retainig Wall and Structural Back Fill		0	29-Jan-21A	30-Dec-21A																		
	C - EF1 - PC - PCB - RWS - 26100030000 - Civil Works		0	29-Jan-21A	30-Dec-21A																		
	C - EF1 - PC - PCB - RWS - 26100030000 - CVW - Relleno		0	29-Jan-21A	30-Dec-21A																		
	K170-80562510	C-F1-26100030000-Definición de Tubería Bajo Muro TEM/ Especific. Material	0	29-Jan-21A	11-Apr-21A																		
	K170-70526140	C-F1-26100030000-CVW-Relleno Estructural TEM Muro 1 (Lado Sur)	0	20-Mar-21A	14-Aug-21A																		
	K170-70558550	C-F1-26100030000-CVW-Muro Tierra TEM Muro 2 (Lado Norte)	0	01-Apr-21A	30-Dec-21A																		
	K170-70558560	C-F1-26100030000-CVW-Relleno Estructural TEM Muro 2 (Lado Norte)	0	01-May-21A	30-Dec-21A																		
	K170-70535570	C-F1-26100030000-CVW-Muro Tierra TEM Muro 1 (Lado Sur)	0	10-May-21A	14-Aug-21A																		
	K170-70559860	C-F1-26100030000-CVW-Muro Tierra TEM Muro 3 (Lado posterior - Este)	0	14-Aug-21A	30-Dec-21A																		
	K170-70559870	C-F1-26100030000-CVW-Relleno Estructural TEM Muro 3 (Lado posterior - Este)	0	21-Aug-21A	30-Dec-21A																		
	C - EF1 - PC - PCB - RWS - 26100030001 - Concrete Works		0																				
	C - EF1 - PC - PCB - 2610004 - Primary Crusher		25	26-Feb-21A	20-Feb-23																		
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100040002 - Steel Works		0	31-Jul-21A	30-Jun-22A																		
	C - EF1 - 26100040002 - SW - Cajas de Escaleras - Interior Edificio		0	31-Jul-21A	08-Oct-21A																		
	K170-70557810	C-F1-26100040002-SSW-Pre-Armado Caja De Escaleras	0	31-Jul-21A	01-Oct-21A																		
	K170-70557820	C-F1-26100040002-SSW-Montaje Caja De Escaleras	0	23-Aug-21A	08-Oct-21A																		
	C - EF1 - 26100040002 - SW - Estructura Acero - Nivel 6		0	17-Sep-21A	29-Jan-22A																		
	K170-70526160	C-F1-26100040002-SSW-Montaje estructura Acero	0	17-Sep-21A	29-Jan-22A																		
	C - EF1 - 26100040002 - SW - Estructura Acero Auxiliar - Nivel 6		0	21-Oct-21A	15-Feb-22A																		
	K170-70526170	C-F1-26100040002-SSW-Montaje Estructura Acero Auxiliar	0	21-Oct-21A	15-Feb-22A																		
	K170-70535580	C-F1-26100040002-SSW-Alomillado, alineación y aceptación	0	13-Nov-21A	15-Feb-22A																		
	C - EF1 - 26100040002 - SW - Riel Puente Grúa		0	14-Feb-22A	30-Jun-22A																		
	K170-80562470	C-F1-26100040002-SSW- Izaje de Puente Grúa	0	14-Feb-22A	30-Jun-22A																		
	K170-70526180	C-F1-26100040002-SSW-Conexión Riel Puente Grúa	0	22-Feb-22A	15-Jun-22A																		
	C - EF1 - 26100040002 - SW - Miscelaneos Edificio de Chancado		0	21-Jun-22A	30-Jun-22A																		
	K170-70560940	Main Shaft Platform	0	21-Jun-22A	30-Jun-22A																		
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100040004 - Mechanical Works		0	26-Feb-21A	16-Aug-22A																		
	C - EF1 - 26100040004 - MW - Montajes Mecánico		0	26-Feb-21A	16-Aug-22A																		
	C - EF1 - 26100040004 - MW - Concentrator Primary Crushing 2610-CR-001		0	26-Feb-21A	12-May-22A																		
	C - EF1 - 26100040004 - MW - Preliminares		0	26-Feb-21A	22-Dec-21A																		
	K170-70561820	C-F1-26100040004-MEW- Posicionamiento Faja de Sacrificio Mesas de Carga (2730-CV	0	26-Feb-21A	28-Feb-21A																		
	K170-70561800	C-F1-26100040004-MEW- Posicionamiento Chutes de Descarga Faja Alimentadora 2 (27	0	12-Mar-21A	19-Mar-21A																		
	K170-70561790	C-F1-26100040004-MEW- Posicionamiento Chute de Alimentación 1 y Carro Cuchara 27.	0	18-Mar-21A	26-Mar-21A																		
	K170-70561810	C-F1-26100040004-MEW- Posicionamiento Primary Crusher Belt Feeder Spile Bar Gate	0	01-May-21A	07-May-21A																		
	K170-80561060	C-F1-26100040004-MEW- Posicionamiento Chute de Alimentación 2 Fino 2730-CV-001-C	0	01-May-21A	07-May-21A																		
K170-80561070	C-F1-26100040004-MEW- Posicionamiento Chutes de Descarga Faja Alimentadora 1 (27	0	01-May-21A	08-May-21A																			
K170-80561080	C-F1-26100040004-MEW- Posicionamiento Primary Crusher Belt Feeder Spile Bar Gate	0	07-May-21A	11-May-21A																			
K170-80561050	C-F1-26100040004-MEW- Posicionamiento Apron Feeder 2730-FE-001	0	11-May-21A	19-May-21A																			
K170-80561090	C-F1-26100040004-MEW- Posicionamiento Apron Feeder 2730-FE-002	0	28-May-21A	10-Jun-21A																			
K170-80561100	C-F1-26100040004-MEW- Revestimiento de la Tolva de Descarga 2610-HO-012	0	21-Jun-21A	22-Dec-21A																			
K170-70560960	C-F1-26100040004-MEW- Armado del Eje del Chancador	0	31-Jul-21A	11-Oct-21A																			
K170-70560950	C-F1-26100040004-MEW- Traslado de equipos Chancador y armado de grúa	0	09-Aug-21A	17-Aug-21A																			
C - EF1 - 26100040004 - MW - Early Equipment		0	01-Mar-21A	18-Jun-21A																			
C - EF1 - 26100040004 - MW - Nivel 1		0	01-Mar-21A	30-Mar-21A																			
K170-70561850	C-F1-26100040004-MEW- 2730-CV-001 Faja Transportadora de Sacrificio (Mesas de Cai	0	01-Mar-21A	30-Mar-21A																			
K170-70561250	C-F1-26100040004-MEW- 2730-CV-001-CH2 Chute de Alimentación 1 y Carro Cuchara	0	10-Mar-21A	27-Mar-21A																			
C - EF1 - 26100040004 - MW - Nivel 2		0	07-Mar-21A	18-Jun-21A																			
K170-70561840	C-F1-26100040004-MEW- 2370-XM-001 Primary Crusher Belt Feeder Spile Bar Gate (p	0	07-Mar-21A	13-Mar-21A																			
K170-70561220	C-F1-26100040004-MEW- 2730-FE-001-CH1 Chute de alimentación del apron feeder	0	28-Mar-21A	09-Apr-21A																			
K170-70561240	C-F1-26100040004-MEW- 2730-FE-001-CH2 Chute de descarga del apron feeder	0	19-Apr-21A	23-Apr-21A																			

K170 Primary Crusher Conveyor Belt

EXECUTION SCHEDULE

Page 4 of 32

Date

29-Apr-22

Revision

REVISIÓN 0

Checked

MM

Approved

IM

Actual Work

Remaining Work

Critical

Milestone

Summary

Cronograma Actualizado - Data Date 27Ene2023 - Chancador Primario y Faja Transportadora

K170-70561260.	C-F1-26100040004-MEW- 2730-MA-001 Magneto faja alimentadora	0	24-Apr-21A	18-Jun-21A
C - EF1 - 26100040004 - MW - Montaje del Cuerpo del Chancador		0	15-May-21A	05-Nov-21A
K170-70560970.	C-F1-26100040004-MEW- Replanteo topografico e instalacion de placas de nivelacion	0	15-May-21A	03-Jun-21A
K170-70560980.	C-F1-26100040004-MEW- Montaje de Bottom Shell (Incluye armado de andamios y topo	0	17-May-21A	10-Jun-21A
K170-70560990.	C-F1-26100040004-MEW- Colocacion y fraguado de Grout	0	11-Jun-21A	16-Jun-21A
K170-70561000.	C-F1-26100040004-MEW- Montaje de Middle Shell (Incluye armado de andamios y topo	0	17-Jun-21A	23-Jun-21A
K170-70561060.	C-F1-26100040004-MEW- Montaje de Top Shell (Incluye armado de andamios y topografi	0	04-Jul-21A	06-Jul-21A
K170-70561050.	C-F1-26100040004-MEW- Armado y montaje de Hidroset	0	06-Jul-21A	09-Jul-21A
K170-70561020.	C-F1-26100040004-MEW- Armado y montaje de Excéntrica	0	21-Jul-21A	11-Aug-21A
K170-70561030.	C-F1-26100040004-MEW- Montaje de Contraje	0	30-Jul-21A	20-Aug-21A
K170-70561010.	C-F1-26100040004-MEW- Instalación de cóncavos	0	01-Aug-21A	09-Aug-21A
K170-70561040.	C-F1-26100040004-MEW- Instalación de la cubierta de polvo (BONET)	0	03-Aug-21A	06-Aug-21A
K170-70561100.	C-F1-26100040004-MEW- Montaje de Araña	0	07-Aug-21A	15-Oct-21A
K170-70561090.	C-F1-26100040004-MEW- 2610-XM-008 revestimiento de la boca de descarga del chanc	0	09-Aug-21A	18-Aug-21A
K170-70561120.	C-F1-26100040004-MEW- 2610-CR-001-LU2 Montaje Motor & Acoplamiento (contraeje)	0	10-Aug-21A	19-Aug-21A
K170-70561110.	C-F1-26100040004-MEW- 2610-XM-005 Sello superior chancado primario	0	10-Aug-21A	03-Nov-21A
K170-70561070.	C-F1-26100040004-MEW- Instalación de cóncavos del cuerpo superior	0	10-Aug-21A	12-Aug-21A
K170-70561080.	C-F1-26100040004-MEW- Montaje de Eje del Chancador	0	18-Aug-21A	05-Nov-21A
C - EF1 - 26100040004 - MW - Adicional: Desmontaje de Spider		0	14-Mar-22A	25-Mar-22A
K170-70561080.10	C-F1-26100040004-MEW- Llegada de Vendor	0	14-Mar-22A	
K170-70561080.20	C-F1-26100040004-MEW- Suministro por SMI de Backing	0	15-Mar-22A	
K170-70561080.40	C-F1-26100040004-MEW- Inicio de trabajos de desmontaje de Spider	0	16-Mar-22A	
K170-70561080.60	C-F1-26100040004-MEW- Fin de trabajos de desmontaje de Spider	0		21-Mar-22A
K170-70561080.30	C-F1-26100040004-MEW- Placas de Nivelación. Espesor a indicación de Vendor	0	24-Mar-22A	
K170-70561080.50	C-F1-26100040004-MEW- Desmontaje de Spider	0	25-Mar-22A	25-Mar-22A
C - EF1 - 26100040004 - MW - Revestimiento de tolvas		0	08-Dec-21A	08-Feb-22A
K170-70560840	C-F1-26100040004-MEW- 2610-HO-001-XM1 Revestimiento tolva de descarga de CR-	0	08-Dec-21A	22-Dec-21A
K170-70560830	C-F1-26100040004-MEW- 2610-HO-001-XM1 Revestimiento de la tolva de recepción de	0	15-Dec-21A	08-Feb-22A
C - EF1 - 26100040004 - MW - Montaje del Carro excéntrico		0	14-Jan-22A	12-May-22A
K170-70561130.	C-F1-26100040004-MEW- 2610-CR-001-XM1 Primary crusher eccentric removal motor	0	14-Jan-22A	12-Feb-22A
K170-70561140.	C-F1-26100040004-MEW- Portón mantención excéntrica 2610-DO-001	0	21-Jan-22A	12-May-22A
C - EF1 - 26100040004 - MW - Belt Feeder		0	07-Apr-21A	10-Jun-21A
K170-70561160.10	C-F1-26100040004-MEW- 2730-FE-001 (Bastidor)	0	07-Apr-21A	01-Jun-21A
K170-70561150.	C-F1-26100040004-MEW- 2730-FE-001 Primary crusher discharge belt feeder	0	14-Apr-21A	31-May-21A
K170-70561160.	C-F1-26100040004-MEW- 2730-FE-001-MO1-MO2 Motor hidráulico 1 Faja alimentadora	0	01-Jun-21A	10-Jun-21A
C - EF1 - 26100040004 - MW - Sistema Hidráulico y de Lubricación		0	01-Aug-21A	16-Dec-21A
K170-70561170.	C-F1-26100040004-MEW- 2610-CR-001-LU2M01 Sistema de sello de polvo Chancador	0	01-Aug-21A	15-Aug-21A
K170-70561180.	C-F1-26100040004-MEW- 2610-CR-001-LU1 Unidad de lubricación e hidráulica primaria	0	14-Aug-21A	06-Oct-21A
K170-70561190.	C-F1-26100040004-MEW- 2610-CR-LU1XM2 Sistema de lubricación de la araña	0	30-Sep-21A	15-Oct-21A
K170-70561200.	C-F1-26100040004-MEW- 2610-CR-001-XM2 Sistema de enfriamiento de aceite chance	0	02-Dec-21A	16-Dec-21A
C - EF1 - 26100040004 - MW - Hydraulic Power Pack (Apron Feeder)		0	19-Aug-21A	08-Jan-22A
K170-70561270.	C-F1-26100040004-MEW- 2730-FE-001-HY1 Unidad hidráulica faja alimentadora	0	19-Aug-21A	08-Jan-22A
K170-70561280.	C-F1-26100040004-MEW- 2730-FE-001-HY1XM1 Unidad de enfriamiento de aceite hidr	0	19-Aug-21A	08-Jan-22A
C - EF1 - 26100040004 - MW - Pica roca		0	25-Dec-21A	19-Jan-22A
K170-70561290.	C-F1-26100040004-MEW- 2610-RK-001 Picarroca chancadora 1	0	25-Dec-21A	15-Jan-22A
K170-70561300.	C-F1-26100040004-MEW- 2610-RK-001-HY1MO1 Motor Unidad Hidraulica del picarroca	0	08-Jan-22A	17-Jan-22A
K170-70561310.	C-F1-26100040004-MEW- 2610-RK-001-HY1 Unidad Hidraulica del picarroca	0	10-Jan-22A	19-Jan-22A
C - EF1 - 26100040004 - MW - Sistema supresor de polvo		0	11-Dec-21A	19-Feb-22A
K170-70560920	C-F1-26100040004-MEW- 2610-DT-001 Primary Crusher 1 dump pcket dust suppressor:	0	11-Dec-21A	19-Feb-22A
C - EF1 - 26100040004 - MW - Concentrator Primary Crushing 2610-CR-002		0	11-Mar-21A	16-Aug-21A
C - EF1 - 26100040004 - MW - Trabajos Preliminares		0	04-Aug-21A	30-Nov-21A
K170-70561330.	C-F1-26100040004-MEW- Armado del Eje del Chancador	0	04-Aug-21A	20-Aug-21A
K170-70561330.10	Llegada de Tuerca de Main Shafr	0		30-Nov-21A
C - EF1 - 26100040004 - MW - Early Equipment		0	11-Mar-21A	20-Jun-21A
C - EF1 - 26100040004 - MW - Nivel 1		0	20-Mar-21A	28-Mar-21A
K170-70561620.	C-F1-26100040004-MEW- 2730-CV-001-CH3 Chule de alimentación 2 faja de sacrificio	0	20-Mar-21A	28-Mar-21A
C - EF1 - 26100040004 - MW - Nivel 2		0	11-Mar-21A	20-Jun-21A
K170-70561600.	C-F1-26100040004-MEW- 2730-XM-002-005-006-019 Compuerta de Lanzas FajaAlime	0	11-Mar-21A	19-Mar-21A
K170-70561610.	C-F1-26100040004-MEW- 2730-FE-002-CH2 Chule de Descarga FajaAlimentadora 1	0	25-Mar-21A	30-Mar-21A
K170-70561590.	C-F1-26100040004-MEW- 2730-FE-002-CH1 Chule de Alimentación FajaAlimentadora	0	07-Apr-21A	10-Apr-21A
K170-70561630.	C-F1-26100040004-MEW- 2730-MA-002 Magneto faja alimentadora 1	0	19-May-21A	20-Jun-21A
C - EF1 - 26100040004 - MW - Montaje del Cuerpo del Chancador		0	17-May-21A	15-Aug-22A
K170-70561340.	C-F1-26100040004-MEW- Replanteo topografico e instalacion de placas de nivelacion	0	17-May-21A	20-Aug-21A
K170-70561350.	C-F1-26100040004-MEW- Montaje de Bottom Shell (Incluye armado de andamios y topo	0	19-May-21A	25-May-21A
K170-70561360.	C-F1-26100040004-MEW- Colocacion y fraguado de Grout	0	23-Jun-21A	29-Jun-21A

K170 Primary Crusher Conveyor Belt EXECUTION SCHEDULE

Page 5 of 32

Date	Revision	Checked	Approved
29-Apr-22	REVISIÓN 0	MM	IM

 Actual Work  Milestone
 Remaining Work  Summary
 Critical

Activity Name		Remaining Duration	Start	Finish	November 2022			December 2022			January 2023			February 2023			March 2023					
					12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11
	K170-70561370.	C-F1-26100040004-MEW- Montaje de Middle Shell (Incluye armado de andamios y topo	0	24-Jun-21A																		
	K170-70561430.	C-F1-26100040004-MEW- Montaje de Top Shell (Incluye armado de andamios y topogral	0	06-Jul-21A																		
	K170-70561420.	C-F1-26100040004-MEW- Armado y montaje de Hidroset	0	07-Jul-21A																		
	K170-70561380.	C-F1-26100040004-MEW- Instalación de cóncavos	0	24-Jul-21A																		
	K170-70561390.	C-F1-26100040004-MEW- Armado y montaje de Excéntrica	0	26-Jul-21A																		
	K170-70561400.	C-F1-26100040004-MEW- Montaje de Contraeje	0	30-Jul-21A																		
	K170-70561460.	C-F1-26100040004-MEW- 2610-XM-018 Revestimiento de la boca de descarga del chan	0	01-Aug-21A																		
	K170-70561490.	C-F1-26100040004-MEW- 2610-CR-001-LU2 Montaje Motor & Acoplamiento (contraeje)	0	07-Aug-21A																		
	K170-70561410.	C-F1-26100040004-MEW- Instalacion de la cubierta de polvo (BONET)	0	07-Aug-21A																		
	K170-70561440.	C-F1-26100040004-MEW- Instalación de cóncavos del cuerpo superior	0	12-Aug-21A																		
	K170-70561450.	C-F1-26100040004-MEW- Montaje de Eje del Chancador	0	13-Aug-21A																		
	K170-70561480.	C-F1-26100040004-MEW- 2610-XM-005 Sello superior chancado primario	0	01-Oct-21A																		
	K170-70561470.	C-F1-26100040004-MEW- Montaje de Araña	0	17-Jul-22A																		
	C - EF1 - 26100040004 - MW - Revestimiento de tolvas		0	16-Dec-21A																		
	K170-70560860	C-F1-26100040004-MEW- 2610-HO-012-XM1 Revestimiento tolva descarga de CR-00	0	16-Dec-21A																		
	K170-70560850	C-F1-26100040004-MEW- 2610-HO-011-XM1 Revestimiento de la tolva de recepción de	0	22-Jan-22A																		
	C - EF1 - 26100040004 - MW - Montaje del Carro excéntrico		0	10-Mar-22A																		
	K170-70561510.	C-F1-26100040004-MEW- Portón mantención excéntrica 2610-DO-002	0	10-Mar-22A																		
	K170-70561500.	C-F1-26100040004-MEW- 2610-CR-001-XM1 Primary crusher eccentric removal motor	0	27-May-22A																		
	C - EF1 - 26100040004 - MW - Sistema Hidráulico y de Lubricación		0	05-Aug-21A																		
	K170-70561520.	C-F1-26100040004-MEW- 2610-CR-002-LU2M01 Sistema de sello de polvo Chancador	0	05-Aug-21A																		
	K170-70561540.	C-F1-26100040004-MEW- 2610-CR-002-LU1 Unidad de lubricación e hidraulica primaria	0	14-Aug-21A																		
	K170-70561530.	C-F1-26100040004-MEW- 2610-CR-002-XM2 Sistema de enfriamiento de aceite chanc	0	26-Nov-21A																		
	K170-70561550.	C-F1-26100040004-MEW- 2610-CR-LU1XM2 Sistema de lubricación de la araña	0	16-Dec-21A																		
	C - EF1 - 26100040004 - MW - Belt Feeder		0	03-May-21A																		
	K170-70561560.	C-F1-26100040004-MEW- 2730-FE-002 Primary crusher discharge belt feeder	0	03-May-21A																		
	K170-70561570.	C-F1-26100040004-MEW- 2730-FE-002-MO1-MO2 Motor hidráulico 1 Faja alimentador	0	11-Dec-21A																		
	C - EF1 - 26100040004 - MW - Hydraulic Power Pack (Apron Feeder)		0	18-Aug-21A																		
	K170-70561650.	C-F1-26100040004-MEW- 2730-FE-002-HY1XM1 Unidad de enfriamiento de aceite hidr	0	18-Aug-21A																		
	K170-70561640.	C-F1-26100040004-MEW- 2730-FE-002-HY1 Unidad hidraulica faja alimentadora	0	11-Dec-21A																		
	C - EF1 - 26100040004 - MW - Sistema supresor de polvo		0	11-Dec-21A																		
	K170-70560910	C-F1-26100040004-MEW- 2610-DT-002 Primary Crusher 1 dump poket dust suppressor	0	11-Dec-21A																		
	C - EF1 - 26100040004 - MW - Pica roca		0	18-Dec-21A																		
	K170-70561660.	C-F1-26100040004-MEW- 2610-RK-002 Picarroca chancadora 2	0	18-Dec-21A																		
	K170-70561670.	C-F1-26100040004-MEW- 2610-RK-002-HY1MO1 Motor Unidad Hidraulica del picarroca	0	07-Jan-22A																		
	K170-70561680.	C-F1-26100040004-MEW- 2610-RK-002-HY1 Unidad Hidraulica del picarroca 2	0	09-Jan-22A																		
	C - EF1 - 26100040004 - MW - Hoist		0	29-Mar-22A																		
	K170-70561690.	C-F1-26100040004-MEW- 2730-HT-003 POLIPASTO ELECTRICO POLEA COLA FA	0	29-Mar-22A																		
	K170-70561700.	C-F1-26100040004-MEW- 2730-HT-005 POLIPASTO ELECTRICO POLEA COLA FA	0	30-Mar-22A																		
	K170-70561710.	C-F1-26100040004-MEW- 2730-HT-009 POLIPASTO ELECTRICO POLEAS FAJAS	0	02-Apr-22A																		
	C - EF1 - 26100040004 - MW - Air compresor primary crusher		0	11-Dec-21A																		
	K170-70561720.	C-F1-26100040004-MEW- 2610-CP-002-002 Compresor de aire Chancado primario	0	11-Dec-21A																		
	K170-70561750.	C-F1-26100040004-MEW- 2610-AR-002 Tanque de aire de instrumentación	0	11-Dec-21A																		
	K170-70561730.	C-F1-26100040004-MEW- 2610-AR-002 Tanque de aire Chancado primario	0	18-Dec-21A																		
	K170-70561740.	C-F1-26100040004-MEW- 2610-DR-002 Secador de aire	0	18-Dec-21A																		
K170-70561760.	C-F1-26100040004-MEW- 2610-FA-002 Primary crusher building air supply fan incluye d	0	15-Jan-22A																			
C - EF1 - 26100040004 - MW - Miscelaneos Edificio del Chancador		0	16-Nov-21A																			
K170-70560880	C-F1-26100040004-MEW- 2610-XM-001,2610-CR-001-XM3MO1-02 Sistema de posici	0	16-Nov-21A																			
K170-70560870	C-F1-26100040004-MEW-2610-XM-002,2610-CR-001-XM3MO1-02 Sistema de posicic	0	11-Dec-21A																			
K170-70561780.	C-F1-26100040004-MEW- 2610-CN-002-003 Puente grua	0	01-Apr-22A																			
K170-70561770.	C-F1-26100040004-MEW- 2610-EL-001 Elevador edificio chancadora primaria	0	27-May-22A																			
C - EF1 - 26100040004 - MW - Dust Colector System		0	18-Dec-21A																			
C - EF1 - 26100040004 - MW - Dust Collector Discharge Chute		0	18-Dec-21A																			
K170-70541010	C-F1-26100040004-MEW-N1 Montaje Recolector Polvo Chute Descarga (2610-BH-002-C	0	18-Dec-21A																			
K170-70541020	C-F1-26100040004-MEW-N1 Montaje Elevador Recolector Polvo Chute Descarga (2610	0	22-Dec-21A																			
K170-70541030	C-F1-26100040004-MEW-N1 Conexionado Recolector Polvo Chute Descarga (2610-BH-	0	28-Dec-21A																			
C - EF1 - 26100040004 - MW - Ductos Sistema Colector De Polvo Chancadora Primaria		0	05-Jan-22A																			
K170-70540970	C-F1-26100040004-MEW-N1 Montaje Ductos Sistema Colector Polvo (2610-BH-002-DU	0	05-Jan-22A																			
K170-70540980	C-F1-26100040004-MEW-N1 Montaje Elevador Ductos Sistema Colector Polvo (2610-BI	0	12-Jan-22A																			
K170-70540990	C-F1-26100040004-MEW-N1 Conexionado Ductos Sistema Colector Polvo (2610-BH-00	0	19-Jan-22A																			
C - EF1 - 26100040004 - MW - Dust Collector System Damper And Hood For Connection To		0	26-Jan-22A																			
K170-70541050	C-F1-26100040004-MEW-N1 Montaje Dust Collector System Damper And Hood Dischai	0	26-Jan-22A																			
K170-70541060	C-F1-26100040004-MEW-N1 Montaje Elevador Dust Collector System Damper And Hoo	0	28-Jan-22A																			
C - EF1 - 26100040004 - MW - Dust Collector System Damper For Connection 1 To Sacrif		0	05-Feb-22A																			
K170-70541090	C-F1-26100040004-MEW-N1 Montaje Dust Collector System Damper To Belt Skirboard (	0	05-Feb-22A																			

K-CC2-170 "Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina"
Cronograma Actualizado - Data Date 27Ene2023 - Chancador Primario y Faja Transportadora

Activity ID	Activity Name	Remaining Duration	Start	Finish	November 2022				December 2022				January 2023				February 2023				March 2023				
					12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11			
C - EF1 - 26100040004 - MW - Dust Collector System Damper For Connection 1 To Sacrifice Bx	K 170-70541100	C-F1-26100040004-MEW-N1 Montaje Elevador Damper For Connection 1 To Sacrifice Bx	0	08-Feb-22A	04-May-22A																				
	C - EF1 - 26100040004 - MW - Dust Collector System Damper For Connection 2 To Sacrif			0	11-Feb-22 A																				04-May-22A
	K 170-70541130	C-F1-26100040004-MEW-N1 Damper For Connection 2 To Sacrifice Belt Skirboard (2610	0	11-Feb-22 A	30-Apr-22A																				
	K 170-70541140	C-F1-26100040004-MEW-N1 Damper For Connection 2 To Sacrifice Belt Skirboard (2610	0	16-Feb-22A	04-May-22A																				
	C - EF1 - 26100040004 - MW - Dust Collector System Damper For Connection 3 To Sacrif			0	05-Feb-22A																				11-Jul-22 A
	K 170-70541170	C-F1-26100040004-MEW-N1 Damper For Connection 3 To Sacrifice Belt Skirboard (2610	0	05-Feb-22A	11-Jul-22 A																				
	K 170-70541180	C-F1-26100040004-MEW-N1 Damper For Connection 3 To Sacrifice Belt Skirboard (2610	0	12-Feb-22A	30-Apr-22A																				
	C - EF1 - 26100040004 - MW - Dust Collector System Damper For Connection 4 To Sacrif			0	05-Feb-22A																				05-May-22A
	K 170-70541210	C-F1-26100040004-MEW-N1 Damper For Connection 4 To Sacrifice Belt Skirboard (2610	0	05-Feb-22A	01-May-22A																				
	K 170-70541220	C-F1-26100040004-MEW-N1 Montaje damper For Connection 4 To Sacrifice Belt Skirboa	0	12-Feb-22A	05-May-22A																				
	C - EF1 - 26100040004 - MW - Dust Collector System Damper For Connection To Fe-002 D			0	12-Feb-22A																				05-May-22A
	K 170-70541250	C-F1-26100040004-MEW-N1 Damper For Connection To Fe-002 Discharge Chute (2610-I	0	12-Feb-22A	01-May-22A																				
	K 170-70541260	C-F1-26100040004-MEW-N1 Damper For Connection To Fe-002 Discharge Chute (2610-I	0	16-Feb-22A	05-May-22A																				
	C - EF1 - 26100040004 - MW - Dust Collector System Ductwork (Filter And Fan Connecti			0	19-Feb-22A																				02-May-22A
	K 170-70541290	C-F1-26100040004-MEW-N1 Colector Polvo Conexión Filtro Y Vellador (2610-BH-002-D	0	19-Feb-22A	30-Apr-22A																				
	K 170-70541300	C-F1-26100040004-MEW-N1 Sistema Colector Polvo Conexión Filtro Y Vellador (2610-E	0	28-Feb-22A	02-May-22A																				
	C - EF1 - 26100040004 - MW - Dust Collector System Stack			0	21-Jan-22A																				25-Feb-22A
	K 170-70541330	C-F1-26100040004-MEW-N1 Montaje Sistema Recolector Polvo (2610-BH-002-DU3)	0	21-Jan-22A	25-Feb-22A																				
	K 170-70541340	C-F1-26100040004-MEW-N1 Montaje Elevador Sistema Recolector Polvo (2610-BH-002	0	21-Jan-22A	18-Feb-22A																				
	C - EF1 - 26100040004 - MW - Sistema Colector De Polvo Chancado Primario			0	18-Feb-22A																				13-May-22A
	K 170-70540870	C-F1-26100040004-MEW-N1 Montaje Sistema Colector Polvo (2610-BH-002)	0	18-Feb-22A	08-Mar-22A																				
	K 170-70540880	C-F1-26100040004-MEW-N1 Montaje Elevador Sistema Colector Polvo (2610-BH-002)	0	20-Feb-22A	13-May-22A																				
	C - EF1 - 26100040004 - MW - Sistema de Ventilación del colector de polvo			0	20-Mar-22A																				30-Jul-22A
	K 170-70560900	Conexiado al sistema de ventilación del colector de polvo	0	20-Mar-22A	30-Jul-22A																				
	C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100040005 - Piping Works			0	07-May-21A																				12-Jul-22A
	C - EF1 - 26100040005 - PPW - Fabricación Spools			0																					
	C - EF1 - 26100040005 - PPW - Fabricación Uniones Spools			0																					
	C - EF1 - 26100040005 - PPW - Instalación Tuberías			0	07-May-21A																				06-May-22A
	K 170-80561150	C-F1-26100040005-PPW- Nivel 01_2 Soporte de Tubería de Líneas de Agua y Aire - Extra	0	07-May-21A	15-Jun-21A																				
	K 170-80561110	C-F1-26100040005-PPW- Nivel 01_1 Soporte de Tubería de Líneas de Agua y Aire - Extra	0	22-May-21A	20-Jun-21A																				
	K 170-80561130	C-F1-26100040005-PPW- Nivel 02 Soporte de Tubería de Líneas de Agua y Aire - Extracci	0	21-Jun-21A	11-Dec-21A																				
	K 170-80561160	C-F1-26100040005-PPW- Nivel 03 Soporte de Tubería de Líneas de Agua y Aire - Extracci	0	30-Jul-21A	18-Dec-21A																				
	K 170-70531740	C-F1-26100040005-PPW-Instalación Tuberías (NIVEL 02)	0	27-Aug-21A	29-Jan-22A																				
	K 170-70531750	C-F1-26100040005-PPW-Instalación Tuberías (NIVEL 03)	0	06-Sep-21A	30-Apr-22A																				
	K 170-80562690	C-F1-26100040005-PPW- Instalacion Tuberías	0	12-Oct-21A	06-May-22A																				
	K 170-70531760	C-F1-26100040005-PPW-Instalación Tuberías (NIVEL 04)	0	14-Oct-21A	30-Apr-22A																				
	K 170-70531710	C-F1-26100040005-PPW- Instalacion Tuberías (NIVEL 05)	0	20-Oct-21A	04-May-22A																				
	K 170-70531730	C-F1-26100040005-PPW-Instalación Tuberías (NIVEL 01)	0	08-Jan-22A	12-Feb-22A																				
C - EF1 - 26100040005 - PPW - Instalación Spools			0																						
C - EF1 - 26100040005 - PPW - Instalación Uniones Tuberías			0																						
C - EF1 - 26100040005 - PPW - Modificación Spools			0																						
C - EF1 - 26100040005 - PPW - Pruebas Tuberías			0	09-Dec-21A	12-Jul-22A																				
K 170-70556660	C-F1-26100040005-PPW-Realizacion Pruebas Tuberías	0	09-Dec-21A	12-Jul-22A																					
C - EF1 - 26100040005 - PPW - Pruebas Spools			0																						
C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100040007 - I&C Works			25	12-Jul-21A	20-Feb-23																				
C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100040007 - ICW - Instrumentación y Control			25	12-Jul-21A	20-Feb-23																				
K 170-80561170	C-F1-26100040007-ICW- Nivel 01 Canalizaciones y Soportes	0	12-Jul-21A	24-Dec-21A																					
K 170-80561120	C-F1-26100040007-ICW- Nivel 02 Canalizaciones y Soportes	0	24-Jul-21A	31-Dec-21A																					
K 170-80561140	C-F1-26100040007-ICW- Nivel 03 Canalizaciones Instrumentación	0	06-Aug-21A	08-Jan-22A																					
K 170-80561180	C-F1-26100040007-ICW- Nivel 04 Canalizaciones Instrumentación	0	11-Aug-21A	08-Jan-22A																					
K 170-70527760	C-F1-26100040007-ICW-Colocación de Soportes de instrumentos	0	28-Aug-21A	08-Jan-22A																					
K 170-70527750	C-F1-26100040007-ICW-Canalización y Cableado	0	10-Dec-21A	15-Jan-22A																					
K 170-70527780	C-F1-26100040007-ICW-Instalación de Sensores / Transmisores y Otros Instrumentos	0	28-Dec-21A	14-Sep-22A																					
K 170-70527830	C-F1-26100040007-ICW-Conexionado y Pruebas finales 2610-CR-001	0	08-Jan-22A	10-May-22A																					
K 170-70527770	C-F1-26100040007-ICW-Instalación de Cámaras y Gabinetes CCTV	25	19-Jan-22A	20-Feb-23																					
K 170-70536490	C-F1-26100040007-ICW-Conexionado y Pruebas finales 2610-CR-002	0	12-May-22A	05-Sep-22A																					
C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100040007 - ICW - Gabinete CCTV			0																						
C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100040007 - ICW - Gabinete de Comunicación			0																						
C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100040007 - ICW - Panel			0																						
C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100040007 - ICW - Placa de Montaje			0																						
C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100040007 - ICW - Rack Remoto			0																						
C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100040007 - ICW - Tablero			0																						
C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100040007 - ICW - Unidad de Comunicación			0																						

K-CC2-170 "Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina"
Cronograma Actualizado - Data Date 27Ene2023 - Chancador Primario y Faja Transportadora

[illegible]

K170 Primary Crusher Conveyor Belt EXECUTION SCHEDULE

Page 8 of 32

Date	Revision	Checked	Approved
29-Apr-22	REVISIÓN 0	MM	IM

 Actual Work  Milestone
 Remaining Work  Summary
 Critical

K-CC2-170 "Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina"
Cronograma Actualizado - Data Date 27Ene2023 - Chancador Primario y Faja Transportadora

Activity ID		Activity Name	Remaining Duration	Start	Finish	November 2022				December 2022				January 2023				February 2023				March 2023			
						12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11		
		C - EF1 - PC - PCS - SER - 26300010002 - Steel Works	0	14-Aug-21A	12-Nov-21A																				
		C - EF1 - 26300010002 - SSW - Estructura Acero	0	14-Aug-21A	12-Nov-21A																				
		K170-70542610	C-F1-26300010002-SSW-Montaje EstructuraAcero	0	14-Aug-21A	12-Nov-21A																			
		C - EF1 - PC - PCS - SER - 26300010006 - Electrical Works	0	01-Apr-21A	16-Aug-22A																				
		C - EF1 - PC - PCS - SER - 26300010006 - Tramo Sala Eléctrica	0	01-Apr-21A	06-Aug-22A																				
		C - EF1 - 26300010006 - ELW - Sala Eléctrica	0	29-Jul-21A	06-Oct-21A																				
		K170-80562440	C-F1-26300010006-ELW-Izaje de Sala Eléctrica / Transformadores	0	29-Jul-21A	09-Aug-21A																			
		K170-70528250	C-F1-26300010006-ELW-Instalacion Sala Electrica	0	02-Aug-21A	06-Oct-21A																			
		C - EF1 - 26300010006 - ELW - Cable Desnudo Puesta a Tierra	0	01-Apr-21A	29-Jan-22A																				
		K170-70568350	C-F1-26300010006-ELW-Montaje Cable Desnudo PuestaA Tierra SE2630	0	01-Apr-21A																			03-Apr-21A	
		K170-70542630	C-F1-26300010006-ELW-Montaje Cable Desnudo PuestaA Tierra Edificio Chancador	0	04-Aug-21A	18-Dec-21A																			
		K170-70568380	C-F1-26300010006-ELW-Montaje Cable Desnudo PuestaA Tierra Interconexion	0	11-Aug-21A	29-Jan-22A																			
		C - EF1 - 26300010006 - ELW - PAT Edificio Chancador	0																						
		C - EF1 - 26300010006 - ELW - PAT Túnel Corrugado	0																						
		C - EF1 - 26300010006 - ELW - PAT Faja Sacrificio	0																						
		C - EF1 - 26300010006 - ELW - PAT SE 2630	0																						
		C - EF1 - 26300010006 - ELW - PAT Interconexión	0																						
		C - EF1 - 26300010006 - ELW - Transformador	0	17-Jul-21A	12-Nov-21A																				
		K170-70542800	C-F1-26300010006-ELW-Montaje y conexionado Transformador	0	17-Jul-21A																			12-Nov-21A	
		C - EF1 - 26300010006 - ELW - Switchgear	0	01-Oct-21A	12-Nov-21A																				
		K170-70542770	C-F1-26300010006-ELW-Montaje y conexionado Switchgear	0	01-Oct-21A																			12-Nov-21A	
		C - EF1 - 26300010006 - ELW - Motor Control Center	0	01-Oct-21A	12-Nov-21A																				
		K170-70542710	C-F1-26300010006-ELW-Montaje Motor Control Center	0	01-Oct-21A																			12-Nov-21A	
		C - EF1 - 26300010006 - ELW - Bandeja y Escalerilla Portaconductor	0	06-Aug-21A	12-Nov-21A																				
		K170-70542870	C-F1-26300010006-ELW-Montaje Escalerilla Portaconductor	0	06-Aug-21A																			12-Nov-21A	
		K170-70542830	C-F1-26300010006-ELW-Montaje Bandeja	0	11-Aug-21A	12-Nov-21A																			
		C - EF1 - 26300010006 - ELW - Bandeja	0																						
		C - EF1 - 26300010006 - ELW - Escalerilla Portaconductor	0																						
		C - EF1 - 26300010006 - ELW - Conduit	0																			08-Sep-21A	12-Nov-21A		
		K170-70542850	C-F1-26300010006-ELW-Montaje Conduit Interior	0	08-Sep-21A	12-Nov-21A																			
		K170-70542880	C-F1-26300010006-ELW-Montaje Conduit Exterior	0	11-Oct-21A	12-Nov-21A																			
		C - EF1 - 26300010006 - ELW - Cable Fuerza, Control e Instrumentación	0	29-Oct-21A	22-Dec-21A																				
		K170-70542970	C-F1-26300010006-ELW-Tendido Cable Fuerza, Control E Instrumentacion	0	29-Oct-21A																			22-Dec-21A	
		K170-70542980	C-F1-26300010006-ELW-Instalacion Mufas Cable Fuerza, Control E Instrumentacion	0	29-Oct-21A	22-Dec-21A																			
		K170-70542990	C-F1-26300010006-ELW-Conexionado Cable Fuerza, Control E Instrumentacion	0	29-Oct-21A	22-Dec-21A																			
		C - EF1 - 26300010006 - ELW - Luminarias y Pararrayos	0	05-Feb-22A	06-Aug-22A																				
		K170-70542910	C-F1-26300010006-ELW-Instalación de Luminaria	0	05-Feb-22A																			06-Aug-22A	
		K170-70543020	C-F1-26300010006-ELW-Montaje Pararrayos	0	05-Feb-22A	13-May-22A																			
		C - EF1 - 26300010006 - ELW - Luminaria	0																						
		C - EF1 - 26300010006 - ELW - Pararrayos	0																						
		C - EF1 - 26300010006 - ELW - Accesorio Eléctrico y otros equipos	0																			08-Jan-22A	12-Feb-22A		
		K170-70542680	C-F1-26300010006-ELW-MontajeAccesorios y otros equipos	0	08-Jan-22A	05-Feb-22A																			
		K170-70542690	C-F1-26300010006-ELW-ConexionadoAccesorios y otros equipos	0	15-Jan-22A	12-Feb-22A																			
		C - EF1 - 26300010006 - ELW - Busbar	0																						
		C - EF1 - 26300010006 - ELW - Bateria	0																						
		C - EF1 - 26300010006 - ELW - Panel	0																						
		C - EF1 - 26300010006 - ELW - Iluminación con Emergencia	0																						
		C - EF1 - 26300010006 - ELW - Proyecto LED	0																						
		C - EF1 - PC - PCS - SER - 26300010006 - Tramo Primary Crusher	0	07-Apr-21A	16-Aug-22A																				
		C - EF1 - 26300010006 - ELW - Bandeja y Escalerilla Portaconductor	0	07-Apr-21A	29-Jan-22A																				
		K170-80561260	C-F1-26300010006-ELW-Escalerilla Portaconductor Nivel 1	0	07-Apr-21A	11-Dec-21A																			
		K170-80561280	C-F1-26300010006-ELW-Escalerilla Portaconductor Nivel 2	0	01-May-21A	18-Dec-21A																			
		K170-80561290	C-F1-26300010006-ELW-Escalerilla Portaconductor Nivel 3	0	31-May-21A	18-Dec-21A																			
		K170-80561270	C-F1-26300010006-ELW-Escalerilla Portaconductor Tunel Corrugado	0	22-Jul-21A	18-Dec-21A																			
		K170-80561300	C-F1-26300010006-ELW-Escalerilla Portaconductor Nivel 4	0	15-Aug-21A	18-Dec-21A																			
		K170-80561310	C-F1-26300010006-ELW-Escalerilla Portaconductor Nivel 5	0	24-Sep-21A	29-Jan-22A																			
		C - EF1 - 26300010006 - ELW - Conduit	0	01-May-21A	18-Dec-21A																				
		K170-80561320	C-F1-26300010006-ELW-Montaje Conduit Nivel 1	0	01-May-21A																			18-Dec-21A	
		K170-80561330	C-F1-26300010006-ELW-Montaje Conduit Nivel 2	0	01-Aug-21A	18-Dec-21A																			
		K170-80561340	C-F1-26300010006-ELW-Montaje Conduit Nivel 4	0	01-Aug-21A	18-Dec-21A																			
		K170-80562280	C-F1-26300010006-ELW-Montaje Conduit Nivel 5	0	11-Sep-21A	18-Dec-21A																			
		K170-80561350	C-F1-26300010006-ELW-Montaje Conduit Control Room	0	22-Oct-21A	18-Dec-21A																			
		C - EF1 - 26300010006 - ELW - Cable Fuerza, Control	0	02-Nov-21A	15-Aug-22A																				
		K170-80561360	C-F1-26300010006-ELW-Tendido Cable Media Tensión	0	02-Nov-21A																			24-Dec-21A	
		K170-80561370	C-F1-26300010006-ELW-Cableado de baja tensión	0	04-Dec-21A	15-Aug-22A																			

K-CC2-170 "Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina"
Cronograma Actualizado - Data Date 27Ene2023 - Chancador Primario y Faja Transportadora

Activity ID		Activity Name	Remaining Duration	Start	Finish	November 2022				December 2022				January 2023				February 2023				March 2023			
						12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11		
K170 Primary Crusher Conveyor Belt		K 170-80561430	C-F1-26300010006-ELW-Conexionado Cable 2610CR001	0	04-Dec-21A																				
		K 170-80561440	C-F1-26300010006-ELW-Conexionado Cable 2610CR002	0	05-Mar-22A																				
		K 170-80561380	C-F1-26300010006-ELW-Cables de Alumbrado	0	24-Mar-22A																				
		C - EF1 - 26300010006 - ELW - Luminaria	0	05-Sep-21A	16-Aug-22A																				
		K 170-80561390	C-F1-26300010006-ELW-Montajes de luminarias - Elevación 3446,130 (Nivel 1)	0	05-Sep-21A																				
		K 170-80561400	C-F1-26300010006-ELW-Montajes de luminarias - Elevación 3452, EL3462 (Nivel 2)	0	20-Sep-21A																				
		K 170-80561410	C-F1-26300010006-ELW-Montajes de luminarias - Elevación 3474, EL3468 (Nivel 4)	0	01-Jan-22A																				
		K 170-80561420	C-F1-26300010006-ELW-Montajes de luminarias - Elevación 3485, EL3481(Control room	0	04-Jun-22A																				
		C - EF1 - 2700 COARSE ORE HANDLING TO STOCKPILE	0	20-Dec-20A	15-Sep-22A																				
		C - EF1 - COH - 2730 - Conveyor Belt From Primary Crusher Ore To Stockpil	0	20-Dec-20A	15-Sep-22A																				
		C - EF1 - COH - CBS - 2730002 - Sacrificial Conveyor To Transfer Tower	0	20-Dec-20A	15-Sep-22A																				
		C - EF1 - COH - CBS - SCT - 27300020000 - Civil Works	0																						
		C - EF1 - COH - CBS - SCT - 27300020001 - Concrete Works	0	20-Dec-20A	21-Oct-21A																				
		C - EF1 - COH - CBS - SCT - 27300020001 - CTW - Durmientes	0	31-May-21A	21-Oct-21A																				
		C - EF1 - 27300020001 - CTW - Acero Refuerzo Durmientes	0																						
		C - EF1 - 27300020001 - CTW - Concreto Durmientes	0	31-May-21A	21-Oct-21A																				
		K 170-70533820	C-F1-27300020001-CTW-ColocacionAcero Refuerzo Concreto Durmientes	0	31-May-21A	22-Jun-21A																			
		K 170-70543100	C-F1-27300020001-CTW-Encofrado Concreto Durmientes	0	07-Jun-21A	13-Oct-21A																			
		K 170-70543120	C-F1-27300020001-CTW-Vaciado Concreto Durmientes	0	14-Jun-21A	21-Oct-21A																			
		C - EF1 - COH - CBS - SCT - 27300020001 - CTW - Cimentaciones	0	20-Dec-20A	22-Jun-21A																				
		C - EF1 - 27300020001 - CTW - Solado	0	20-Dec-20A	03-Mar-21A																				
		K 170-70543160	C-F1-27300020001-CTW-Vaciado Solado	0	20-Dec-20A	03-Mar-21A																			
		C - EF1 - 27300020001 - CTW - Acero Refuerzo	0																						
		C - EF1 - 27300020001 - CTW - Perno	0	25-Mar-21A	10-Apr-21A																				
		K 170-70533330	C-F1-27300020001-CTW-Suministro Y Colocacion Perno	0	25-Mar-21A	10-Apr-21A																			
		C - EF1 - 27300020001 - CTW - Concreto	0	03-Jan-21A	22-Jun-21A																				
		K 170-70533320	C-F1-27300020001-CTW-ColocacionAcero - Zapata Torre Transferencia	0	03-Jan-21A	16-Apr-21A																			
		K 170-70543200	C-F1-27300020001-CTW-Encofrado - Zapata Torre Transferencia	0	01-Apr-21A	20-Apr-21A																			
		K 170-80562540	C-F1-27300020001-CTW-Vaciado Concreto - Zapata Torre Transferencia	0	08-Apr-21A	17-Apr-21A																			
		K 170-80562520	C-F1-27300020001-CTW-ColocacionAcero - Escaleras y pedestales	0	31-May-21A	15-Jun-21A																			
		K 170-70543220	C-F1-27300020001-CTW-Vaciado Concreto - Escaleras y pedestales	0	07-Jun-21A	22-Jun-21A																			
		K 170-80562530	C-F1-27300020001-CTW-Encofrado - Escaleras y pedestales	0	07-Jun-21A	22-Jun-21A																			
		C - EF1 - COH - CBS - SCT - 27300020004 - Mechanical Works	0	23-Apr-21A	17-May-22A																				
		C - EF1 - 27300020004 - MEW - Tail Assembly Faja Sacrificio	0	08-Jul-21A	18-Dec-21A																				
		K 170-70544040	C-F1-27300020004-MEW-Montaje - Tail Assembly F.S. (2730002CP19)	0	08-Jul-21A	18-Dec-21A																			
		C - EF1 - 27300020004 - MEW - Miscelaneos Take Up Faja Sacrificio	0	26-Feb-22A	10-May-22A																				
		K 170-70543990	C-F1-27300020004-MEW-Montaje - Miscelaneos Take Up F.S. (2730002CT19)	0	26-Feb-22A	10-May-22A																			
		C - EF1 - 27300020004 - MEW - Mesa Carga Faja Sacrificio	0	07-Jul-21A	18-Dec-21A																				
		K 170-70543940	C-F1-27300020004-MEW-Montaje - Mesa Carga F.S.	0	07-Jul-21A	18-Dec-21A																			
		C - EF1 - 27300020004 - MEW - Mesa Impacto Faja Sacrificio	0	07-Jul-21A	20-Dec-21A																				
		K 170-70543990	C-F1-27300020004-MEW-Montaje - Mesa Impacto F.S.	0	07-Jul-21A	20-Dec-21A																			
		C - EF1 - 27300020004 - MEW - Torre Transferencia Faja Sacrificio	0	23-Apr-21A	01-Jun-21A																				
		K 170-70543840	C-F1-27300020004-MEW-Montaje - Torre Transferencia F.S. (2730-CV-001-TX1)	0	23-Apr-21A	01-Jun-21A																			
		C - EF1 - 27300020004 - MEW - Miscelaneos Counterweight Faja Sacrificio	0	26-Apr-21A	17-May-22A																				
		K 170-70543640	C-F1-27300020004-MEW-Montaje Elementos Estructurales Reductor F.S. (2730-CV-001	0	26-Apr-21A	01-May-22A																			
	K 170-70543790	C-F1-27300020004-MEW-Montaje - Miscelaneos Coutersweight (2730002CW19)	0	01-Jun-21A	07-Jun-21A																				
	K 170-70543740	C-F1-27300020004-MEW-Montaje - Motor Creep Drive F.S. (2730-CV-001-MO2)	0	07-Jun-21A	13-Jun-21A																				
	K 170-70543690	C-F1-27300020004-MEW-Montaje - Galerías F.S. (2730002CG 19)	0	13-Jun-21A	19-Dec-21A																				
	K 170-70543590	C-F1-27300020004-MEW-Montaje Elementos Estructurales Motor Electrico F.S.(2730-C	0	20-Jan-22A	01-May-22A																				
	K 170-70543490	C-F1-27300020004-MEW-Montaje - Motor Bomba Unidad Motriz F.S. (2730-CV-001-GR	0	08-Mar-22A	08-May-22A																				
	K 170-70557850	C-F1-27300020004-MEW-Montaje - Miscelaneos Torre de Transferencia	0	11-Mar-22A	07-May-22A																				
	K 170-70543540	C-F1-27300020004-MEW-Montaje - Motor Ventilador Unidad Motriz F.S. (2730-CV-001-G	0	02-May-22A	05-May-22A																				
	K 170-70543440	C-F1-27300020004-MEW-Montaje - Calefactor Unidad Motriz F.S. (2730-CV-001-GR1HE	0	08-May-22A	11-May-22A																				
	K 170-70543280	C-F1-27300020004-MEW-Montaje - Electric Hoist F.S. (2730-HT-004)	0	09-May-22A	14-May-22A																				
	K 170-70543390	C-F1-27300020004-MEW-Montaje - Detector Metales F.S. (2730-CV-001-MD1)	0	12-May-22A	17-May-22A																				
	C - EF1 - 27300020004 - MEW - Motor Creep Drive Faja de Sacrificio	0																							
	C - EF1 - 27300020004 - MEW - Galerías Faja Sacrificio	0																							
	C - EF1 - 27300020004 - MEW - Reductor Faja Sacrificio	0																							
	C - EF1 - 27300020004 - MEW - Motor Eléctrico Faja Sacrificio	0																							
	C - EF1 - 27300020004 - MEW - Motor Ventilador Unidad Motriz Faja Sacrificio	0																							
	C - EF1 - 27300020004 - MEW - Motor Bomba Unidad Motriz Faja Sacrificio	0																							
	C - EF1 - 27300020004 - MEW - Calefactor Unidad Motriz Faja Sacrificio	0																							
	C - EF1 - 27300020004 - MEW - Electric Hoist Chute Faja Sacrificio	0																							

K-CC2-170 "Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina"
Cronograma Actualizado - Data Date 27Ene2023 - Chancador Primario y Faja Transportadora

Activity ID		Activity Name	Remaining Duration	Start	Finish	November 2022			December 2022				January 2023				February 2023				March 2023		
						12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11
K170 Primary Crusher Conveyor Belt EXECUTION SCHEDULE	C - EF1 - 27300020004 - MEW - Detector Metales Faja Sacrificio		0																				
	C - EF1 - 27300020004 - MEW - Chute Descarga Faja Sacrificio		0	08-Jul-21A	18-Dec-21A																		
	K170-70543310	C-F1-27300020004-MEW-Montaje - Chute Descarga F.S. (2730-CV-001-CH1)	0	08-Jul-21A	18-Dec-21A																		
	C - EF1 - 27300020004 - MEW - Faja Sacrificio Flujo Humedo		0	15-Jan-22A	29-Jan-22A																		
	K170-70543340	C-F1-27300020004-MEW-Montaje - Faja Sacrificio Flujo Humedo (2730-CV-001)	0	15-Jan-22A	29-Jan-22A																		
	C - EF1 - 27300020004 - MEW - Misceláneos Torre de Transferencia		0																				
	C - EF1 - COH - CBS - SCT - 27300020005 - Piping Works		0	14-Jan-22A	04-Jun-22A																		
	C - EF1 - 27300020005 - PPW - Fabricación Spools		0																				
	C - EF1 - 27300020005 - PPW - Fabricación Uniones Spools		0																				
	C - EF1 - 27300020005 - PPW - Instalación Tuberías		0	14-Jan-22A	07-Apr-22A																		
	K170-70533530	C-F1-27300020005-PPW-Manejo Instalacion Tuberias	0	14-Jan-22A	07-Apr-22A																		
	C - EF1 - 27300020005 - PPW - Instalación Spools		0	20-Jan-22A	07-Apr-22A																		
	K170-70556840	C-F1-27300020005-PPW-Manejo Instalacion Spools	0	20-Jan-22A	07-Apr-22A																		
	C - EF1 - 27300020005 - PPW - Instalación Uniones Tuberías		0																				
	C - EF1 - 27300020005 - PPW - Modificacion Spools		0																				
	C - EF1 - 27300020005 - PPW - Pruebas Tuberías		0	05-Feb-22A	04-Jun-22A																		
	K170-70556880	C-F1-27300020005-PPW-Realizacion Pruebas Tuberias	0	05-Feb-22A	04-Jun-22A																		
	C - EF1 - 27300020005 - PPW - Pruebas Spools		0																				
	C - EF1 - COH - CBS - SCT - 27300020007 - I&C Works		0	14-Dec-21A	15-Sep-22A																		
	C - EF1 - 27300020007 - ICW - Instrumentación y Control		0	14-Dec-21A	15-Sep-22A																		
	K170-70544090	C-F1-27300020007-ICW-Traslado a obra y calibración	0	14-Dec-21A	21-Mar-22A																		
	K170-70544130	C-F1-27300020007-ICW-Colocación de Soportes de instrumentos	0	08-Jan-22A	03-May-22A																		
	K170-70544330	C-F1-27300020007-ICW-Instalación de Instrumentos	0	22-Jan-22A	06-May-22A																		
	K170-70544450	C-F1-27300020007-ICW-Canalización y Cableado	0	10-Mar-22A	09-May-22A																		
	K170-70544370	C-F1-27300020007-ICW-Prueba y liberación	0	10-May-22A	15-Sep-22A																		
	C - EF1 - 27300020007 - ICW - Placa de Montaje		0																				
	C - EF1 - 27300020007 - ICW - Unidad de Comunicación		0																				
	C - EF1 - 27300020007 - ICW - Iluminación		0																				
	C - EF1 - 27300020007 - ICW - Analizador		0																				
	C - EF1 - 27300020007 - ICW - Baliza		0																				
	C - EF1 - 27300020007 - ICW - Indicador		0																				
	C - EF1 - 27300020007 - ICW - Interruptor		0																				
	C - EF1 - 27300020007 - ICW - Sensor		0																				
	C - EF1 - 27300020007 - ICW - Sirena		0																				
	C - EF1 - 27300020007 - ICW - Transmisor		0																				
	C - EXECUTION FRONT 2		38	10-Nov-19A	05-Mar-23																		
	C - EF2 - 2700 COARSE ORE HANDLING TO STOCKPILE		18	06-Feb-21A	13-Feb-23																		
	C - EF2 - COH - 2710B - Coarse Ore Conveyance Tunnel Entry to Mid of Tun		15	10-Dec-21A	10-Feb-23																		
	C - EF2 - COH - COT - 2710003A- Additional Works In Coarse Ore Conveyor Tunnel		15	10-Dec-21A	10-Feb-23																		
	C - EF2 - COH - COT - AW - 27100030004A- Mechanical Works		0	12-Feb-22A	06-May-22A																		
	C - EF2 - 27100030004A- MEW - Ventilador Axial Con Silenciador Bay 06		0																				
	C - EF2 - 27100030004A- MEW - Motor Eléctrico Ventilador Axial Con Silenciador Bay 0		0																				
	C - EF2 - 27100030004A- MEW - Ventilador Axial Con Silenciador Bay (6 und)		0	12-Feb-22A	02-May-22A																		
	K170-70548150	C-F1-27100030004-MEW-Montaje Ventilador Axial Con Silenciadr Bay 06 und(2710-FA	0	12-Feb-22A	02-May-22A																		
	C - EF2 - 27100030004A- MEW - Motor Eléctrico Ventilador Axial Con Silenciador Bay (I		0	19-Feb-22A	04-May-22A																		
	K170-70548750	C-F1-27100030004-MEW-Montaje Motor Electrico Ventilador Axial Bay 06 und(2710-FA	0	19-Feb-22A	04-May-22A																		
	C - EF2 - 27100030004A- MEW - Ventilador Axial Con Silenciador Bay 04		0																				
	C - EF2 - 27100030004A- MEW - Motor Eléctrico Ventilador Axial Con Silenciador Bay 0		0																				
	C - EF2 - 27100030004A- MEW - Ventilador Axial Con Silenciador Bay 03		0																				
	C - EF2 - 27100030004A- MEW - Motor Eléctrico Ventilador Axial Con Silenciador Bay 0		0																				
C - EF2 - 27100030004A- MEW - Ventilador Axial Con Silenciador Bay 02		0																					
C - EF2 - 27100030004A- MEW - Motor Eléctrico Ventilador Axial Con Silenciador Bay 0		0																					
C - EF2 - 27100030004A- MEW - Ventilador Axial Con Silenciador Bay 01		0																					
C - EF2 - 27100030004A- MEW - Motor Eléctrico Ventilador Axial Con Silenciador Bay 0		0																					
C - EF2 - 27100030004A- MEW - Compresor		0	05-Mar-22A	03-May-22A																			
K170-70549140	C-F1-27100030004-MEW-Montaje Compresor (2730-CP-001)	0	05-Mar-22A	03-May-22A																			
C - EF2 - 27100030004A- MEW - Motor Eléctrico		0	12-Mar-22A	06-May-22A																			
K170-70549180	C-F1-27100030004-MEW-Montaje Motor Electrico (2730-CP-001-MO1)	0	12-Mar-22A	06-May-22A																			
C - EF2 - COH - COT - AW - 27100030005A- Piping Works		0	27-Mar-22A	12-May-22A																			
C - EF2 - 27100030005A- PPW - Piping Works		0	27-Mar-22A	12-May-22A																			

<

K-CC2-170 "Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina"

Cronograma Actualizado - Data Date 27Ene2023 - Chancador Primario y Faja Transportadora

Activity ID		Activity Name		Remaining Duration	Start	Finish	November 2022			December 2022			January 2023			February 2023			March 2023				
							12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04
		K170-70528310	C-F2-27100030005A-PPW-Traslado a obra	0	27-Mar-22A	05-Apr-22A																	
		K170-70556900	C-F2-27100030005A-PPW-Soldadura de tuberías y spools	0	29-Apr-22A	05-May-22A																	
		K170-70556910	C-F2-27100030005A-PPW-Instalación de tuberías	0	06-May-22A	10-May-22A																	
		K170-70556920	C-F2-27100030005A-PPW-Colocación de soportes y alineación	0	06-May-22A	09-May-22A																	
		K170-70556930	C-F2-27100030005A-PPW-Pruebas y aceptación	0	08-May-22A	12-May-22A																	
		C - EF2 - 27100030005A - PPW - Modificación Spools			0																		
		C - EF2 - 27100030005A - PPW - Pruebas Tuberías			0																		
		C - EF2 - 27100030005A - PPW - Pruebas Spools			0																		
		C - EF2 - COH - COT - AW - 27100030006A - Electrical Works			0	10-Dec-21A	30-Dec-22A																
		C - EF2 - COH - COT - AW - 27100030006A - ELW - Motor Control Center			0	07-Jan-22A	30-Mar-22A																
		K170-70549240	C-F2-27100030006-ELW-Montaje Motor Control Center	0	07-Jan-22A	30-Mar-22A																	
		C - EF2 - COH - COT - AW - 27100030006A - ELW - Transformador			0	12-Jan-22A	03-Apr-22A																
		K170-70549270	C-F2-27100030006-ELW-Montaje Transformador	0	12-Jan-22A	03-Apr-22A																	
		C - EF2 - COH - COT - AW - 27100030006A - ELW - Cable Mensajero			0	12-Feb-22A	12-Apr-22A																
		K170-80560750	C-F2-27100030006-ELW-Montaje Cable Mensajero	0	12-Feb-22A	12-Apr-22A																	
		C - EF2 - 27100030000B - CVW - Trabajos de Limpieza de Suelo			0	27-Jul-22A	18-Aug-22A																
		K170-80562820	C-F2-27100030000-CIW-Trabajos de Limpieza de Suelos (Interior del Tunel)	0	27-Jul-22A	18-Aug-22A																	
		C - EF2 - COH - COT - AW - 27100030006A - ELW - Conduit			0	26-Feb-22A	30-Dec-22A																
		K170-70549300	C-F2-27100030006-ELW-Montaje Conduit	0	26-Feb-22A	30-Dec-22A																	
		K170-70549310	C-F2-27100030006-ELW-Montaje Bandejas	0	02-Mar-22A	12-May-22A																	
		C - EF2 - COH - COT - AW - 27100030006A - ELW - Cable Fuerza, Control e Instrumenta			0	12-Apr-22A	03-Oct-22A																
		K170-70528330	C-F2-27100030006-ELW- Tendido de cable	0	12-Apr-22A	18-Sep-22A																	
		K170-70549340	C-F2-27100030006-ELW-Conexionado Cable	0	13-Apr-22A	03-Oct-22A																	
		C - EF2 - COH - COT - AW - 27100030006A - ELW - Luminaria			0	18-May-22A	15-Oct-22A																
		K170-70549320	C-F2-27100030006-ELW-Colocación de Luminaria	0	18-May-22A	15-Oct-22A																	
		C - EF2 - COH - COT - AW - 27100030006A - ELW - Cable Desnudo Puesta a Tierra			0	10-Dec-21A	15-Jan-22A																
		K170-70528320	C-F2-27100030006-ELW-Suministro y colocación de PAT	0	10-Dec-21A	15-Jan-22A																	
		C - EF2 - COH - COT - AW - 27100030007A - I&C Works			15	31-Mar-22A	10-Feb-23																
		C - EF2 - COH - COT - AW - 27100030007A - Instrumentación y Control			15	31-Mar-22A	10-Feb-23																
		K170-70528400	C-F2-27100030007-ICW-Traslado a obra y calibración	0	31-Mar-22A	02-Apr-22A																	
		K170-70549380	C-F2-27100030007-ICW-Colocación de Soportes de instrumentos	0	02-Apr-22A	21-Aug-22A																	
		K170-70549390	C-F2-27100030007-ICW-Instalación de Instrumentos	7	05-Apr-22A	02-Feb-23																	
		K170-70549400	C-F2-27100030007-ICW-Canalización y Cableado	3	11-Aug-22A	29-Jan-23																	
		K170-70549410	C-F2-27100030007-ICW-Prueba, conexionado de instrumentos y liberación	13	18-Aug-22A	10-Feb-23																	
		C - EF2 - COH - COT - AW - 27100030007A - ICW - Gabinete de Comunicación			0																		
		C - EF2 - COH - COT - AW - 27100030007A - ICW - Placa Montaje			0																		
		C - EF2 - COH - COT - AW - 27100030007A - ICW - Rack Remoto			0																		
		C - EF2 - COH - COT - AW - 27100030007A - ICW - Caja de Conexión			0																		
		C - EF2 - COH - COT - AW - 27100030007A - ICW - Cámara CCTV			0																		
		C - EF2 - COH - 2710C - Coarse Ore Conveyance Tunnel Mid to Exit of Tunn			0	15-Dec-21A	20-Dec-22A																
		C - EF2 - COH - COT - 2710003B - Additional Works In Coarse Ore Conveyor Tunnel			0	15-Dec-21A	20-Dec-22A																
		C - EF2 - COH - COT - AW - 27100030004B - Mechanical Works			0	19-Feb-22A	03-Apr-22A																
		C - EF2 - 27100030004B - MEW - Ventilador Axial Con Silenciador Bay (6 und)			0	19-Feb-22A	28-Mar-22A																
		K170-70549990	C-F1-27100030004-MEW-Montaje Ventilador Axial Con Silenciador Bay 06 und (27 10-FA	0	19-Feb-22A	28-Mar-22A																	
		C - EF2 - 27100030004B - MEW - Ventilador Axial Con Silenciador Bay 08			0																		
		C - EF2 - 27100030004B - MEW - Ventilador Axial Con Silenciador Bay 09			0																		
		C - EF2 - 27100030004B - MEW - Ventilador Axial Con Silenciador Bay 10			0																		
		C - EF2 - 27100030004B - MEW - Ventilador Axial Con Silenciador Bay 11			0																		
		C - EF2 - 27100030004B - MEW - Ventilador Axial Con Silenciador Bay 12			0																		
		C - EF2 - 27100030004B - MEW - Motor Eléctrico Ventilador Axial Con Silenciador Bay (l			0	22-Feb-22A	03-Apr-22A																
	K170-70550590	C-F1-27100030004-MEW-Motor Electrico Ventilador Axial Con Silenciador Bay 06 und (2	0	22-Feb-22A	03-Apr-22A																		
	C - EF2 - 27100030004B - MEW - Motor Eléctrico Ventilador Axial Con Silenciador Bay 0			0																			
	C - EF2 - 27100030004B - MEW - Motor Eléctrico Ventilador Axial Con Silenciador Bay 0			0																			
	C - EF2 - 27100030004B - MEW - Motor Eléctrico Ventilador Axial Con Silenciador Bay 1			0																			
	C - EF2 - 27100030004B - MEW - Motor Eléctrico Ventilador Axial Con Silenciador Bay 1			0																			
	C - EF2 - 27100030004B - MEW - Motor Eléctrico Ventilador Axial Con Silenciador Bay 1			0																			
	C - EF2 - COH - COT - AW - 27100030005B - Piping Works			0	28-Mar-22A	12-May-22A																	
	C - EF2 - 27100030005B - PPW - Piping Works			0	28-Mar-22A	12-May-22A																	
	K170-70528500	C-F2-27100030005B-PPW-Traslado a obra	0	28-Mar-22A	09-Apr-22A																		
	K170-70556950	C-F2-27100030005B-PPW-Soldadura de tuberías y spools	0	29-Apr-22A	05-May-22A																		
	K170-70556960	C-F2-27100030005B-PPW-Instalación de tuberías	0	06-May-22A	10-May-22A																		

K170 Primary Crusher Conveyor Belt

EXECUTION SCHEDULE

Page 12 of 32

Date	Revision	Checked	Approved
29-Apr-22	REVISIÓN 0	MM	IM

Actual Work ◆ ◆ Milestone

Remaining Work Summary

Critical

K-CC2-170 "Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina"
Cronograma Actualizado - Data Date 27Ene2023 - Chancador Primario y Faja Transportadora

Activity ID	Activity Name	Remaining Duration	Start	Finish	November 2022				December 2022				January 2023				February 2023				March 2023			
					12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11		
C - EF2 - 27100030005B - PPW - Colocación de soportes y alineación	K170-70556970	C-F2-27100030005B-PPW-Colocación de soportes y alineación	0	06-May-22A	09-May-22A																			
	K170-70556980	C-F2-27100030005B-PPW-Pruebas y aceptación	0	08-May-22A	12-May-22A																			
	C - EF2 - 27100030005B - PPW - Modificación Spools		0																					
	C - EF2 - 27100030005B - PPW - Pruebas Tuberías		0																					
	C - EF2 - 27100030005B - PPW - Pruebas Spools		0																					
	C - EF2 - COH - COT - AW - 27100030006B - Electrical Works		0	15-Dec-21A	20-Dec-22A	20-Dec-22A																		
	C - EF2 - 27100030006B - ELW - Cable Desnudo Puesta a Tierra		0	15-Dec-21A	20-Jan-22A																			
	K170-70550960	C-F2-27100030006-ELW-Montaje Cable Desnudo PuestaA Tierra	0	15-Dec-21A	20-Jan-22A																			
	C - EF2 - 27100030006B - ELW - Motor Control Center		0	01-Jan-22A	31-Mar-22A																			
	K170-70550980	C-F2-27100030006-ELW-Montaje Motor Control Center	0	01-Jan-22A	31-Mar-22A																			
	C - EF2 - 27100030006B - ELW - Transformador		0	12-Jan-22A	04-Apr-22A																			
	K170-70551010	C-F2-27100030006-ELW-Montaje Transformador	0	12-Jan-22A	04-Apr-22A																			
	C - EF2 - 27100030006B - ELW - Cable Mensajero		0	12-Feb-22A	13-Apr-22A																			
	K170-80560760	C-F2-27100030006-ELW-Montaje Cable Mensajero	0	12-Feb-22A	13-Apr-22A																			
	C - EF2 - 27100030000B - CVW - Trabajos de Limpieza de Suelo		0	27-Jul-22A	18-Aug-22A																			
	K170-80562810	C-F2-27100030000-CIW-Trabajos de Limpieza de Suelos (Interior del Tunel)	0	27-Jul-22A	18-Aug-22A																			
	C - EF2 - 27100030006B - ELW - Conduit		0	26-Feb-22A	22-Oct-22A																			
	K170-70551040	C-F2-27100030006-ELW-Montaje Conduit y bandejas	0	26-Feb-22A	22-Oct-22A																			
	C - EF2 - 27100030006B - ELW - Luminaria		0	30-Mar-22A	23-Oct-22A																			
	K170-70551060	C-F2-27100030006-ELW-Montaje Luminaria	0	30-Mar-22A	23-Oct-22A																			
	C - EF2 - 27100030006B - ELW - Cable Fuerza, Control e Instrumentación		0	13-Apr-22A	20-Dec-22A	20-Dec-22A																		
	K170-70551090	C-F2-27100030006-ELW-Conexionado Cable	0	13-Apr-22A	20-Dec-22A																			
	K170-70551080	C-F2-27100030006-ELW-Tendido de cable	0	14-Apr-22A	20-Dec-22A																			
	C - EF2 - COH - COT - AW - 27100030007B - I&C Works		0	15-Mar-22A	18-May-22A																			
	C - EF2 - 27100030007B - ICW - Instrumentación y Control		0	15-Mar-22A	18-May-22A																			
	K170-70528590	C-F2-27100030007-ICW-Traslado a obra y calibración	0	15-Mar-22A	05-Apr-22A																			
	K170-70551120	C-F2-27100030007-ICW-Colocación de Soportes de instrumentos	0	10-Apr-22A	08-May-22A																			
	K170-70551130	C-F2-27100030007-ICW-Instalación de Instrumentos	0	14-Apr-22A	11-May-22A																			
	K170-70551140	C-F2-27100030007-ICW-Canalización y Cableado	0	20-Apr-22A	14-May-22A																			
	K170-70551150	C-F2-27100030007-ICW-Prueba y liberación	0	23-Apr-22A	18-May-22A																			
	C - EF2 - 27100030007B - ICW - Gabinete Gabinete de Comunicación		0																					
	C - EF2 - 27100030007B - ICW - Gabinete Placa Montaje		0																					
	C - EF2 - 27100030007B - ICW - Gabinete Rack Remoto		0																					
	C - EF2 - 27100030007B - ICW - Gabinete Caja de Conexión		0																					
	C - EF2 - 27100030007B - ICW - Gabinete Cámara CCTV		0																					
	C - EF2 - COH - COH - 2710A - Portal Entry Platform Seccion - Tramo A		18	06-Feb-21A	13-Feb-23	13-Feb-23																		
	C - EF2 - COH - COT - 2710005A - Portal Entry Platform Seccion		18	06-Feb-21A	13-Feb-23	13-Feb-23																		
	C - EF2 - COH - COT - PEP - 27100050000A - Civil Works		18	06-Feb-21A	13-Feb-23	13-Feb-23																		
	C - EF2 - 27100050000A - CVW - Excavación Masiva		0	06-Feb-21A	24-Jun-21A																			
	K170-70528450	C-F2-27100050000-CVW-Excavacion Masiva Ripper	0	06-Feb-21A	15-Feb-21A																			
K170-70549650	C-F2-27100050000-CVW-Excavacion Masiva Roca	0	16-Feb-21A	23-Feb-21A																				
K170-70527645	C-F2-27100050000-CVW-Excavacion Terreno Comun	0	11-Jun-21A	24-Jun-21A																				
C - EF2 - 27100050000A - CVW - Excavación		0	01-May-21A	02-May-22A																				
K170-70549620	C-F2-27100050000-CVW-Excavacion Escarpe	0	01-May-21A	10-Jun-21A																				
K170-70549625	C-F2-27100050000-CVW-Excavacion Canales	0	01-Jun-21A	10-Jun-21A																				
K170-70549660	C-F2-27100050000-CVW-Excavacion PuestaA Tierra	0	03-Aug-21A	02-May-22A																				
C - EF2 - 27100050000A - CVW - Perfilado		0	06-Feb-21A	17-Feb-21A																				
K170-70528460	C-F2-27100050000-CVW-Perfilado Subrasante	0	06-Feb-21A	17-Feb-21A																				
C - EF2 - 27100050000A - CVW - Relleno		0	05-Feb-22A	13-May-22A																				
K170-70549630	C-F2-27100050000-CVW-Relleno PuestaA Tierra	0	05-Feb-22A	13-May-22A																				
C - EF2 - 27100050000A - CVW - Pretil Seguridad		18	08-Nov-22A	13-Feb-23	13-Feb-23																			
K170-70549670	C-F2-27100050000-CVW-Instalación de Cerco Perimetrico en las Estocadas	0	08-Nov-22A	28-Dec-22A																				
K170-70549640	C-F2-27100050000-CVW-Pretil Seguridad Berna	6	27-Jan-23	01-Feb-23																				
K170-70549680	C-F2-27100050000-CVW-Instalación de Cerco en Portal de Ingreso	18	27-Jan-23	13-Feb-23																				
C - EF2 - 27100050000A - CVW - Re vestimie nto Mamposteria		7	27-Jan-23	02-Feb-23																				
K170-70528440	C-F2-27100050000-CVW-Revestimiento Mamposteria	7	27-Jan-23	02-Feb-23																				
C - EF2 - COH - COT - PEP - 27100050000A - Electrical Works (S/A)		0	08-Aug-21A	06-May-22A																				
K170-80560590	C-F2-27100050000-CVW-Cable de Puesta a tierra	0	08-Aug-21A	06-May-22A																				
C - EF2 - COH - 2730A - Conveyor Belt From Primary Crusher Ore To Stockpile		0	11-May-21A	21-Jun-22A																				
C - EF2 - COH - CBP - 2730001A - Overland Conveyor Belt To Ore Stockpile		0	11-May-21A	21-Jun-22A																				
C - EF2 - COH - CBS - OCB - 27300010001A - Concrete Works		0	11-May-21A	21-Jan-22A																				

K-CC2-170 "Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina"
Cronograma Actualizado - Data Date 27Ene2023 - Chancador Primario y Faja Transportadora

Activity ID	Activity Name	Remaining Duration	Start	Finish	November 2022				December 2022				January 2023				February 2023				March 2023			
					12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11		
	C - EF2 - COH - CBS - OCB - 27300010001A - CTW - Durmientes	0																						
	C - EF2 - 27300010001A - CTW - Acero Refuerzo Durmientes	0																						
	C - EF2 - 27300010001A - CTW - Concreto Durmientes	0																						
	C - EF2 - COH - CBS - OCB - 27300010001A - CTW - Cimentaciones	0	11-May-21 A	21-Jan-22A																				
	C - EF2 - 27300010001A - CTW - Solado Cimentaciones	0	11-May-21 A	03-Jun-21A																				
	K170-70551530	C-F2-27300010001A-CTW-Vaciado Solado	0	11-May-21 A																				03-Jun-21A
	C - EF2 - 27300010001A - CTW - Acero Refuerzo Cimentaciones	0																						
	C - EF2 - 27300010001A - CTW - Perno Cimentaciones	0	04-Jan-22A	21-Jan-22A																				
	K170-70528680	C-F2-27300010001A-CTW-Suministro Y Colocacion Perno	0	04-Jan-22A																				21-Jan-22A
	C - EF2 - 27300010001A - CTW - Concreto Cimentaciones	0	09-Jun-21A	13-Jan-22A																				
	K170-70528670	C-F2-27300010001A-CTW-Colocacion Acero - Losas, pedestales y B01 y B02	0	09-Jun-21A																				07-Jun-22A
	K170-70551620	C-F2-27300010001A-CTW-Encofrado - Losas, pedestales y B01 y B02	0	16-Jun-21A																				13-Jan-22A
	K170-70551640	C-F2-27300010001A-CTW-Vaciado - Losas, pedestales y B01 y B02	0	23-Jun-21A																				13-Jan-22A
	C - EF2 - COH - CBS - OCB - 27300010002A - Steel Works	0																						
	C - EF2 - COH - CBS - OCB - 27300010003A - Architectual Works	0																						
	C - EF2 - COH - CBS - OCB - 27300010004A - Mechanical Works	0	18-Jul-21A	21-Jun-22A																				
	C - EF2 - 27300010004A - MEW - Mesas de Impacto	0	18-Jul-21A	19-Dec-21A																				
	K170-70533870	C-F2-27300010004A-MEW-Recepcion Mesas De Impacto	0	18-Jul-21A																				02-Aug-21A
	K170-70551680	C-F2-27300010004A-MEW-Montaje Mesas De Impacto	0	13-Nov-21A																				19-Dec-21A
	C - EF2 - 27300010004A - MEW - Polea de Cola	0	09-Aug-21A	20-Aug-21A																				
	K170-70551730	C-F1-27300010004A-MEW-Montaje Polea De Cola (2730001CP19)	0	09-Aug-21A																				20-Aug-21A
	C - EF2 - 27300010004A - MEW - Mesas de Carga y Galerías	0	06-Aug-21A	21-Dec-21A																				
	K170-70551780	C-F2-27300010004A-MEW-Montaje Truss 01 y Truss 02 /Mesas Carga/ Galerías	0	06-Aug-21A																				21-Dec-21A
	C - EF2 - 27300010004A - MEW - Balanza Faja	0	12-Feb-22A	05-May-22A																				
	K170-70551830	C-F1-27300010004A-MEW-Montaje Elementos Estructurales Balanza Faja (2730-CV-00	0	12-Feb-22A																				05-May-22A
	C - EF2 - 27300010004A - MEW - Supresor de Polvo	0	17-Feb-22A	12-May-22A																				
	K170-70551880	C-F1-27300010004A-MEW-Montaje Supresor Polvo (2730-DT-002/2730-DT-003)	0	17-Feb-22A																				12-May-22A
	C - EF2 - 27300010004A - MEW - Chute Alimentación Faja Overland	0	03-Aug-21A	19-May-22A																				
	K170-70556000	C-F1-27300010004A-MEW-Montaje Chute Alimentacion Faja Overland (2730-CV-002-C	0	03-Aug-21A																				19-May-22A
	C - EF2 - 27300010004A - MEW - Polipasto Mantención Fajas	0	06-Aug-21A	22-May-22A																				
	K170-70551940	C-F1-27300010004A-MEW-Montaje Polipasto Mantencion Fajas (2730-HT-002)	0	06-Aug-21A																				22-May-22A
	C - EF2 - 27300010004A - MEW - Idler Guarding	0	22-Feb-22A	21-Jun-22A																				
	K170-70551970	C-F1-27300010004A-MEW-Montaje Idler Guarding (2730-CV-002-XM5)	0	22-Feb-22A																				21-Jun-22A
	C - EF2 - 27300010004A - MEW - Faja Transportadora Conveyor Go - Conveyor Splicing	0	23-Jan-22A	05-Feb-22A																				
	K170-70528760	C-F1-27300010004A-MEW-Conveyor Belt Lying and Splicing Go (2730-CV-002)	0	23-Jan-22A																				05-Feb-22A
	C - EF2 - 27300010004A - MEW - Faja Transportadora Conveyor Return - Conveyor Spli	0	06-Feb-22A	20-Feb-22A																				
	K170-70534220	C-F1-27300010004A-MEW-Conveyor Belt Lying and Splicing Return (2730-CV-002)	0	06-Feb-22A																				20-Feb-22A
	C - EF2 - COH - CBS - OCB - 27300010005A - Piping Works (toda la faja dentro del túnel)	0	15-Jan-22A	12-May-22A																				
	K170-70531720	C-F2-27300010005A-PPW- Instalacion Tuberías	0	15-Jan-22A																				05-May-22A
	K170-70557030	C-F2-27300010005A-PPW-Pruebas y colocación de accesorios	0	04-Feb-22A																				12-May-22A
	C - EF2 - 27300010005A - PPW - Fabricación Spools	0																						
	C - EF2 - 27300010005A - PPW - Fabricación Uniones Spools	0																						
	C - EF2 - 27300010005A - PPW - Instalación Tuberías	0																						
	C - EF2 - 27300010005A - PPW - Instalación Spools	0																						
	C - EF2 - 27300010005A - PPW - Modificación Spools	0																						
	C - EF2 - 27300010005A - PPW - Pruebas Tuberías	0																						
	C - EF2 - 27300010005A - PPW - Pruebas Spools	0																						
	C - EF2 - COH - CBS - OCB - 27300010007A - I&C Works (toda la faja dentro del túnel)	0	05-Feb-22A	22-May-22A																				
	C - EF2 - 27300010007A - ICW - Instrumentación y Control	0	05-Feb-22A	22-May-22A																				
	K170-70528940	C-F2-27300010007A-ICW-Traslado a obra y calibración	0	05-Feb-22A																				03-Apr-22A
K170-70552120	C-F2-27300010007A-ICW-Colocación de Soportes de instrumentos	0	12-Feb-22A	12-Apr-22A																				
K170-70552130	C-F2-27300010007A-ICW-Instalación de Instrumentos	0	16-Feb-22A	03-May-22A																				
K170-70552140	C-F2-27300010007A-ICW-Canalización y Cableado	0	02-May-22A	08-May-22A																				
K170-70552670	C-F2-27300010007A-ICW-Prueba y liberación	0	13-May-22A	22-May-22A																				
C - EF2 - 27300010007A - ICW - Panel	0																							
C - EF2 - 27300010007A - ICW - Placa Montaje	0																							
C - EF2 - 27300010007A - ICW - Rack Remoto	0																							
C - EF2 - 27300010007A - ICW - Baliza	0																							
C - EF2 - 27300010007A - ICW - Caja Conexión	0																							
C - EF2 - 27300010007A - ICW - Cámara CCTV	0																							
C - EF2 - 27300010007A - ICW - Indicador	0																							
C - EF2 - 27300010007A - ICW - Interruptor	0																							

K170 Primary Crusher Conveyor Belt EXECUTION SCHEDULE	Page 14 of 32	Date	Revision	Checked	Approved	Actual Work Remaining Work Critical Milestone Summary
		29-Apr-22	REVISIÓN 0	MM	IM	

		K-CC2-170 "Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina"																					
		Cronograma Actualizado - Data Date 27Ene2023 - Chancador Primario y Faja Transportadora																					
Activity ID		Activity Name	Remaining Duration	Start	Finish	November 2022			December 2022				January 2023				February 2023				March 2023		
						12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11
	C - EF2 - 27300010007A- ICW - Sensor		0																				
	C - EF2 - 27300010007A- ICW - Sirena		0																				
	C - EF2 - 27300010007A- ICW - Transmisor		0																				
	C - EF2 - 27300010007A- ICW - Detección de Ruptura		0																				
	C - EF2 - 27300010007A- ICW - Pesómetro		0																				
	C - EF2 - COH - 2730B - Conveyor Belt From Primary Crusher Ore To Stockp		0	01-Jun-21A	24-Jul-22A																		
	C - EF2 - COH - CBS - 2730001B - Overland Conveyor Belt To Ore Stockpile		0	01-Jun-21A	24-Jul-22A																		
	K170-11100000		0	21-Aug-21A	30-Aug-21A																		
	C - EF2 - COH - CBS - OCB - 27300010001A - Civil Works (S/A)		0	10-Sep-21A	20-Feb-22A																		
	K170-80560600		0	10-Sep-21A	12-Oct-21A																		
	K170-80562560		0	19-Sep-21A	18-Oct-21A																		
	K170-80560650		0	29-Jan-22A	20-Feb-22A																		
	C - EF2 - COH - CBS - OCB - 27300010001B - Concrete Works		0	01-Jun-21A	25-Feb-22A																		
	C - EF2 - COH - CBS - OCB - 27300010001B - CTW - Durmientes (Interior túnel)		0	01-Jun-21A	11-Nov-21A																		
	K170-70552724		0	01-Jun-21A	23-Jul-21A																		
	K170-70552725		0	05-Sep-21A	04-Oct-21A																		
	K170-70552730		0	19-Sep-21A	08-Oct-21A																		
	K170-80560610		0	27-Sep-21A	11-Nov-21A																		
	K170-80562580		0	15-Oct-21A	11-Nov-21A																		
	C - EF2 - 27300010001B - CTW - Solado Durmientes		0																				
	C - EF2 - 27300010001B - CTW - Acero Refuerzo Durmientes		0																				
	C - EF2 - 27300010001B - CTW - Perno Durmientes		0																				
	C - EF2 - 27300010001B - CTW - Concreto Durmientes		0																				
	C - EF2 - COH - CBS - OCB - 27300010001A - CTW - Durmientes (Entrada túnel)		0	05-Feb-22A	25-Feb-22A																		
	K170-80560620		0	05-Feb-22A	12-Feb-22A																		
	K170-80560630		0	13-Feb-22A	24-Feb-22A																		
	K170-80560640		0	19-Feb-22A	25-Feb-22A																		
	C - EF2 - COH - CBS - OCB - 27300010001B - CTW - Losas de Estocadas (todo el túnel)		0	28-Aug-21A	11-Nov-21A																		
	K170-80560710		0	28-Aug-21A	11-Nov-21A																		
	K170-80562550		0	11-Sep-21A	11-Nov-21A																		
	K170-80560720		0	14-Sep-21A	11-Nov-21A																		
	K170-80560730		0	16-Sep-21A	11-Nov-21A																		
	K170-80560740		0	18-Sep-21A	11-Nov-21A																		
	C - EF2 - COH - CBS - OCB - 27300010002B - Steel Works		0																				
	C - EF2 - COH - CBS - OCB - 27300010003B - Architectual Works		0																				
	C - EF2 - COH - CBS - OCB - 27300010004B - Mechanical Works		0	06-Jul-21A	24-Jul-22A																		
	C - EF2 - 27300010004B - MEW - Carro Autopropulsado		0	26-Sep-21A	18-Oct-21A																		
	K170-80562600		0	26-Sep-21A	18-Oct-21A																		
	K170-80562610		0	28-Sep-21A	17-Oct-21A																		
	C - EF2 - 27300010004B - MEW - Mesas de Carga (Interior Túnel)		0	06-Jul-21A	18-Jan-22A																		
	K170-70533950		0	06-Jul-21A	12-Aug-21A																		
	K170-70552920		0	12-Jul-21A	19-Dec-21A																		
	K170-70552930		0	13-Nov-21A	18-Jan-22A																		
	K170-70552940		0	22-Dec-21A	18-Jan-22A																		
	C - EF2 - 27300010004A - MEW - Mesas de Carga (Entrada Túnel)		0	10-Oct-21A	08-May-22A																		
	K170-70552970		0	10-Oct-21A	27-Oct-21A																		
	K170-70552980		0	03-Nov-21A	09-Dec-21A																		
	K170-80562640		0	29-Apr-22A	08-May-22A																		
	C - EF2 - 27300010004B - MEW - Ventilador Axial Con Silenciador #2		0	08-Mar-22A	04-Apr-22A																		
	K170-80560830		0	08-Mar-22A	04-Apr-22A																		
	C - EF2 - 27300010004B - MEW - Motor Eléctrico Ventilador Axial #1		0																				
	C - EF2 - 27300010004B - MEW - Motor Eléctrico Ventilador Axial #2		0																				
	C - EF2 - 27300010004B - MEW - Idler Guarding		0	23-Jan-22A	24-Jul-22A																		
	K170-80560840		0	23-Jan-22A	24-Jul-22A																		
	C - EF2 - 27300010004B - MEW - Faja Transportadora Conveyor Go - Conveyor Splicing		0	23-Jan-22A	24-Feb-22A																		
	K170-70529140		0	23-Jan-22A	24-Feb-22A																		
	C - EF2 - 27300010004B - MEW - Faja Transportadora Conveyor Return - Conveyor Spli		0	25-Jan-22A	24-Feb-22A																		
K170-70534230		0	25-Jan-22A	24-Feb-22A																			
C - EF2 - COH - CBS - OCB - 27300010007B - I&C Works		0																					
C - EF2 - COH - 2730C - Conveyor Belt From Primary Crusher Ore To Stockp		0	01-Jun-21A	18-Jul-22A																			
C - EF2 - COH - CBS - 2730001C - Overland Conveyor Belt To Ore Stockpile		0	01-Jun-21A	18-Jul-22A																			
K170-11200000		0	28-Aug-21A	07-Sep-21A																			

K170 Primary Crusher Conveyor Belt

EXECUTION SCHEDULE

Page 15 of 32

Date

29-Apr-22

Revision

REVISIÓN 0

Checked

MM

Approved

IM

Actual Work

Remaining Work

Critical

Milestone

Summary

K-CC2-170 "Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina"
Cronograma Actualizado - Data Date 27Ene2023 - Chancador Primario y Faja Transportadora

Activity ID	Activity Name	Remaining Duration	Start	Finish	November 2022				December 2022				January 2023				February 2023				March 2023			
					12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11		
	C - EF2 - COH - CBS - OCB - 27300010001C - Civil Works (S/A)	0	12-Sep-21A	22-Feb-22A																				
	C - EF2 - COH - CBS - OCB - 27300010001C - Civil Works	0	12-Sep-21A	22-Feb-22A																				
	K170-80560860	C-F2-27300010001B-CTW-Excavación para durmientes (Interior túnel - 50% req. solado)	0	12-Sep-21A																			11-Nov-21A	
	K170-80562570	C-F2-27300010001B-CIV-Excavación para durmientes (Interior túnel - 50% req. solado)	0	14-Sep-21A																			11-Nov-21A	
	K170-80560670	C-F2-27300010001B-CTW-Excavación para durmientes (Salidas túnel)	0	02-Feb-22A																			22-Feb-22A	
	C - EF2 - COH - CBS - OCB - 27300010001C - Concrete Works	0	01-Jun-21A	26-Feb-22A																				
	C - EF2 - COH - CBS - OCB - 27300010001C - CTW - Durmientes (Interior Túnel)	0	01-Jun-21A	11-Nov-21A																				
	K170-70553204	Prefabricación de Durmientes Tramo C	0	01-Jun-21A																			23-Jul-21A	
	K170-70553205	C-F2-27300010001C-CTW-Vaciado Solado I (50% tramo)	0	12-Sep-21A																			26-Sep-21A	
	K170-70553210	C-F2-27300010001C-CTW-Colocación de Durmientes	0	16-Sep-21A																			14-Oct-21A	
	K170-80562590	C-F2-27300010001B-CTW-Vaciado Solado II (50% tramo)	0	18-Sep-21A																			16-Oct-21A	
	K170-70553212	C-F2-27300010001C-CTW-Anclajes de Durmientes	0	15-Oct-21A																			11-Nov-21A	
	C - EF2 - 27300010001C - CTW - Solado Durmientes	0																						
	C - EF2 - 27300010001C - CTW - Acero Refuerzo Durmientes	0																						
	C - EF2 - 27300010001C - CTW - Perno Durmientes	0																						
	C - EF2 - 27300010001C - CTW - Concreto Durmientes	0																						
	C - EF2 - COH - CBS - OCB - 27300010001C - CTW - Durmientes (Salida Túnel)	0	04-Feb-22A	26-Feb-22A																				
	K170-80560880	C-F2-27300010001B-CTW-Vaciado Solado	0	04-Feb-22A																			26-Feb-22A	
	K170-80560890	C-F2-27300010001B-CTW-Colocación de Durmientes	0	16-Feb-22A																			26-Feb-22A	
	K170-80560700	C-F2-27300010001B-CTW-Anclajes de Durmientes	0	20-Feb-22A																			26-Feb-22A	
	C - EF2 - COH - CBS - OCB - 27300010002C - Steel Works	0																						
	C - EF2 - COH - CBS - OCB - 27300010003C - Architectual Works	0																						
	C - EF2 - COH - CBS - OCB - 27300010004C - Mechanical Works	0	06-Jul-21A	18-Jul-22A																				
	C - EF2 - 27300010004C - MEW - Carro Autopropulsado	0	26-Sep-21A	18-Oct-21A																				
	K170-80562620	C-F2-27300010001-CTW-Verificación y Pruebas de Carros/Rieles	0	26-Sep-21A																			18-Oct-21A	
	K170-80562630	C-F2-27300010001-CTW-Instalación de Sistema en entrada y salida de Túnel	0	28-Sep-21A																			17-Oct-21A	
	C - EF2 - 27300010004C - MEW - Mesas de Carga (Interior Túnel)	0	06-Jul-21A	18-Jan-22A																				
	K170-70534010	C-F2-27300010004C-MEW-Recepcion Mesas y accesorios	0	06-Jul-21A																			12-Aug-21A	
	K170-70553440	C-F2-27300010004C-MEW-Montaje - Mesas y accesorios	0	12-Jul-21A																			19-Dec-21A	
	K170-70553450	C-F2-27300010004C-MEW-Alineamiento preliminar - Mesas y accesorios	0	13-Nov-21A																			18-Jan-22A	
	K170-70553460	C-F1-27300010004C-MEW-Alineacion Final y aceptación - Mesas	0	22-Dec-21A																			18-Jan-22A	
	C - EF2 - 27300010004C - MEW - Mesas de Carga (Salida Tunnel)	0	10-Oct-21A	08-May-22A																				
	K170-70553400	C-F1-27300010004C-MEW-Montaje - Mesa	0	10-Oct-21A																			27-Oct-21A	
	K170-70553410	C-F1-27300010004C-MEW-Alineamiento preliminar - Mesas	0	03-Nov-21A																			09-Dec-21A	
	K170-80562650	C-F1-27300010004B-MEW-Liberación y Entrega Punch List	0	29-Apr-22A																			08-May-22A	
	C - EF2 - 27300010004C - MEW - Motor Eléctrico Ventilador Axial #3	0	09-Mar-22A	05-Apr-22A																				
	K170-80560850	C-F2-27300010004C-MEW-Montaje - Ventilador y Motor	0	09-Mar-22A																			05-Apr-22A	
	C - EF2 - 27300010004C - MEW - Idler Guarding	0	15-Mar-22A	18-Jul-22A																				
	K170-80560860	C-F1-27300010004C-MEW-Montaje - Idler Guarding	0	15-Mar-22A																			18-Jul-22A	
	C - EF2 - 27300010004C - MEW - Faja Transportadora Conveyor Go - Conveyor Splicing	0	23-Jan-22A	24-Feb-22A																				
	K170-70529510	C-F1-27300010004C-MEW-Conveyor Belt Lying and Splicing Go (2730-CV-001-XM1)	0	23-Jan-22A																			24-Feb-22A	
	C - EF2 - 27300010004C - MEW - Faja Transportadora Conveyor Return - Conveyor Spli	0	25-Jan-22A	24-Feb-22A																				
	K170-70534240	C-F1-27300010004C-MEW-Conveyor Belt Lying and Splicing Return (2730-CV-001-XM1)	0	25-Jan-22A																			24-Feb-22A	
	C - EF2 - COH - CBS - OCB - 27300010007C - I&C Works	0																						
	C - EF2 - 2800 MINE ANCILLARY FACILITIES	0																						
	C - EF2 - MAF - 2810 - Mine Workshop	0																						
	C - EF2 - MAF - MW - 2810003 - Water Truck Tank (2810-TK-008)	0																						
	C - EF2 - MAF - MW - WTT - 28100030001 - Civil Works	0																						
	C - EF2 - MAF - MW - WTT - 28100030005 - Piping Works	0																						
	C - EF2 - 28100030005 - PPW - Fabricación Spools	0																						
C - EF2 - 28100030005 - PPW - Fabricación Uniones Spools	0																							
C - EF2 - 28100030005 - PPW - Instalación Tuberías	0																							
C - EF2 - 28100030005 - PPW - Instalación Uniones Tuberías	0																							
C - EF2 - 28100030005 - PPW - Modificaciones Spools	0																							
C - EF2 - 28100030005 - PPW - Pruebas Tuberías	0																							
C - EF2 - 28100030005 - PPW - Pruebas Spools	0																							
C - EF2 - MAF - MW - WTT - 28100030001 - Concrete Works	0																							
C - EF2 - 28100030001- CTW - Solado	0																							
C - EF2 - 28100030001- CTW - Acero Refuerzo	0																							
C - EF2 - 28100030001- CTW - Perno	0																							
C - EF2 - 28100030001- CTW - Concreto	0																							

K-CC2-170 "Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina"
Cronograma Actualizado - Data Date 27Ene2023 - Chancador Primario y Faja Transportadora

Activity ID	Activity Name	Remaining Duration	Start	Finish	November 2022				December 2022				January 2023				February 2023				March 2023						
					12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11					
	C - EF2 - MAF - MW - WTT - 28100030005 - Electrical Works	0																									
	C - EF2 - MAF - MW - WTT - 28100030007 - I&C Works	0																									
	C - EF2 - 28100030007 - ICW - Indicador	0																									
	C - EF2 - 28100030007 - ICW - Transmisor	0																									
	C - EF2 - 28100030007 - ICW - Actuador	0																									
	C - EF2 - 2900 MINE SERVICES	38	10-Nov-19A	05-Mar-23																	05-Mar-23						
	C - EF2 - MS - 2910 - Mine Fresh Water And Fire Water Systems	15	10-Nov-19A	10-Feb-23																							
	C - EF2 - MS - MFW - 2910001 - Fresh Water Tank (2910-TK-001)	0	05-Oct-20A	01-Aug-22A																	10-Feb-23						
	C - EF2 - MS - MFW - FWT - 29100010000 - Civil Works	0	05-Oct-20A	18-Jul-22A																							
	C - EF2 - 29100010000 - CVW - Excavación	0	05-Oct-20A	19-Jun-21A																							
	K170-69560320	C-F2-29100010000-CVW-Excavacion para cimentación de Tanque	0	05-Oct-20A																							25-Dec-20A
	K170-70530210	C-F2-29100010000-CVW-Excavacion PuestaA Tierra	0	09-Oct-20A	10-Dec-20A																						
	K170-70553910	C-F2-29100010000-CVW-Excavacion Conduit	0	01-Jun-21A	10-Jun-21A																						
	K170-70553920	C-F2-29100010000-CVW-Excavacion Bancoductos	0	11-Jun-21 A	19-Jun-21A																						
	C - EF2 - 29100010000 - CVW - Relleno	0	14-Dec-20A	18-Jul-22A																							
	K171-80560060	C-F2-29100010000-CVW-Relleno interior Tanque 2910-TK-001	0	14-Dec-20A	30-Dec-20A																						
	K170-70530220	C-F2-29100010000-CVW-Relleno PuestaA Tierra	0	26-Jan-22A	14-Feb-22A																						
	K170-70553930	C-F2-29100010000-CVW-Relleno Conduit	0	15-Feb-22A	18-Jul-22A																						
	K170-70553940	C-F2-29100010000-CVW-Relleno Bancoductos	0	19-Feb-22A	13-Jul-22A																						
	C - EF2 - MS - MFW - FWT - 29100010001 - Concrete Works	0	12-Oct-20A	23-Jun-22A																							
	C - EF2 - 29100010001 - CVW - Solado	0	12-Oct-20A	10-Jan-21A																							
	K170-70553948	C-F2-29100010001-CTW-Vaciado Solado (zapatas y tanque)	0	12-Oct-20A	07-Jan-21A																						
	K170-70553950	C-F2-29100010001-CTW-Vaciado Solado (losa)	0	08-Jan-21A	10-Jan-21A																						
	C - EF2 - 29100010001 - CVW - Acero Refuerzo	0																									
	C - EF2 - 29100010001 - CVW - Perno	0	26-Nov-20A	12-Jan-21A																							
	K170-70530250	C-F2-29100010001-CTW-Suministro Y Colocacion Perno	0	26-Nov-20A	12-Jan-21A																						
	C - EF2 - 29100010001 - CVW - Concreto	0	20-Oct-20A	23-Jun-22A																							
	K170-70530240	C-F2-29100010001-CTW-ColocacionAcero Refuerzo - Base de tanque y sumidero	0	20-Oct-20A	06-Nov-20A																						
	K170-70554040	C-F2-29100010001-CTW-Encofrado - Base de tanque y sumidero	0	26-Oct-20A	12-Nov-20A																						
	K170-70554060	C-F2-29100010001-CTW-Vaciado Concreto - Base de tanque y sumidero	0	31-Oct-20A	06-Jan-21A																						
	K171-80560090	C-F2-29100010001-CTW-Vaciado Concreto (Losa, pedestales y sardinel)	0	01-May-21A	21-May-21A																						
	K171-80560450	C-F2-29100010001-CTW-Vaciado Concreto (Bancoductos)	0	06-May-22A	23-Jun-22A																						
	C - EF2 - MS - MFW - FWT - 29100010000 - Mechanical Works (Otro contratista)	0	22-Dec-20A	02-Aug-21A																							
	K171-80560070	C-F2-29100010000-CVW-Montaje de tanque por otro contratista	0	22-Dec-20A	02-Aug-21A																						
	C - EF2 - MS - MFW - FWT - 29100010000 - Piping Works (S/A)	0	08-Jan-22A	23-Jun-22A																							
	K171-80560100	C-F2-29100010001-CTW-Piping Works	0	08-Jan-22A	23-Jun-22A																						
	C - EF2 - MS - MFW - FWT - 29100010000 - I&C Works (S/A)	0	18-Jul-22A	01-Aug-22A																							
	K171-80560110	C-F2-29100010001-CTW-Instrumentation Works	0	18-Jul-22A	01-Aug-22A																						
	C - EF2 - MS - MFW - FWT - 29100010000 - Electrical Works (S/A)	0	20-Jun-21A	10-Jul-22A																							
	K171-80560120	C-F2-29100010001-CTW-Electrical Works	0	20-Jun-21A	04-Nov-21A																						
	K171-80560440	C-F2-29100010001-CTW-PAT	0	01-Jun-22A	10-Jul-22A																						
	C - EF2 - MS - MFW - 2910005 - Piping A/G	0																									
	C - EF2 - MS - MFW - PAG - 29100050001 - Concrete Works	0																									
	C - EF2 - 29100050001 - CTW - Solado	0																									
	C - EF2 - 29100050001 - CTW - Acero Refuerzo	0																									
	C - EF2 - 29100050001 - CTW - Perno	0																									
	C - EF2 - 29100050001 - CTW - Concreto	0																									
	C - EF2 - MS - MFW - PAG - 29100050005 - Piping Works	0																									
	C - EF2 - 29100050005 - PPW - Fabricación Spools	0																									
	C - EF2 - 29100050005 - PPW - Fabricación Uniones Spools	0																									
	C - EF2 - 29100050005 - PPW - Instalación Tuberías	0																									
	C - EF2 - 29100050005 - PPW - Instalación Uniones Tuberías	0																									
	C - EF2 - 29100050005 - PPW - Modificación Spools	0																									
	C - EF2 - 29100050005 - PPW - Pruebas Tuberías	0																									
	C - EF2 - 29100050005 - PPW - Pruebas Spools	0																									
	C - EF2 - MS - MFW - PAG - 29100050007 - I&C Works	0																									
	C - EF2 - 29100050007 - ICW - Rack Remoto	0																									
	C - EF2 - 29100050007 - ICW - Transmisor	0																									
	C - EF2 - 29100050007 - ICW - Actuador	0																									
	C - EF2 - MS - MFW - 2910006 - Yard Pipes U/G Area Mine Service	15	10-Nov-19A	10-Feb-23																	10-Feb-23						
	C - EF2 - MS - MFW - YP - 29100060000 - Eventos y permisos iniciales	0	10-Nov-19A	22-Feb-20A																							

K-CC2-170 "Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina"
Cronograma Actualizado - Data Date 27Ene2023 - Chancador Primario y Faja Transportadora

Activity Name		Remaining Duration	Start	Finish	November 2022				December 2022				January 2023				February 2023				March 2023																																																				
					12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11																																																			
	C - EF2 - MS - MFW - YP - 29100060000 - Eventos y permisos iniciales	0	10-Nov-19A	22-Feb-20A																																																																					
	K170-A-3080	Demora en entrega de planos	0	10-Nov-19A																								20-Nov-19A																																													
	K170-A-3200	Demora en entrega de área	0	10-Nov-19A																								22-Nov-19A																																													
	K170-A-3090	Demora en entrega de materiales	0	21-Nov-19A																								12-Jan-20A																																													
	K170-A-3210	Entrega de área con restricciones para tubería UG (2810 y 2840)	0	23-Nov-19A																																																																					
	K170-A-3220	Inteferencias con otro Subcontratistas en área entregada (2840)	0	23-Nov-19A																								21-Jan-20A																																													
	K170-70559840	Material and Plans Reception & Truck Shop Platform Revision	0	13-Jan-20A																								27-Jan-20A																																													
	K170-A-3230	Entrega de área 2910 y 2920	0	15-Jan-20A																																																																					
	K170-A-3100	C-F2-29100060000-CVW-Excavacion Zanjas Tuberías - T9 (I)	0	28-Jan-20A																								22-Feb-20A																																													
	C - EF2 - MS - MFW - YP - 29100060000 - Civil Works	0	14-Oct-20A	28-Jul-22A																																																																					
	C - EF2 - 29100060000 - CVW - Excavación	0	14-Oct-20A	04-Feb-22A																																																																					
	K170-70530330	C-F2-29100060000-CVW-Excavacion Zanjas Tuberías - T9	0	14-Oct-20A	04-May-21A																																																																				
	K170-70530385	C-F2-29100060000-CVW-Excavacion Zanjas Tuberías - T1A	0	07-Nov-20A	28-Feb-21A																																																																				
	K170-70530390	C-F2-29100060000-CVW-Excavacion Zanjas Tuberías - T1B (CS)	0	23-Nov-20A	25-Feb-21A																																																																				
	K170-70530410	C-F2-29100060000-CVW-Excavacion Zanjas Tuberías - T2B	0	07-Jan-21A	28-Feb-21A																																																																				
	K170-70530400	C-F2-29100060000-CVW-Excavacion Zanjas Tuberías - T7, T2A, T3(HDPE)	0	01-Apr-21A	23-Jul-21A																																																																				
	K170-70530360	C-F2-29100060000-CVW-Excavacion Zanjas Tuberías - T4	0	28-Aug-21A	04-Feb-22A																																																																				
	K170-70530375	C-F2-29100060000-CVW-Excavacion Zanjas Tuberías - T6	0	04-Sep-21A	23-Oct-21A																																																																				
	C - EF2 - 29100060000 - CVW - Relleno	0	25-Nov-20A	28-Jul-22A																																																																					
	K170-70530340	C-F2-29100060000-CVW-Relleno Arena	0	25-Nov-20A																								29-Aug-21A																																													
	K170-70554370	C-F2-29100060000-CVW-Relleno Tuberías	0	02-Jan-21A																								11-Sep-21A																																													
	K170-70554380	C-F2-29100060000-CVW-Relleno Comun	0	16-Jan-21A																								28-Jul-22A																																													
	C - EF2 - MS - MFW - YP - 29100060000 - Concrete Works	0	02-Feb-22A	30-Sep-22A																																																																					
	C - EF2 - 29100060000 - CTW - Machones y Anclajes	0	02-Feb-22A	30-Sep-22A																																																																					
	K170-80562290	C-F1-26100060001-CTW-Colocacion Acero Refuerzo - Muro	0	02-Feb-22A																																															02-Aug-22A																						
	K170-80562300	C-F1-26100060001-CTW- Colocación de Encofrado	0	09-Feb-22A																																															30-Sep-22A																						
	K170-80562310	C-F1-26100060001-CTW- Colocación de Concreto Muro	0	16-Feb-22A																																															22-Jun-22A																						
	C - EF2 - MS - MFW - YP - 29100060005 - Piping Works	15	09-Feb-20A	10-Feb-23																																																																10-Feb-23					
	C - EF2 - 29100060005 - PPW - Fabricación Uniones Spools	0																				10-Feb-23																																																			
	C - EF2 - 29100060005 - PPW - Instalación Tuberías UG	15	09-Feb-20A	10-Feb-23																																																																					
	C - EF2 - 29100060005 - PPW - ITUG - Tramo 9 - HDPE 2, 3, 4, 6, 8, 10 y 12	0	09-Feb-20A	15-May-22A																																																																					
	K170-80561220	C-F2-29100060005-PPW-Traslado, soldado e instalacion Tuberías UG (Etapa I)	0	09-Feb-20A																																																																					
	K170-70557380	C-F2-29100060005-PPW-Traslado, soldado e instalacion Tuberías UG - Tramo 9	0	22-Oct-20A																								08-May-22A																																													
	K170-70557390	C-F2-29100060005-PPW-Pruebas y colocación de accesorios - Tramo 9	0	09-Nov-20A																								15-May-22A																																													
	C - EF2 - 29100060005 - PPW - ITUG - Tramo 2B - HDPE 4, 6, 8, 10, 12 y 16	0	17-Jan-21A	14-Oct-21A																																																																					
	K170-70558610	C-F2-29100060005-PPW-Traslado, soldado e instalacion Tuberías UG -Tramo 2B	0	17-Jan-21A																								14-Oct-21A																																													
	K170-70558620	C-F2-29100060005-PPW-Pruebas y colocación de accesorios - Tramo 2B	0	20-Jan-21A																								14-Oct-21A																																													
	C - EF2 - 29100060005 - PPW - ITUG - Tramo 7 - HDPE 10, 12, 16, 20 y 30	0	16-Jan-21A	12-Feb-22A																																																																					
	K170-80562670	C-F2-29100060005-PPW-raslado, soldado e instalacion Tuberías UG - Tramo 7	0	16-Jan-21A	29-Jan-21A																																																																				
	K170-70558820	C-F2-29100060005-PPW-Traslado, soldado e instalacion Tuberías UG - Tramo 7	0	20-Mar-21A	20-Dec-21A																																																																				
	K170-70558830	C-F2-29100060005-PPW-Pruebas y colocación de accesorios - Tramo 7	0	18-Dec-21A	12-Feb-22A																																																																				
	C - EF2 - 29100060005 - PPW - ITUG - Tramo 8 - HDPE 10	0																																																																							
	C - EF2 - 29100060005 - PPW - ITUG - Tramo 2A - HDPE 4, 6 y 12	0	16-Jan-21A	18-Dec-21A																																																																					
	K170-70540060	C-F2-29100060005-PPW-raslado, soldado e instalacion Tuberías UG - Tramo 2A (Primera	0	16-Jan-21A	29-Jan-21A																																																																				
	K170-70558650	C-F2-29100060005-PPW-Pruebas y colocación de accesorios - Tramo 2A	0	13-Feb-21A	18-Dec-21A																																																																				
K170-70558640	C-F2-29100060005-PPW-Traslado, soldado e instalacion Tuberías UG - Tramo 2A	0	24-Apr-21A	12-Nov-21A																																																																					
C - EF2 - 29100060005 - PPW - ITUG - Tramo 1B - HDPE 10 y CS 6"	15	31-Oct-20A	10-Feb-23																		10-Feb-23																																																				
C - EF2 - 29100060005 - PPW - ITUG - Tramo 1B - HDPE 10	14	31-Oct-20A	10-Feb-23																																									10-Feb-23																													
K170-80560780	Hilo 2: Puesta en obra de Leak Deteccion y separadores Spider	0	31-Oct-20A																																																																						
K170-80560790	C-F2-29100060005-PPW-Indefiniciones de Ingeniería por dimensiones spiders (RFI)	0	01-Nov-20A																																															16-Jun-21A																							
K170-80560510	C-F2-29100060005-PPW-Traslado, soldado e instalacion Tuberías UG - Tramo 1B	14	14-Feb-21A																																															10-Feb-23																							
K170-80560770	Hilo 1:Aprobacion de Presupuesto de Adicional	0	25-Apr-21A																																																																						
K170-80560520	C-F2-29100060005-PPW-Pruebas y colocación de accesorios - Tramo 1B	7	08-Jan-22A																																															10-Feb-23																							
C - EF2 - 29100060005 - PPW - ITUG - Tramo 1B - CS 6"	15	14-Feb-21A	10-Feb-23																																																																10-Feb-23						
K170-80560530	C-F2-29100060005-PPW-Traslado, soldado e instalacion Tuberías CS - Tramo 1B	0	14-Feb-21A																																																																						11-Sep-22A
K170-80560540	C-F2-29100060005-PPW-Pruebas y colocación de accesorios - Tramo 1B	0	01-May-21A																																																																						11-Sep-22A
K170-80562850	C-F1-29300010004-MEW-Reinicio deActividades para el Terminio de la Linea Diesel	0	06-Nov-22A																																																																						
K170-80562830	C-F2-29100060005-PPW-Traslado, soldado e instalacion Tuberías CS - Tramo 1B	15	07-Nov-22A	10-Feb-23																																																																					
K170-80562840	C-F2-29100060005-PPW-Pruebas y colocación de accesorios - Tramo 1B	15	07-Nov-22A	10-Feb-23																																																																					
C - EF2 - 29100060005 - PPW - ITUG - Tramo 6 - HDPE 3, 4, 6, 8, 12 y 16	0	01-Jan-21A	06-Nov-21A																																																																						
K170-80562660	C-F2-29100060005-PPW-Traslado y Termofusión	0	01-Jan-21A																								16-Jan-21A																																														
K170-70558670	C-F2-29100060005-PPW-Traslado, soldado e instalacion Tuberías UG - Tramo 6	0	12-Jul-21A																								17-Aug-21A																																														
K170-70558680	C-F2-29100060005-PPW-Pruebas y colocación de accesorios UG - Tramo 6	0	19-Jul-21A																								16-Oct-21A																																														
K170-80560550	C-F2-29100060005-PPW-Traslado, soldado e instalacion Tuberías PVC 8" - Tramo 6	0	02-Oct-21A																								06-Nov-21A																																														

K-CC2-170 "Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina"
Cronograma Actualizado - Data Date 27Ene2023 - Chancador Primario y Faja Transportadora

[illegible]

K170 Primary Crusher Conveyor Belt EXECUTION SCHEDULE

Page 19 of 32

Date	Revision	Checked	Approved
29-Apr-22	REVISIÓN 0	MM	IM


 Actual Work  Milestone
 Remaining Work  Summary
 Critical

K-CC2-170 "Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina"
Cronograma Actualizado - Data Date 27Ene2023 - Chancador Primario y Faja Transportadora


Activity ID		Activity Name	Remaining Duration	Start	Finish	November 2022				December 2022				January 2023				February 2023				March 2023																			
						12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11																		
		C - EF2 - 29100060005 - PPW - PT - Tramo 1A - HDPE 3, 6, 8 y 10	0																																						
		C - EF2 - 29100060005 - PPW - PT - Tramo 3 - HDPE 4, 6, 8 y 10	0																																						
		C - EF2 - 29100060005 - PPW - PT - Tramo 1Ay 3- Carbon Steel	0																																						
		C - EF2 - 29100060005 - PPW - Pruebas Spools	0																																						
		C - EF2 - 29100060005 - PPW - PS - Tramo 9 - HDPE 2, 3, 4, 6, 8, 10 y 12	0																																						
		C - EF2 - 29100060005 - PPW - PS - Tramo 2B - HDPE 4, 6, 8, 10, 12 y 16	0																																						
		C - EF2 - 29100060005 - PPW - PS - Tramo 7 y 8 - HDPE 10, 12, 16, 20 y 30	0																																						
		C - EF2 - 29100060005 - PPW - PS - Tramo 2Ay 1B - HDPE 4, 6, 10 y 12	0																																						
		C - EF2 - 29100060005 - PPW - PS - Tramo 6 - HDPE 3, 4, 6, 8, 12 y 16	0																																						
		C - EF2 - 29100060005 - PPW - PS - Tramo 4 - HDPE 4, 6, 8 y 10	0																																						
		C - EF2 - 29100060005 - PPW - PS - Tramo 1A - HDPE 3, 6, 8 y 10	0																																						
		C - EF2 - 29100060005 - PPW - PS - Tramo 3 - HDPE 4, 6, 8 y 10	0																																						
		C - EF2 - 29100060005 - PPW - PS - Tramo 1Ay 3- Carbon Steel	0																																						
		C - EF2 - MS - 2920 - Potable Water System	20	28-Sep-20A	15-Feb-23																																				
		C - EF2 - MS - PWS - 2920001 - Potable Water Tank (2920-TK-001)	20	28-Sep-20A	15-Feb-23																																				
			C - EF2 - MS - PWS - PWT - 29200010001 - Civil Works (S/A)	0	28-Sep-20A	18-May-22A																																			
		K170-80560320	C-F2-29200010001-CTW-Excavación base de tanque	0	28-Sep-20A	01-Feb-21A																																			
		K170-80561010	C-F2-29200010001-CTW-Excavación y relleno de PAT	0	03-Oct-20A	04-Feb-21A																																			
		K170-80561020	C-F2-29200010001-CTW-Relleno Estructural Contorno	0	01-Feb-21A	16-Feb-21A																																			
		K170-80562330	C-F2-29200010001-CTW-Relleno Estructural Bancoductos	0	11-May-22A	18-May-22A																																			
			C - EF2 - MS - PWS - PWT - 29200010001 - Concrete Works	0	03-Oct-20A	25-May-22A																																			
			C - EF2 - 29200010001 - CTW - Solado	0	03-Oct-20A	12-Oct-20A																																			
		K170-70554390	C-F2-29200010001-CTW-Vaciado Solado	0	03-Oct-20A	12-Oct-20A																																			
			C - EF2 - 29200010001 - CTW - Acero Refuerzo	0																																					
			C - EF2 - 29200010001 - CTW - Perno	0	19-Oct-20A	19-Oct-20A																																			
		K170-70530380	C-F2-29200010001-CTW-Suministro Y Colocacion Perno	0	19-Oct-20A	19-Oct-20A																																			
			C - EF2 - 29200010001 - CTW - Concreto	0	13-Oct-20A	25-May-22A																																			
		K170-70530370	C-F2-29200010001-CTW-ColocacionAcero Refuerzo Concreto	0	13-Oct-20A	07-Feb-21A																																			
		K170-70554480	C-F2-29200010001-CTW-Encofrado Concreto	0	13-Oct-20A	04-Mar-21A																																			
		K170-70554500	C-F2-29200010001-CTW-Vaciado Concreto (cimentación de tanque)	0	29-Oct-20A	19-Mar-21A																																			
		K170-80562340	C-F2-29200010001-CTW-Vaciado Concreto Bancoductos	0	29-Apr-22A	25-May-22A																																			
			C - EF2 - MS - PWS - PWT - 29200010001 - Mechanical Works (Otro Contratista)	0	01-May-21A	14-Oct-21A																																			
		K171-80560460	C-F2-29100010000-CVW-Area disponible para ingreso de Imco	0	01-May-21A	22-Sep-21A																																			
		K171-80560130	C-F2-29100010000-CVW-Montaje de Tanque por Otro Contratista	0	23-Sep-21A	14-Oct-21A																																			
			C - EF2 - MS - PWS - PWT - 29200010001 - Piping Works (S/A)	0	14-Feb-22A	04-May-22A																																			
		K171-80560140	C-F2-29100010001-CTW-Piping Works	0	14-Feb-22A	04-May-22A																																			
			C - EF2 - MS - PWS - PWT - 29200010001 - Electrical Works	20	21-Apr-21A	15-Feb-23																																			
			C - EF2 - 29200010001 - ELW - Cable Desnudo Puesta a Tierra	0	21-Apr-21A	30-Apr-21A																																			
		K170-70554560	C-F2-29200010006-ELW-Montaje Cable Desnudo PuestaA Tierra	0	21-Apr-21A	30-Apr-21A																																			
			C - EF2 - 29200010001 - ELW - Conduit	20	28-Mar-22A	15-Feb-23																																			
		K170-70554540	C-F2-29200010006-ELW-Montaje Conduit	20	28-Mar-22A	15-Feb-23																																			
			C - EF2 - 29200010001 - ELW - Cable Fuerz, Control e Instrumentación	0	03-Jul-22A	06-Aug-22A																																			
		K170-70554590	C-F2-29200010006-ELW-Tendido Cable Fuerza y conexonado / alumbrado	0	03-Jul-22A	06-Aug-22A																																			
			C - EF2 - MS - PWS - PWT - 29200010007 - I&C Works	0	03-Jul-22A	09-Aug-22A																																			
			C - EF2 - 29200010007 - ICW - Indicador	0	03-Jul-22A	09-Aug-22A																																			
		K170-70554620	C-F2-29200010007-ICW-Montaje Indicador (Indicador de presión)	0	03-Jul-22A	09-Aug-22A																																			
			C - EF2 - MS - 2930 - Plan Water Treatment Plant	38	29-Oct-20A	05-Mar-23																																			
			C - EF2 - MS - PWT - 2930001 - Reverse Osmosis And Potable Water Treatment Plant	38	29-Oct-20A	05-Mar-23																																			
			C - EF2 - MS - PWT - ROP - 29300010004 - Civil Works (S/A)	15	29-Oct-20A	10-Feb-23																																			
		K170-80562350	C-F2-29100010001-CVW- Excavación para Fundaciones	0	29-Oct-20A	31-Oct-20A																																			
		K170-80560210	C-F2-29100010001-CVW- Excavación y relleno para PAT	15	07-Nov-20A	10-Feb-23																																			
			C - EF2 - MS - PWT - ROP - 29300010004 - Concrete Works (S/A)	0	01-Oct-21A	15-Dec-22A																																			
		K170-80560330	C-F2-29100010001-CTW-Fundaciones	0	01-Oct-21A	18-Oct-21A																																			
		K170-80562370	C-F2-29100010001-CTW-Bancoductos	0	04-Dec-22A	15-Dec-22A																																			
			C - EF2 - MS - PWT - ROP - 29300010004 - Mechanical Works	10	10-Sep-21A	05-Feb-23																																			
			C - EF2 - 29300010004 - MEW - Planta Ósmosis	10	17-Sep-21A	05-Feb-23																																			
		K170-70554670	C-F1-29300010004-MEW-Montaje Mecanicos PlantaAgua Potable (2930-WT-001)	5	17-Sep-21A	31-Jan-23																																			
		K170-70554680	C-F1-29300010004-MEW-Montaje PlantaAgua Potable (2930-WT-001)	8	17-Sep-21A	05-Feb-23																																			
		K170-70554690	C-F1-29300010004-MEW-Reinicio deActividades tras la definición de ingenieria	0	01-Jan-23A																																				
		K170-70554700	C-F1-29300010004-MEW-Montaje de Tuberias PlantaAgua Potable (2930-WT-001)	4	23-Jan-23A	04-Feb-23																																			
			C - EF2 - 29300010004 - MEW - Planta Agua Potable	6	10-Sep-21A	05-Feb-23																																			
		K170-70554710	C-F1-29300010004-MEW-Montaje Mecanicos Planta Osmosis (2920-WT-001)	5	10-Sep-21A	05-Feb-23																																			

K-CC2-170 "Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina"

Cronograma Actualizado - Data Date 27Ene2023 - Chancador Primario y Faja Transportadora

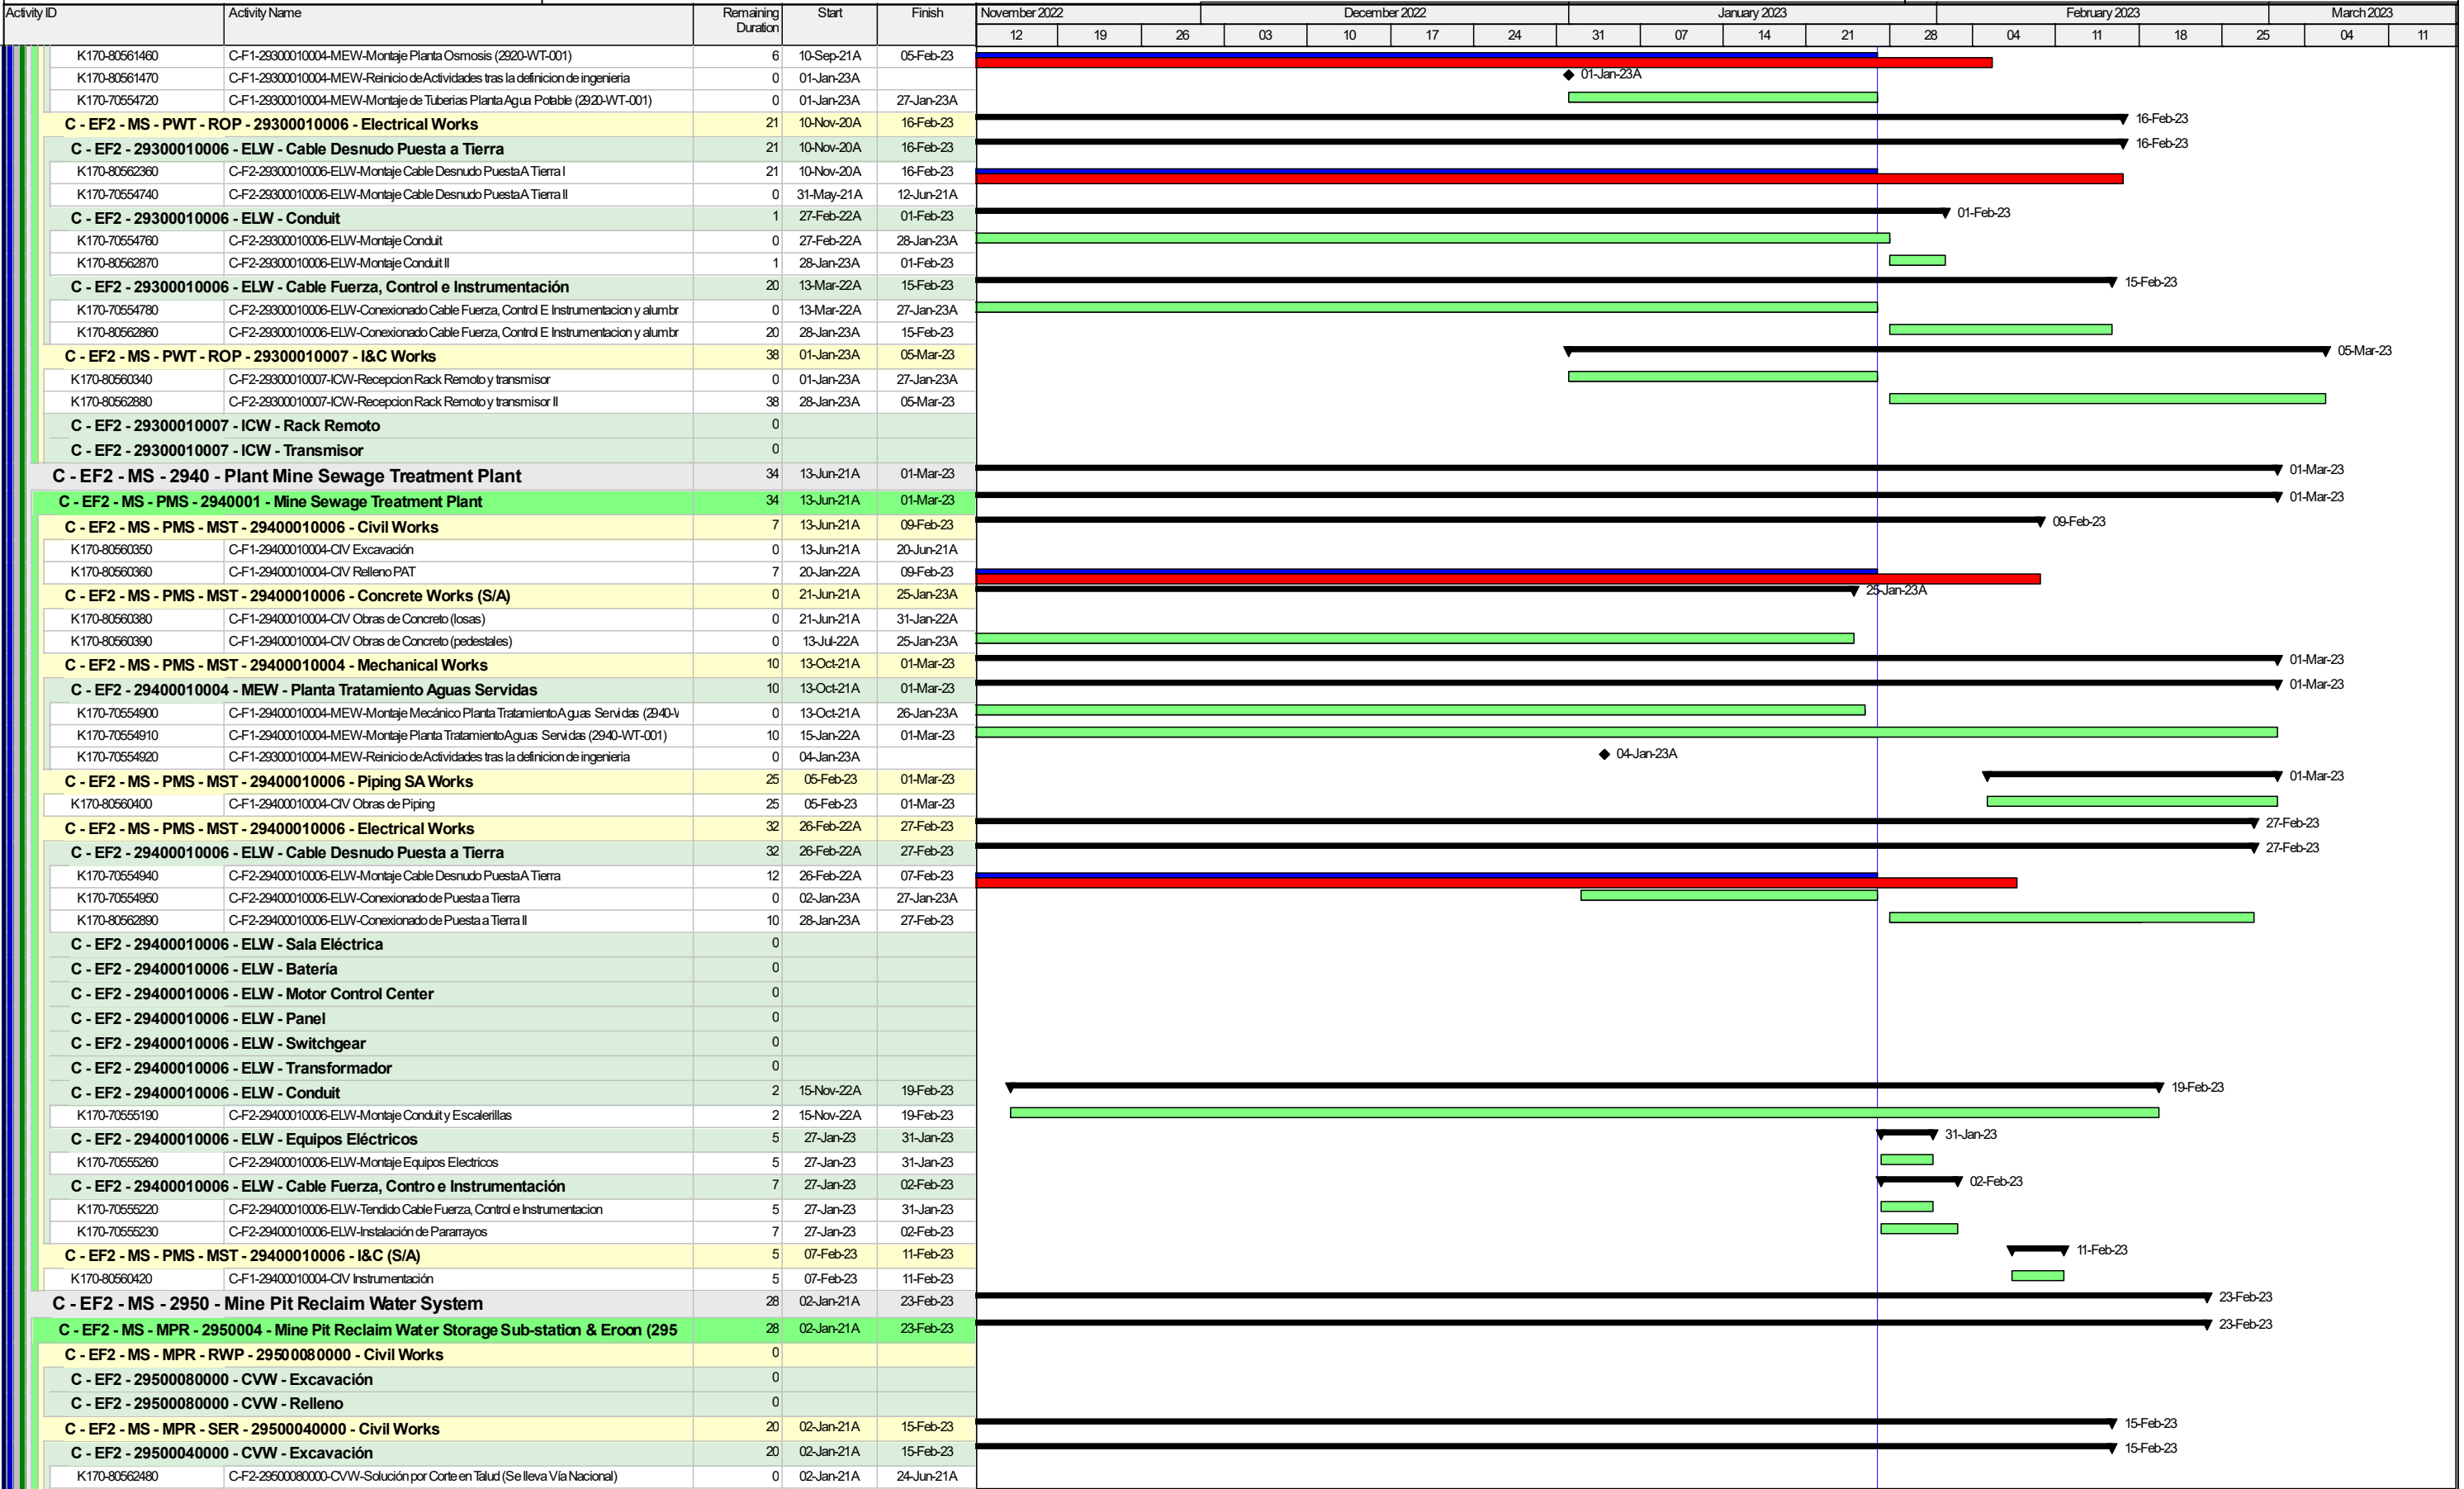

K-CC2-170 "Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina"
Cronograma Actualizado - Data Date 27Ene2023 - Chancador Primario y Faja Transportadora

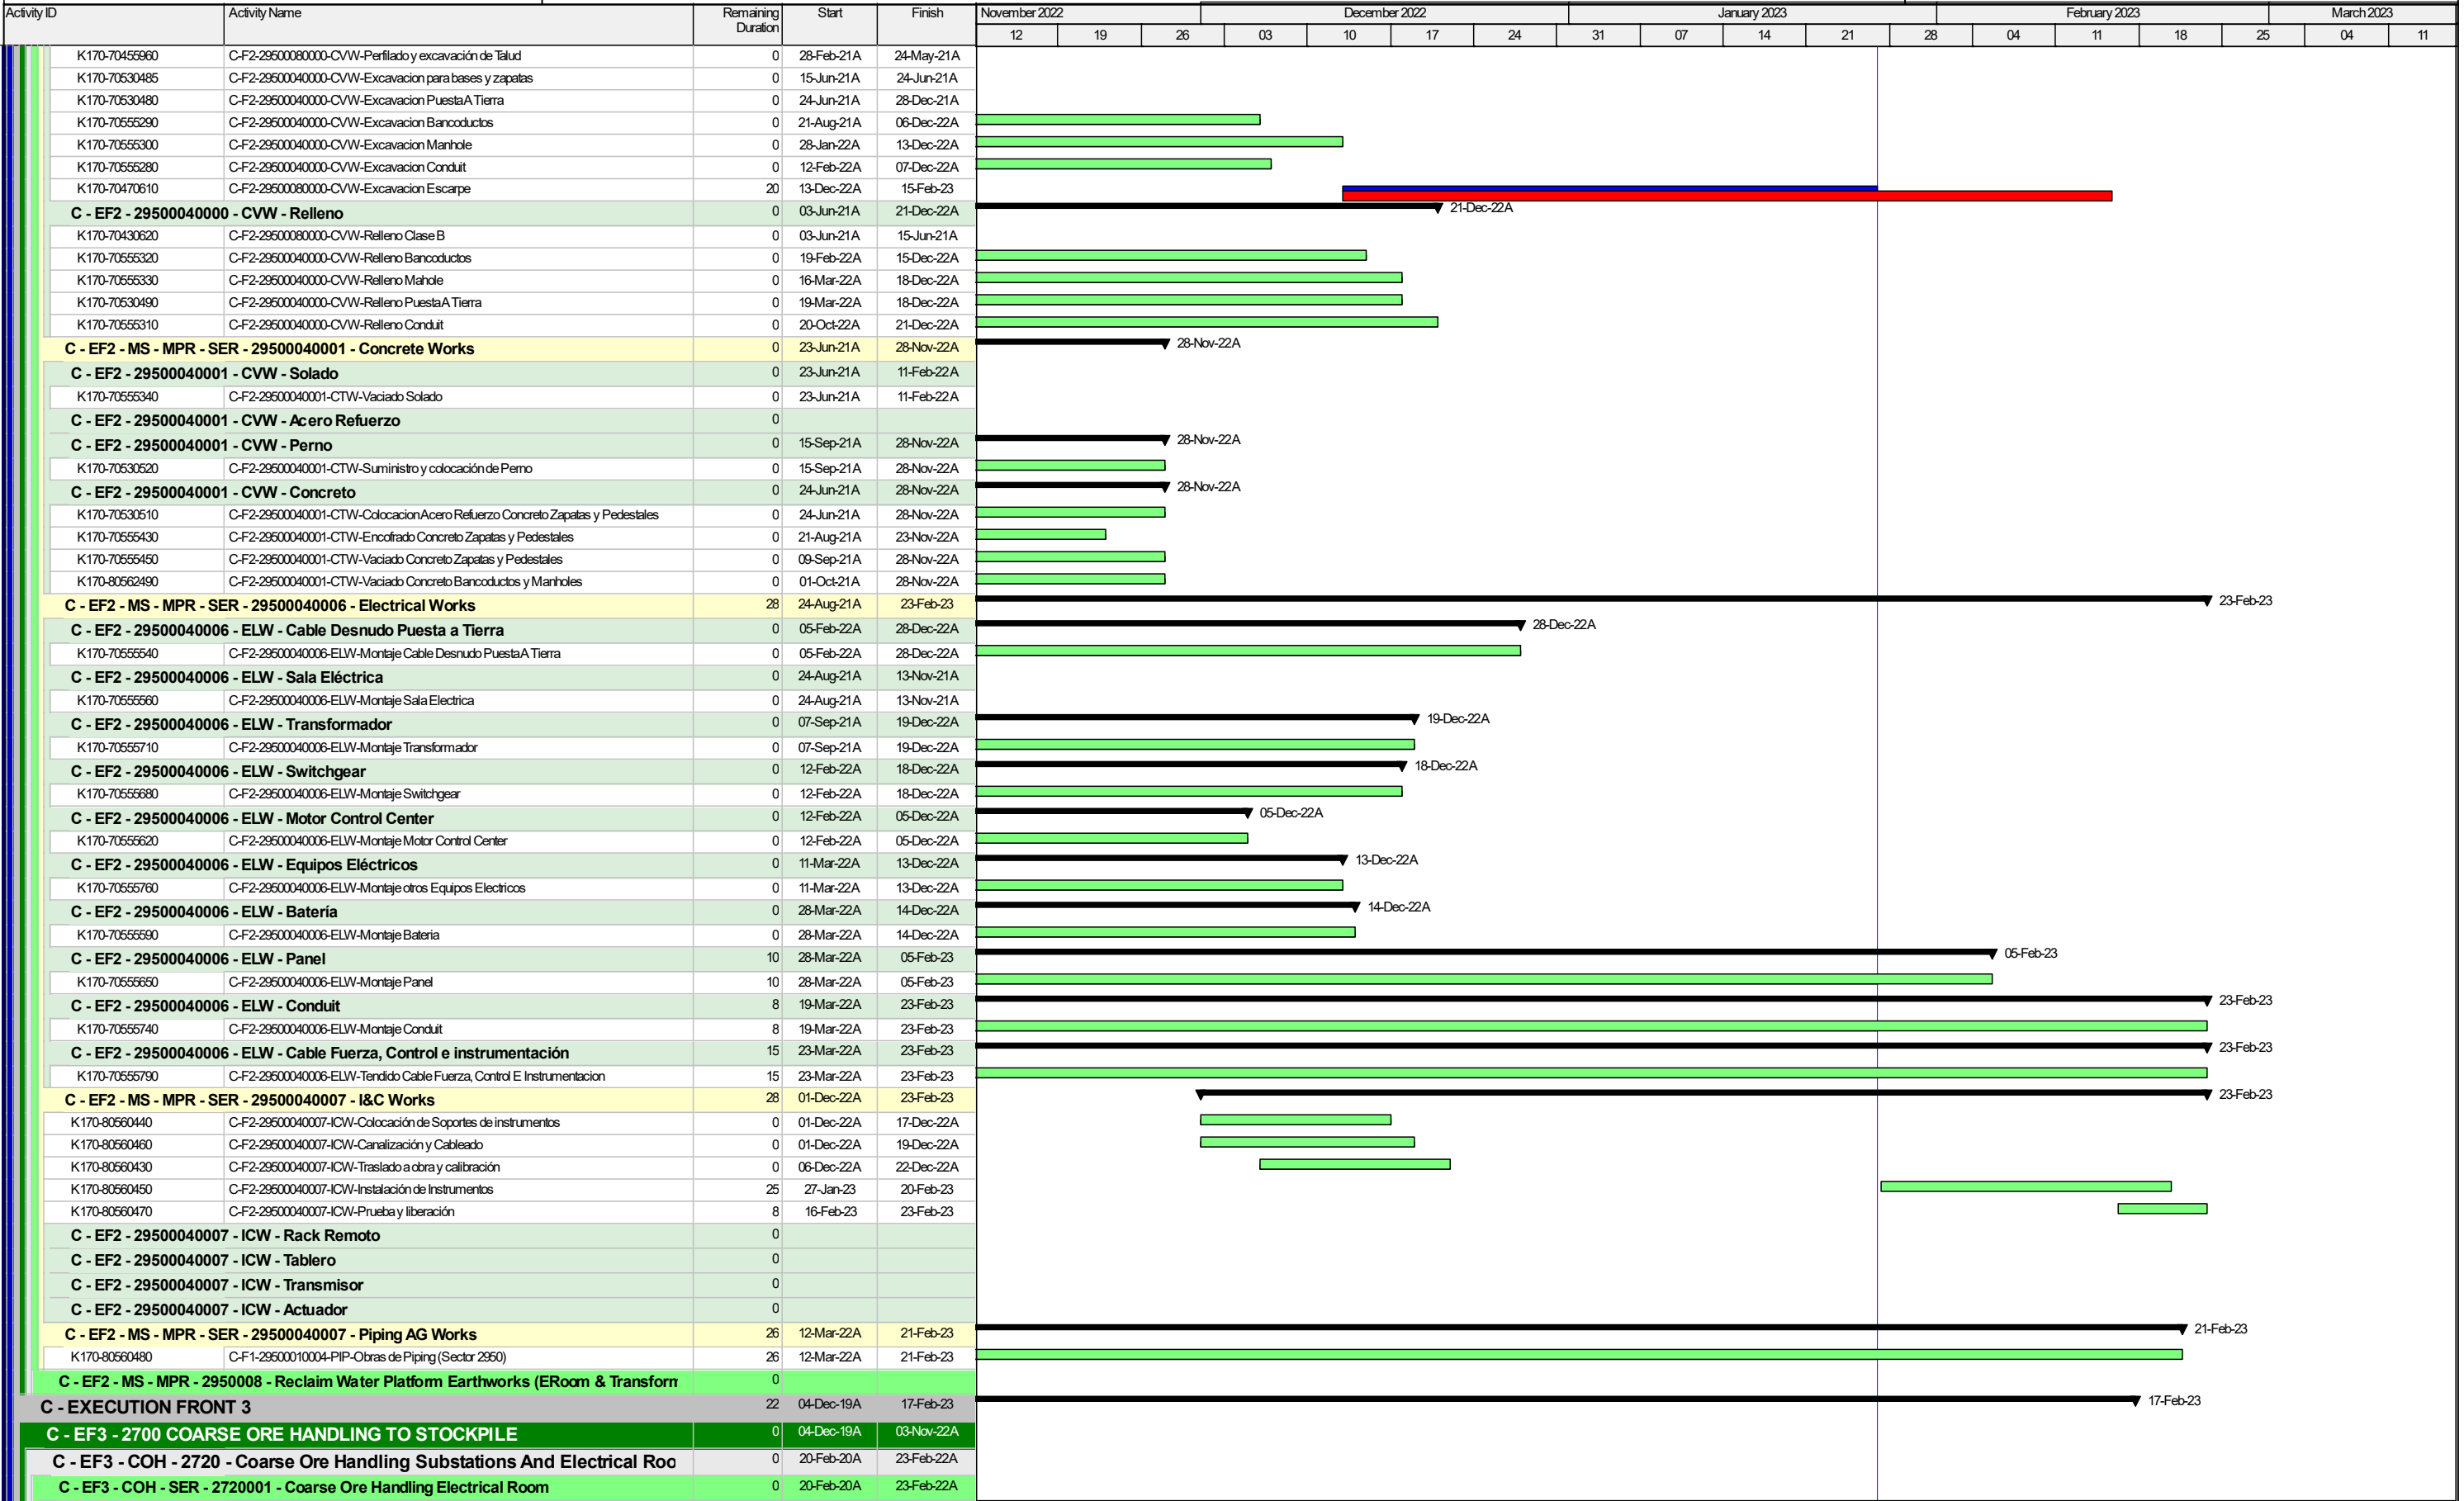

		K-CC2-170 "Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina"																						
		Cronograma Actualizado - Data Date 27Ene2023 - Chancador Primario y Faja Transportadora																						
Activity ID	Activity Name	Remaining Duration	Start	Finish	November 2022			December 2022				January 2023				February 2023				March 2023				
					12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11		
	C - EF3 - COH - SER - ER - 27200010000 - Civil Works	0	20-Feb-20A	23-Feb-22A																				
	C - EF3 - 27200010000 - CVW - Excavación	0	20-Feb-20A	18-Dec-21A																				
	K170-70530630	0	20-Feb-20A	08-Mar-20A																				
	K170-70544570	0	31-Oct-20A	05-Feb-21A																				
	K170-70544540	0	03-Jun-21A	22-Jun-21A																				
	K170-70544550	0	13-Nov-21A	18-Dec-21A																				
	K170-70544560	0	08-Dec-21A	18-Dec-21A																				
	C - EF3 - 27200010000 - CVW - Relleno	0	12-Nov-20A	23-Feb-22A																				
	K170-70530640	0	12-Nov-20A	10-Feb-21A																				
	K170-70544610	0	13-Nov-21A	18-Dec-21A																				
	K170-70544590	0	08-Jan-22A	26-Jan-22A																				
	K170-70544600	0	26-Jan-22A	13-Feb-22A																				
	K170-70544580	0	13-Feb-22A	23-Feb-22A																				
	C - EF3 - COH - SER - ER - 27200010001 - Concrete Works	0	25-Feb-20A	18-Dec-21A																				
	C - EF3 - 27200010001 - CVW - Solado	0	25-Feb-20A	03-Mar-20A																				
	K170-70544620	0	25-Feb-20A	03-Mar-20A																				
	C - EF3 - 27200010001 - CVW - Acero Refuerzo	0																						
	C - EF3 - 27200010001 - CVW - Perno	0	08-Jul-20A	07-Oct-20A																				
	K170-70530670	0	08-Jul-20A	07-Oct-20A																				
	C - EF3 - 27200010001 - CVW - Concreto	0	04-Mar-20A	18-Dec-21A																				
	K170-70530660	0	04-Mar-20A	12-Jun-20A																				
	K170-70530680	0	23-Jun-20A	17-Jul-20A																				
	K170-70544730	0	15-Sep-20A	29-Sep-20A																				
	K170-70544710	0	20-Oct-20A	13-Nov-20A																				
	K170-80560890	0	22-Apr-21A	31-May-21A																				
	K170-80562500	0	09-May-21A	18-Dec-21A																				
	C - EF3 - COH - SER - ER - 27200010006 - Electrical Works	0	09-Mar-20A	04-Dec-21A																				
	C - EF3 - 27200010006 - ELW - Cable Desnudo Puesta a Tierra	0	09-Mar-20A	04-Dec-21A																				
	C - EF3 - 27200010006 - ELW - PAT Sala Eléctrica	0	09-Mar-20A	27-Oct-20A																				
	K170-70544770	0	09-Mar-20A	15-Mar-20A																				
	K170-70544780	0	03-Oct-20A	27-Oct-20A																				
	C - EF3 - 27200010006 - ELW - PAT Interconexión	0	12-Oct-20A	04-Dec-21A																				
	K170-70558430	0	12-Oct-20A	04-Dec-21A																				
	C - EF3 - 27200010006 - ELW - Sala Eléctrica	0	24-Oct-20A	19-Jun-21A																				
	K170-70530810	0	24-Oct-20A	05-Mar-21A																				
	K170-80561650	0	19-Nov-20A	21-Nov-20A																				
	K170-80562400	0	24-Dec-20A	30-Jan-21A																				
	K170-80562430	0	01-Mar-21A	15-Mar-21A																				
	K170-70544790	0	02-May-21A	19-Jun-21A																				
	C - EF3 - 27200010006 - ELW - Transformador	0	03-Jun-21A	12-Jun-21A																				
	K170-70544920	0	03-Jun-21A	12-Jun-21A																				
	C - EF3 - 27200010006 - ELW - Switchgear	0	15-Aug-21A	20-Aug-21A																				
	K170-70544890	0	15-Aug-21A	20-Aug-21A																				
	C - EF3 - 27200010006 - ELW - Motor Control Center	0	15-Aug-21A	20-Aug-21A																				
	K170-70544830	0	15-Aug-21A	20-Aug-21A																				
	C - EF3 - 27200010006 - ELW - Otros Equipos Menores	0	07-Apr-21A	12-Nov-21A																				
	K170-70545060	0	07-Apr-21A	06-Oct-21A																				
	K170-70544800	0	15-Aug-21A	20-Aug-21A																				
	K170-70544860	0	12-Oct-21A	05-Nov-21A																				
	K170-70545030	0	12-Oct-21A	11-Nov-21A																				
	K170-70545080	0	12-Oct-21A	11-Nov-21A																				
	K170-70545010	0	12-Oct-21A	11-Nov-21A																				
K170-70544990	0	12-Oct-21A	11-Nov-21A																					
K170-70545100	0	12-Oct-21A	11-Nov-21A																					
K170-70545120	0	12-Oct-21A	12-Nov-21A																					
C - EF3 - 27200010006 - ELW - Panel	0																							
C - EF3 - 27200010006 - ELW - Batería	0																							
C - EF3 - 27200010006 - ELW - Iluminación Emergencia	0																							
C - EF3 - 27200010006 - ELW - Luminaria	0																							
C - EF3 - 27200010006 - ELW - Proyector LED	0																							
C - EF3 - 27200010006 - ELW - Accesorio Eléctrico	0																							
C - EF3 - 27200010006 - ELW - Canalización	0	11-Jun-21 A	12-Nov-21A																					
K170-70544950	0	11-Jun-21 A	12-Nov-21A																					

K170 Primary Crusher Conveyor Belt

EXECUTION SCHEDULE

Page 23 of 32

Date	Revision	Checked	Approved
29-Apr-22	REVISIÓN 0	MM	IM

Actual Work

Remaining Work

Critical

Milestone

Summary

Activity Name		Remaining Duration	Start	Finish	November 2022				December 2022				January 2023				February 2023				March 2023			
					12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11		
K170-70544960		C-F3-27200010006-ELW-Instalación Bandejas	0	13-Oct-21A	12-Nov-21A																			
C - EF3 - 27200010006 - ELW - Escalerilla Portaconductor		0																						
C - EF3 - 27200010006 - ELW - Cable Fuera, Control e Instrumentación		0	08-Oct-21A	12-Nov-21A																				
K170-70545150		C-F3-27200010006-ELW-Tendido Cable Fuerza, Control E Instrumentacion	0	08-Oct-21A	12-Nov-21A																			
K170-70545160		C-F3-27200010006-ELW-Conexionado Cable Fuerza, Control E Instrumentacion	0	15-Oct-21A	12-Nov-21A																			
C - EF3 - 27200010006 - ELW - Variable Frequency Drive		0																						
C - EF3 - 27200010006 - ELW - Pararrayos		0	10-Dec-20A	27-Oct-21A																				
K170-70544970		C-F3-27200010006-ELW-Montaje Pararrayos	0	10-Dec-20A	27-Oct-21A																			
C - EF3 - COH - 2730D - Conveyor Belt From Primary Crusher Ore To Stockp		0	04-Dec-19A	03-Nov-22A																				
C - EF3 - COH - CBS - 2730001D - Overland Conveyor Belt To Ore Stockpile		0	04-Dec-19A	03-Nov-22A																				
C - EF3 - COH - CBS - OCB - 27300010001D - Concrete Works		0	04-Dec-19A	26-Dec-21A																				
Eventos y permisos iniciales		0	04-Dec-19A	03-Feb-20A																				
K170-70558590		Revisión y Replanteo de Excavaciones	0	04-Dec-19A	24-Dec-19A																			
K170-A-4020		Demora en entrega de Fichas técnicas de puntos geodésicos	0	04-Dec-19A	06-Jan-20A																			
K170-A-4030		Levantamiento topográfico	0	07-Jan-20A	20-Jan-20A																			
K170-A-4040		Traslado de andamios y generación de accesos	0	21-Jan-20A	03-Feb-20A																			
Trabajos adicionales		0	29-Dec-19A	10-Nov-21A																				
Preliminares		0	29-Dec-19A	10-Mar-20A																				
K170-A-4050		Tiempo de solicitud y aprobación de adicional	0	29-Dec-19A	29-Jan-20A																			
K170-A-4130		EXCAVACIÓN: Cepas 24, 25 y 26	0	09-Feb-20A	21-Feb-20A																			
K170-A-4060		Construcción de accesos temporales (SDC-007)	0	22-Feb-20A	10-Mar-20A																			
Plataforma de Grúas (SDC-007)		0	01-Feb-20A	28-Dec-20A																				
K170-A-4120		Excavación Bent 06 y Bent 10	0	01-Feb-20A	04-Mar-20A																			
K170-A-4070		Construcción de accesos Temporales (SDC-011)	0	27-Nov-20A	08-Dec-20A																			
K170-A-4110		RELLENO: Entre Cepas 09 y 10 (Clase B)	0	10-Dec-20A	28-Dec-20A																			
Movimiento Tierra Fundaciones (SDC-007)		0	15-Dec-20A	31-May-21A																				
K170-A-4100		RELLENO: Excavación material común Bents Cepa24, Cepa25, Cepa26, Plataforma Cep	0	15-Dec-20A	21-May-21A																			
K170-A-4230		RELLENO: Relleno Local en Contorno de Estructuras T mas 3"	0	21-Dec-20A	31-May-21A																			
Muro de Contención - Sistema Motriz (SDC-007)		0	04-Oct-20A	12-Jun-21A																				
K170-A-4080		MURO CONTENCIÓN: Excavación	0	04-Oct-20A	21-Oct-20A																			
K170-A-4090		MURO CONTENCIÓN: Obras de Concreto	0	21-Oct-20A	02-Feb-21A																			
K170-A-4140		MURO CONTENCIÓN: Relleno	0	01-May-21A	21-May-21A																			
K170-A-4180		MURO CONTENCIÓN: Prettí de Seguridad	0	21-May-21A	12-Jun-21A																			
Muro de Contención - Bent 14 (0+094 @ 0+119) - SDC-011		0	01-May-21A	16-Jun-21A																				
K170-A-4150		MURO CONTENCIÓN: Excavación	0	01-May-21A	09-May-21A																			
K170-A-4160		MURO CONTENCIÓN: Obras de Concreto	0	09-May-21A	02-Jun-21A																			
K170-A-4200		MURO CONTENCIÓN: Bolson Drenante de Drenaje	0	24-May-21A	29-May-21A																			
K170-A-4220		BENTS: Excavaciones en cepa 14	0	29-May-21A	04-Jun-21A																			
K170-A-4170		MURO CONTENCIÓN: Relleno	0	01-Jun-21A	07-Jun-21A																			
K170-A-4190		MURO CONTENCIÓN: Prettí de Seguridad	0	08-Jun-21A	11-Jun-21A																			
K170-A-4210		MURO CONTENCIÓN: Barrera de seguridad metálica P3	0	12-Jun-21A	16-Jun-21A																			
Muro de Contención - Bent 08 (0+081 @ 0+101) - SDC-011		0	08-Jun-21A	10-Nov-21A																				
K170-A-4240		MURO CONTENCIÓN: Excavación	0	08-Jun-21A	15-Jun-21A																			
K170-A-4250		MURO CONTENCIÓN: Obras de Concreto	0	16-Jun-21A	08-Oct-21A																			
K170-A-4280		MURO CONTENCIÓN: Bolson Drenante de Drenaje	0	09-Oct-21A	16-Oct-21A																			
K170-A-4260		MURO CONTENCIÓN: Relleno	0	17-Oct-21A	30-Oct-21A																			
K170-A-4300		BENTS: Excavaciones en cepa 08	0	17-Oct-21A	25-Oct-21A																			
K170-A-4270		MURO CONTENCIÓN: Prettí de Seguridad	0	26-Oct-21A	31-Oct-21A																			
K170-A-4290		MURO CONTENCIÓN: Barrera de seguridad metálica P3	0	01-Nov-21A	10-Nov-21A																			
Plataforma de Grúas (SDC-012)		0	22-Dec-20A	26-May-21A																				
K170-A-4310		Excavación - Plataforma de grúas	0	22-Dec-20A	22-Feb-21A																			
K170-A-4320		Relleno Clase B - Plataforma de grúas	0	01-May-21A	26-May-21A																			
C - EF3 - 27300010001D - CTW - Bents		0	04-Feb-20A	18-Dec-21A																				
C - EF3 - 27300010001D - CTW - BNT - B03 to B07		0	04-Feb-20A	12-Mar-21A																				
C - EF3 - 27300010001D - CTW - B03 to B07 Solado		0	04-Feb-20A	07-Feb-20A																				
K170-57301000		C-F3-27300010001D-CTW-Solado Bents (03, 04 ,05 ,06 y 07)+Fundación soporte de truss	0	04-Feb-20A	07-Feb-20A																			
C - EF3 - 27300010001D - CTW - B03 to B07 Acero Refuerzo		0																						
C - EF3 - 27300010001D - CTW - B03 to B07 Perno		0	11-Dec-20A	09-Mar-21A																				
K170-57301270		C-F3-27300010001D-CTW-Suministro Y Colocacion Perno Bents (03, 04 ,05 ,06 y 07)+Fl	0	11-Dec-20A	09-Mar-21A																			
C - EF3 - 27300010001D - CTW - B03 to B07 Concreto		0	08-Feb-20A	12-Mar-21A																				
K170-80561200		C-F3-27300010001D-CTW-Colocacion Acero Refuerzo Concreto Bents (03, 04 ,05 ,06 y 07)	0	08-Feb-20A	29-Feb-20A																			
K170-80561560		C-F3-27300010001D-CTW-Vaciado Concreto (Etapa II)	0	22-Jun-20A	30-Jun-20A																			
K170-57301280		C-F3-27300010001D-CTW-Colocacion Acero Refuerzo Concreto Bents (03, 04 ,05 ,06 y 07)	0	29-Oct-20A	12-Mar-21A																			
K170-57301380		C-F3-27300010001D-CTW-Encofrado Concreto Bents (03, 04 ,05 ,06 y 07)+Fundación 44	0	06-Nov-20A	02-Mar-21A																			

Activity Name		Remaining Duration	Start	Finish	November 2022				December 2022				January 2023				February 2023				March 2023			
					12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11		
	K170-57301400	C-F3-27300010001D-CTW-Vaciado Concreto Bents (03, 04 ,05 ,06 y 07)+Fundación 44	0	16-Nov-20A																				
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - BNT - B08 to B09	0	01-Jun-21A	10-Sep-21A																				
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B08 to B09 Solado	0	01-Jun-21A	04-Jun-21A																				
	K170-57301440	C-F3-27300010001D-CTW-Vaciado Solado Bents (08 y 09)	0	01-Jun-21A	04-Jun-21A																			
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B08 to B09 Acero Refuerzo o	0																						
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B08 to B09 Perno	0	04-Jun-21A	15-Jun-21A																				
	K170-57301120	C-F3-27300010001D-CTW-Suministro Y Colocacion Perno Bents (08 y 09)	0	04-Jun-21A	15-Jun-21A																			
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B08 to B09 Concreto	0	05-Jun-21A	10-Sep-21A																				
	K170-57301130	C-F3-27300010001D-CTW-ColocacionAcero Refuerzo Concreto Bents (08 y 09)	0	05-Jun-21A	15-Jun-21A																			
	K170-57301530	C-F3-27300010001D-CTW-Encofrado Concreto Bents (08 y 09)	0	10-Jun-21A	21-Jun-21A																			
	K170-57301550	C-F3-27300010001D-CTW-Vaciado Concreto Bents (08 y 09)	0	15-Jun-21A	10-Sep-21A																			
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - BNT - B10 to B14	0	06-Dec-20A	19-Mar-21A																				
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B10 to B14 Solado	0	06-Dec-20A	09-Dec-20A																				
	K170-57301590	C-F3-27300010001D-CTW-Vaciado Solado Bents (10, 11, 12, 13 y 14)	0	06-Dec-20A	09-Dec-20A																			
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B10 to B14 Acero Refuerzo o	0																						
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B10 to B14 Perno	0	17-Dec-20A	19-Mar-21A																				
	K170-57301150	C-F3-27300010001D-CTW-Suministro Y Colocacion Perno Bents (10, 11, 12, 13y 14)	0	17-Dec-20A	19-Mar-21A																			
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B10 to B14 Concreto	0	09-Dec-20A	19-Mar-21A																				
	K170-57301160	C-F3-27300010001D-CTW-ColocacionAcero Refuerzo Concreto Bents (10, 11, 12, 13 y 14)	0	09-Dec-20A	19-Mar-21A																			
	K170-57301680	C-F3-27300010001D-CTW-Encofrado Concreto Bents (10, 11, 12, 13 y 14)	0	16-Dec-20A	06-Mar-21A																			
	K170-57301700	C-F3-27300010001D-CTW-Vaciado Concreto Bents (10, 11, 12, 13 y 14)	0	27-Dec-20A	01-Mar-21A																			
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - BNT - B15 to B21	0	17-May-21A	21-Jun-21A																				
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B15 to B21 Solado	0	17-May-21A	31-May-21A																				
	K170-57301030	C-F3-27300010001D-CTW- Solado Bents (15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21)	0	17-May-21A	31-May-21A																			
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B15 to B21 Acero Refuerzo o	0																						
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B15 to B21 Perno	0	18-May-21A	16-Jun-21A																				
	K170-57301180	C-F3-27300010001D-CTW-Suministro Y Colocacion Perno Bents (15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21)	0	18-May-21A	16-Jun-21A																			
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B15 to B21 Concreto	0	20-May-21A	21-Jun-21A																				
	K170-57301190	C-F3-27300010001D-CTW-ColocacionAcero Refuerzo Concreto Bents (15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21)	0	20-May-21A	16-Jun-21A																			
	K170-57301830	C-F3-27300010001D-CTW-Encofrado Concreto Bents (15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21)	0	01-Jun-21A	16-Jun-21A																			
	K170-57301850	C-F3-27300010001D-CTW-Vaciado Concreto Bents (15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21)	0	06-Jun-21A	21-Jun-21A																			
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - BNT - B22 to B22	0	17-Jun-21A	18-Dec-21A																				
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B22 to B22 Solado	0	17-Jun-21A	18-Jun-21A																				
	K170-57301040	C-F3-27300010001D-CTW-Solado Bents (22)	0	17-Jun-21A	18-Jun-21A																			
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B22 to B22 Acero Refuerzo o	0																						
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B22 to B22 Perno	0	20-Jun-21A	10-Dec-21A																				
	K170-57301210	C-F3-27300010001D-CTW-Suministro Y Colocacion Perno Bents (22)	0	20-Jun-21A	10-Dec-21A																			
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B22 to B22 Concreto	0	19-Jun-21A	18-Dec-21A																				
	K170-57301220	C-F3-27300010001D-CTW-ColocacionAcero Refuerzo Concreto Bents (22)	0	19-Jun-21A	10-Dec-21A																			
	K170-57301980	C-F3-27300010001D-CTW-Encofrado Concreto Bents (22)	0	23-Jun-21A	18-Dec-21A																			
	K170-57302000	C-F3-27300010001D-CTW-Vaciado Concreto Bents (22)	0	04-Dec-21A	12-Dec-21A																			
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - BNT - B23 to B26	0	22-Feb-20A	21-Mar-21A																				
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B24 to B26 Solado	0	22-Feb-20A	23-Feb-20A																				
	K170-57301050	C-F3-27300010001D-CTW- Solado Bents (3, 24, 25, y 26)	0	22-Feb-20A	23-Feb-20A																			
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B24 to B26 Acero Refuerzo o	0																						
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B24 to B26 Perno	0	10-Oct-20A	15-Oct-20A																				
	K170-57301240	C-F3-27300010001D-CTW-Suministro Y Colocacion Perno Bents (23, 24, 25, y 26)	0	10-Oct-20A	15-Oct-20A																			
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B24 to B26 Concreto	0	24-Feb-20A	21-Mar-21A																				
	K170-80561210	C-F3-27300010001D-CTW-ColocacionAcero Refuerzo Concreto Bents 25, 26	0	24-Feb-20A	08-Mar-20A																			
	K170-80561570	C-F3-27300010001D-CTW-ColocacionAcero Refuerzo Concreto Bents (23, 24, 25, y 26) - Etapa I	0	23-Jun-20A	14-Jul-20A																			
	K170-80561580	C-F3-27300010001D-CTW-Encofrado Concreto Bents (23, 24, 25, y 26) - Etapa II	0	01-Jul-20A	15-Jul-20A																			
	K170-57301250	C-F3-27300010001D-CTW-ColocacionAcero Refuerzo Concreto Bents (23, 24, 25, y 26)	0	23-Sep-20A	16-Oct-20A																			
	K170-57302130	C-F3-27300010001D-CTW-Encofrado Concreto Bents (23, 24, 25, y 26)	0	24-Sep-20A	06-Jan-21A																			
	K170-57302150	C-F3-27300010001D-CTW-Vaciado Concreto Bents (23, 24, 25, y 26)	0	05-Oct-20A	21-Mar-21A																			
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - Durmientes	0	05-May-21A	26-Dec-21A																				
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - DRM - B07 to B08	0	05-May-21A	20-May-21A																				
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B07 to B08 Solado	0	05-May-21A	10-May-21A																				
	K170-57302310	C-F3-27300010001D-CTW-Vaciado Solado Durmientes (B07-08) y bases auxiliares	0	05-May-21A	10-May-21A																			
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B07 to B08 Acero Refuerzo o	0																						
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B07 to B08 Perno	0	07-May-21A	11-May-21A																				
	K170-57302230	C-F3-27300010001D-CTW-Suministro Y Colocacion Perno Durmientes (B07-08) y bases	0	07-May-21A	11-May-21A																			
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B07 to B08 Concreto	0	09-May-21A	20-May-21A																				
	K170-57302240	C-F3-27300010001D-CTW-ColocacionAcero Refuerzo Concreto Durmientes (B07-08) y bases auxiliares	0	09-May-21A	13-May-21A																			
	K170-57302400	C-F3-27300010001D-CTW-Encofrado Concreto Durmientes (B07-08) y bases auxiliares	0	14-May-21A	19-May-21A																			
	K170-57302420	C-F3-27300010001D-CTW-Vaciado Concreto Durmientes (B07-08) y bases auxiliares	0	16-May-21A	20-May-21A																			

K-CC2-170 "Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina"
Cronograma Actualizado - Data Date 27Ene2023 - Chancador Primario y Faja Transportadora

Activity ID	Activity Name	Remaining Duration	Start	Finish	November 2022				December 2022				January 2023				February 2023				March 2023				
					12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11			
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - DRM - B09 to B10	0	01-Jun-21A	19-Jun-21A																					
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B09 to B10 Solado	0	01-Jun-21A	03-Jun-21A																					
	K170-57302460	C-F3-27300010001D-CTW-Vaciado Solado Durmientes (Bent 09 and Bent 10)	0	01-Jun-21A																					03-Jun-21A
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B09 to B10 Acero Refuerz o	0																							
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B09 to B10 Perno	0	04-Jun-21A	07-Jun-21A																					
	K170-57302200	C-F3-27300010001D-CTW-Suministro Y Colocacion Perno Durmientes (Bent 09 and Ber	0	04-Jun-21A																					07-Jun-21A
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B09 to B10 Concreto	0	04-Jun-21A	19-Jun-21A																					
	K170-57302210	C-F3-27300010001D-CTW-Colocacion Acero - Durmientes (B09-10) y bases auxiliares	0	04-Jun-21A																					13-Jun-21A
	K170-57302550	C-F3-27300010001D-CTW-Encofrado - Durmientes (B09-10) y bases auxiliares	0	05-Jun-21A																					14-Jun-21A
	K170-57302570	C-F3-27300010001D-CTW-Vaciado - Durmientes (B09-10) y bases auxiliares	0	10-Jun-21A																					19-Jun-21A
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - DRM - B14 to B15	0	20-Jun-21A	15-Oct-21A																					
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B14 to B15 Solado	0	20-Jun-21A	23-Jun-21A																					
	K170-57302610	C-F3-27300010001D-CTW-Vaciado Solado Durmientes (Bent 14 and Bent 15)	0	20-Jun-21A																					23-Jun-21A
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B14 to B15 Acero Refuerz o	0																							
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B14 to B15 Perno	0	12-Aug-21A	21-Aug-21A																					
	K170-57302260	C-F3-27300010001D-CTW-Suministro Y Colocacion Perno Durmientes (Bent 14 and Ber	0	12-Aug-21A																					21-Aug-21A
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - B14 to B15 Concreto	0	21-Aug-21A	15-Oct-21A																					
	K170-57302270	C-F3-27300010001D-CTW-Colocacion Acero Refuerzo Concreto Durmientes (Bent 14 an	0	21-Aug-21A																					11-Sep-21A
	K170-57302700	C-F3-27300010001D-CTW-Encofrado Concreto Durmientes (Bent 14 and Bent 15)	0	12-Sep-21A																					26-Sep-21A
	K170-57302720	C-F3-27300010001D-CTW-Vaciado Concreto Durmientes (Bent 14 and Bent 15)	0	27-Sep-21A																					15-Oct-21A
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - ESC - Soportes ext B20-B25	0	13-Nov-21A	26-Dec-21A																					
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - Soportes ext B20-B25 Solado	0																							
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - Soportes ext B20-B25 Acero Refuerz o	0																							
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - Soportes ext B20-B25 Perno	0	15-Dec-21A	19-Dec-21A																					
	K170-57302290	C-F3-27300010001D-CTW-Suministro Y Colocacion Perno - Soportes Ext B20-B25	0	15-Dec-21A																					19-Dec-21A
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - Soportes ext B20-B215 Concreto	0	13-Nov-21A	26-Dec-21A																					
	K170-57302300	C-F3-27300010001D-CTW-Colocacion Acero Refuerzo - Soportes Ext B20-B25	0	13-Nov-21A																					18-Dec-21A
	K170-57302850	C-F3-27300010001D-CTW-Encofrado- Soportes Ext B20-B25	0	17-Nov-21A																					18-Dec-21A
	K170-57302870	C-F3-27300010001D-CTW-Vaciado - Soportes Ext B20-B25	0	20-Dec-21A																					26-Dec-21A
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - Belt Motor Overland	0	02-Jan-21A	22-Apr-21A																					
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - BMO Solado	0	02-Jan-21A	03-Jan-21A																					
	K170-57302940	C-F3-27300010001D-CTW-Vaciado Solado Belt Motor Overland Foundation Execution	0	02-Jan-21A																					03-Jan-21A
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - BMO Acero Refuerzo	0																							
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - BMO Perno	0	25-Jan-21A	13-Mar-21A																					
	K170-57302920	C-F3-27300010001D-CTW-Suministro y Colocacion Perno Belt Motor Overland Foundati	0	25-Jan-21A																					13-Mar-21A
	C - EF3 - 27300010001D - CTW - BMO Concreto	0	04-Jan-21A	22-Apr-21A																					
	K170-57302930	C-F3-27300010001D-CTW-Colocacion Acero Refuerzo Concreto Belt Motor Overland Fou	0	04-Jan-21A																					20-Mar-21A
	K170-57303030	C-F3-27300010001D-CTW-Encofrado Concreto Belt Motor Overland Foundation Executic	0	16-Jan-21A																					25-Mar-21A
	K170-57303050	C-F3-27300010001D-CTW-Vaciado Concreto Belt Motor Overland Foundation Execution	0	25-Jan-21A																					22-Apr-21A
	C - EF3 - COH - CBS - OCB - 27300010002D - Steel Works	0	09-Jun-20A	12-Jan-22A																					
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - Bents Erection	0	14-Dec-20A	12-Jan-22A																					
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - Tramo 0	0	14-Dec-20A	24-Mar-21A																					
	K170-80561740	C-F3-27300010002D- SSW-Pre-ensamble Estructuras Torre de Anclaje, Bent 24	0	14-Dec-20A																					18-Dec-20A
	K170-57401180	C-F3-27300010002D- SSW- Montaje de Estructuras Torre de Anclaje, Bent 24	0	17-Jan-21A																					24-Mar-21A
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - B03 to B07 Estructura Acero	0																							
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - B03 to B07 Estructura Acero Auxiliar	0																							
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - Tramo 1	0	26-Dec-20A	31-Mar-21A																					
	K170-80561750	C-F3-27300010002D-SSW- Pre-ensamble y montaje de Estructuras Bent - 25	0	26-Dec-20A																					04-Feb-21A
	K170-57401210	C-F3-27300010002D-SSW- Montaje de Estructuras Bent - 25	0	24-Mar-21A																					31-Mar-21A
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - B08 to B09 Estructura Acero	0																							
C - EF3 - 27300010002D - SSW - B08 to B09 Estructura Acero Auxiliar	0																								
C - EF3 - 27300010002D - SSW - Tramo 2	0	21-May-21A	05-Sep-21A																						
K170-57401240	C-F3-27300010002D-SSW-Pre-ensamble de Bents (03, 04, 05, 06, 07)	0	21-May-21A	15-Aug-21A																					
K170-80562110	C-F3-27300010002D-SSW-Montaje de Estructuras Bents (03, 04, 05, 06, 07)	0	05-Jul-21A	05-Sep-21A																					
C - EF3 - 27300010002D - SSW - B10 to B14 Estructura Acero	0																								
C - EF3 - 27300010002D - SSW - B10 to B14 Estructura Acero Auxiliar	0																								
C - EF3 - 27300010002D - SSW - Tramo 3	0	24-Mar-21A	12-Jan-22A																						
K170-80561710	C-F3-27300010002D-SSW- Pre-ensamble de Bents (10,11,12, 13, 14)	0	24-Mar-21A	26-May-21A																					
K170-80562130	C-F3-27300010002D-SSW- Montaje de Estructuras de Bents (10,11,12, 13, 14)	0	31-Mar-21A	06-Jun-21A																					
K170-57401270	C-F3-27300010002D-SSW- Pre-ensamble de Bent 08	0	23-May-21A	27-May-21A																					
K170-80561700	C-F3-27300010002D-SSW- Pre-ensamble de Bent 09	0	26-May-21A	15-Jun-21A																					
K170-80562140	C-F3-27300010002D-SSW- Montaje de Estructuras de Bent 08	0	10-Jun-21A	17-Jun-21A																					
K170-80562120	C-F3-27300010002D-SSW- Montaje de Estructuras de Bent 09	0	27-Dec-21A	12-Jan-22A																					
C - EF3 - 27300010002D - SSW - B15 to B21 Estructura Acero	0																								
C - EF3 - 27300010002D - SSW - B15 to B21 Estructura Acero Auxiliar	0																								

K-CC2-170 "Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina"
Cronograma Actualizado - Data Date 27Ene2023 - Chancador Primario y Faja Transportadora

Activity ID		Activity Name	Remaining Duration	Start	Finish	November 2022				December 2022				January 2023				February 2023				March 2023			
						12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11		
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - Tramo 4		0	01-Apr-21A	15-Jun-21A																				
	K170-57401300	C-F3-27300010002D-SSW- Pre-ensamble de Bents (15,16,17,18,19,20,21,22,23)	0	01-Apr-21A	31-May-21A																				
	K170-80562150	C-F3-27300010002D-SSW- Montaje de Estructuras de Bents (15,16,17,18,19,20,21,22,23	0	16-Apr-21A	15-Jun-21A																				
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - B22 Estructura Acero		0																						
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - B22 Estructura Acero Auxiliar		0																						
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - Tramo 5		0																						
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - Belt Motor Overland		0	21-May-21A	15-Jun-21A																				
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - BMO - Estructura Acero		0	21-May-21A	05-Jun-21A																				
	K170-57401360	C-F3-27300010002D-SSW-Montaje EstructuraAcero Belt Motor Overland	0	21-May-21A	05-Jun-21A																				
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - BMO - Estructura Acero Auxiliar		0	22-May-21A	15-Jun-21A																				
	K170-57401170	C-F3-27300010002D-SSW-Montaje EstructuraAceroAuxiliar Belt Motor Overland	0	22-May-21A	15-Jun-21A																				
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - Stacker + V. Cantilever		0	09-Jun-20A	18-Dec-21A																				
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - Pre armado Torre Stacker		0	09-Jun-20A	09-Jul-21A																				
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - PTS - Estructura Acero		0	09-Jun-20A	09-Jul-21A																				
	K170-57401083	C-F3-27300010002D-SSW-Llegada de suministros de Stacker + Viga Cantilever	0		09-Jun-20A																				
	K170-80561640	C-F3-27300010002D-SSW-Pre-Armado Estructuras B26-EstructuraB25B26	0	18-Jan-21A	01-Mar-21A																				
	K170-57401090	C-F3-27300010002D-SSW-Pre-Armado EstructuraAcero Torre Stacker	0	01-Mar-21A	09-Jul-21A																				
	K170-57401085	C-F3-27300010002D-SSW-Traslado de Prefabricados	0	01-Jun-21A	06-Jun-21A																				
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - PTS - Estructura Acero Auxiliar		0																						
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - Montaje Torre Stacker		0	23-Jan-21A	18-Dec-21A																				
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - MTS - Estructura Acero		0	23-Jan-21A	18-Dec-21A																				
	K170-80561630	C-F3-27300010002D-SSW-Montaje Estructura B26	0	23-Jan-21A	30-Jan-21A																				
	K170-57401430	C-F3-27300010002D-SSW-Montaje Estructura Torre Stacker	0	10-Jul-21A	18-Dec-21A																				
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - MTS - Estructura Acero Auxiliar		0	13-Nov-21A	18-Dec-21A																				
	K170-57401390	C-F3-27300010002D-SSW-Montaje EstructuraAceroAuxiliar Torre Stacker	0	13-Nov-21A	18-Dec-21A																				
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - Punch List Torre Stacker		0																						
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - LTS - Estructura Acero		0																						
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - LTS - Estructura Acero Auxiliar		0																						
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - Pre armado Viga Cantilever		0	24-Apr-21A	19-Jul-21A																				
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - PVC - Estructura Acero		0	24-Apr-21A	19-Jul-21A																				
	K170-57401100	C-F3-27300010002D-SSW-Pre-Armado EstructuraAcero Viga Cantilever	0	24-Apr-21A	19-Jul-21A																				
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - PVC - Estructura Acero Auxiliar		0																						
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - Montaje Viga Cantilever		0	25-Jun-21A	26-Nov-21A																				
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - MVC - Estructura Acero		0	25-Jun-21A	26-Nov-21A																				
	K170-57401520	C-F3-27300010002D-SSW-Montaje EstructuraAcero Viga Cantilever	0	25-Jun-21A	26-Nov-21A																				
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - MVC - Estructura Acero Auxiliar		0																						
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - Punch List Viga Cantilever		0																						
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - LVC - Estructura Acero		0																						
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - LVC - Estructura Acero Auxiliar		0																						
	C - EF3 - COH - CBS - OCB - 27300010003D - Architectural Works		0																						
	C - EF3 - COH - CBS - OCB - 27300010004D - Mechanical Works		0	09-Jan-21A	14-Aug-22A																				
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - Equipments Assembly		0	09-Jan-21A	14-Aug-22A																				
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - Mesas de Carga		0	01-Jun-21A	05-Nov-21A																				
	K170-57501110	C-F1-27300010004D-MEW-B07 - B08 Montaje Mesas Carga B07 - B08	0	01-Jun-21A	05-Nov-21A																				
	K170-57501150	C-F1-27300010004D-MEW-B09 - B10 Montaje - Mesas Carga B09 - B10	0	06-Oct-21A	05-Nov-21A																				
	K170-57501190	C-F1-27300010004D-MEW-B14 - B15 Montaje - Mesas Carga B14 - B15	0	07-Oct-21A	05-Nov-21A																				
	K170-57501260	C-F1-27300010004D-MEW-EXT - B03 Montaje - Mesas Carga Ext- B03	0	07-Oct-21A	05-Nov-21A																				
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - MSC - B07 to B08		0																						
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - MSC - B09 to B10		0																						
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - MSC - B14 to B15		0																						
C - EF3 - 27300010004D - MEW - MSC - EXT to B03		0																							
C - EF3 - 27300010004D - MEW - MSC - T03 to T08		0																							
C - EF3 - 27300010004D - MEW - MSC - T09 to T11		0																							
C - EF3 - 27300010004D - MEW - MSC - T12 to T17		0																							
C - EF3 - 27300010004D - MEW - MSC - T19 to T28		0																							
C - EF3 - 27300010004D - MEW - MSC - T29 to T31		0																							
C - EF3 - 27300010004D - MEW - MSC - T32		0																							
C - EF3 - 27300010004D - MEW - MSC - T33		0																							
C - EF3 - 27300010004D - MEW - MSC - T34		0																							
C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - Galerías		0	09-Jan-21A	13-Dec-21A																					
C - EF3 - 27300010002D - SSW - Tramo 0		0	09-Jan-21A	19-Aug-21A																					
K170-80561920	C-F1-27300010004D-MEW- Montaje de Truss T-29	0	09-Jan-21A	19-Aug-21A																					
C - EF3 - 27300010002D - SSW - B03 to B07 Estructura Acero		0																							
C - EF3 - 27300010002D - SSW - B03 to B07 Estructura Acero Auxiliar		0																							
C - EF3 - 27300010002D - SSW - Tramo 1		0	09-Jan-21A	01-Feb-21A																					

			K-CC2-170 "Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina"																					
			Cronograma Actualizado - Data Date 27Ene2023 - Chancador Primario y Faja Transportadora																					
Activity ID		Activity Name		Remaining Duration	Start	Finish	November 2022			December 2022				January 2023				February 2023				March 2023		
							12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11
	K170-80561930	C-F1-27300010004D-MEW- Montaje de Truss T-30		0	09-Jan-21A	01-Feb-21A																		
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - B08 to B09 Estructura Acero		0																					
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - B08 to B09 Estructura Acero Auxiliar		0																					
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - Tramo 2		0	11-May-21 A	22-Oct-21A																			
	K170-80562180	C-F1-27300010004D-MEW- Montaje de Truss (T-3,T-4,T-5,T-6,T-7,T-8)		0	11-May-21A	22-Oct-21A																		
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - B10 to B14 Estructura Acero		0																					
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - B10 to B14 Estructura Acero Auxiliar		0																					
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - Tramo 3		0	30-Mar-21A	13-Dec-21A																			
	K170-80562240	C-F1-27300010004D-MEW- Montaje de Truss (T-12,T-13,T-14,T-15,T-16,T-17)		0	30-Mar-21A	31-May-21A																		
	K170-80562200	C-F1-27300010004D-MEW- Montaje de Truss T-9		0	12-Jun-21A	23-Jun-21A																		
	K170-80562230	C-F1-27300010004D-MEW- Montaje de Truss T-10,T-11		0	18-Aug-21A	22-Oct-21A																		
	K170-80562460	C-F1-27300010004D-MEW-Alineamiento y Liberación Final de Galerías		0	23-Nov-21A	13-Dec-21A																		
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - B15 to B21 Estructura Acero		0																					
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - B15 to B21 Estructura Acero Auxiliar		0																					
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - Tramo 4		0	14-Apr-21A	02-Jun-21A																			
	K170-80561960	C-F1-27300010004D-MEW- Montaje Truss (T-19,T-20,T-21,T-22,T-23,T-24,T-25,T-26,T-27)		0	14-Apr-21A	02-Jun-21A																		
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - B22 Estructura Acero		0																					
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - B22 Estructura Acero Auxiliar		0																					
	C - EF3 - 27300010002D - SSW - Tramo 5		0	09-Jan-21A	13-Jun-21A																			
	K170-80561910	C-F1-27300010004D-MEW- Montaje de Truss (T-31)		0	09-Jan-21A	07-Feb-21A																		
	K170-80561970	C-F1-27300010004D-MEW- Montaje de Truss (T-32)		0	11-May-21A	13-Jun-21A																		
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - GLR - T03 to T08		0																					
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - GLR - T09 to T11		0																					
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - GLR - T12 to T18		0																					
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - GLR - T19 to T28		0																					
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - GLR - T29 to T31		0																					
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - GLR - T32		0																					
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - Elementos de Trusses Desvestidos		0	01-Mar-21A	15-Dec-21A																			
	K170-80562720	C-F1-27300010004D-MEW- Elementos de Truss 31		0	01-Mar-21A	29-Mar-21A																		
	K170-80562710	C-F1-27300010004D-MEW- Elementos de Truss 12		0	01-Jun-21A	05-Dec-21A																		
	K170-80562770	C-F1-27300010004D-MEW- Elementos de Truss 10		0	12-Nov-21A	15-Dec-21A																		
	K170-80562740	C-F1-27300010004D-MEW- Elementos de Truss 11		0	13-Nov-21A	07-Dec-21A																		
	K170-80562760	C-F1-27300010004D-MEW- Elementos de Truss 7		0	13-Nov-21A	09-Dec-21A																		
	K170-80562780	C-F1-27300010004D-MEW- Elementos de Truss 16		0	21-Nov-21A	12-Dec-21A																		
	K170-80562700	C-F1-27300010004D-MEW- Elementos de Bent 25-26		0	22-Nov-21A	12-Dec-21A																		
	K170-80562730	C-F1-27300010004D-MEW- Elementos de Truss 8		0	22-Nov-21A	12-Dec-21A																		
	K170-80562750	C-F1-27300010004D-MEW- Elementos de Truss 9		0	22-Nov-21A	12-Dec-21A																		
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - Sistema Motriz Faja Transportadora		0	17-Aug-21A	14-Aug-22A																			
	K170-70546230	C-F1-27300010004D-MEW-Montaje - Counterweight Assembly (2730001CW19)		0	17-Aug-21A	30-Apr-22A																		
	K170-70531050	C-F1-27300010004D-MEW- Motor Electrico Gearless 2 (2730-CV-002-MO1)		0	18-Aug-21A	30-Apr-22A																		
	K170-70531040	C-F1-27300010004D-MEW - Motor Electrico Gearless 1 (2730-CV-002)		0	18-Aug-21A	30-Apr-22A																		
	K170-70546280	C-F1-27300010004D-MEW-Montaje - Take Up Assembly (2730001CT19)		0	18-Aug-21A	30-Mar-22A																		
	K170-70546330	C-F1-27300010004D-MEW-Montaje - Unidad De Enfriamiento 2 (2730-CV-002-XM4CQ1		0	05-Jan-22A	06-May-22A																		
	K170-70546380	C-F1-27300010004D-MEW-Montaje - Winche Mantenimiento Faja (2730-CV-002-SC1)		0	08-Jan-22A	09-May-22A																		
	K170-70546430	C-F1-27300010004D-MEW-Montaje - Sistema De Enfriamiento (2730-CV-002-XM3MO1		0	11-Jan-22A	12-May-22A																		
	K170-70546480	C-F1-27300010004D-MEW-Montaje - Unidad De Enfriamiento 1 (2730-CV-002-XM4MO1		0	11-Jan-22A	15-May-22A																		
	K170-70546530	C-F1-27300010004D-MEW-Montaje Elementos Estructurales Freno Polea Motriz 2 (2730		0	15-Jan-22A	18-May-22A																		
	K170-70546580	C-F1-27300010004D-MEW-Montaje - Freno Polea Motriz 1 (2730-CV-002-WI2)		0	15-Jan-22A	18-May-22A																		
	K170-70546680	C-F1-27300010004D-MEW-Montaje - Motor Bomba Polea Motriz 2 (2730-CV-002-XM2)		0	15-Jan-22A	08-Aug-22A																		
	K170-70547280	C-F1-27300010004D-MEW-Montaje - Motor Bomba Polea Motriz 1 (2730-CV-002-XM1)		0	15-Jan-22A	14-Aug-22A																		
	K170-70546730	C-F1-27300010004D-MEW-Montaje - Bomba 2 Enfriamiento Motores (2730-CV-002-XM		0	18-Jan-22A	24-May-22A																		
	K170-70546780	C-F1-27300010004D-MEW-Montaje - Bomba 1 Enfriamiento Motores (2730-CV-002-XM		0	18-Jan-22A	24-May-22A																		
K170-70546630	C-F1-27300010004D-MEW-Montaje - Freno Cabestrante (2730-CV-002-XM2MO1)		0	02-Apr-22A	24-May-22A																			
K170-70546830	C-F1-27300010004D-MEW-Montaje - Motor Bomba Freno Cabestrante (2730-CV-002-XM		0	10-Apr-22A	24-May-22A																			
C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - SMT - Motor Eléctrico Gearless 2		0																						
C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - SMT - Motor Eléctrico Gearless 1		0																						
C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - SMT - Counterweight Assembly		0																						
C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - SMT - Take Up Assembly		0																						
C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - SMT - Unidad de Enfriamiento 2		0																						
C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - SMT - Winche Mantenimiento Faja		0																						
C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - SMT - Sistema de Enfriamiento		0																						
C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - SMT - Unidad de Enfriamiento 1		0																						
C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - SMT - Freno Polea Motriz 2		0																						
C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - SMT - Freno Polea Motriz 1		0																						
C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - SMT - Freno Cabestrante		0																						


K170 Primary Crusher Conveyor Belt EXECUTION SCHEDULE	Page 28 of 32	Date	Revision	Checked	Approved	Actual Work Remaining Work Critical Milestone Summary
		29-Apr-22	REVISIÓN 0	MM	IM	

K-CC2-170 "Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina"
Cronograma Actualizado - Data Date 27Ene2023 - Chancador Primario y Faja Transportadora

Activity ID	Activity Name	Remaining Duration	Start	Finish	November 2022				December 2022				January 2023				February 2023				March 2023			
					12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11		
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - SMT - M otor Bomba Polea Motriz 2	0																						
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - SMT - M otor Bomba Polea Motriz 1	0																						
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - SMT - Bomba 2 Enfriamiento Motores	0																						
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - SMT - Bomba 1 Enfriamiento Motores	0																						
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - SMT - M otor Freno Cabestrantes	0																						
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - Stacker + V. Cantilever	0	24-Jul-21A	25-Jul-22A																				
	K170-70546940	C-F1-27300010004D-MEW-Montaje - Galerías Viga Cantilever T33 (T-33 [Q])	0	24-Jul-21A	15-Oct-21A																			
	K170-70547110	C-F1-27300010004D-MEW-Montaje - Polea De Cabeza (2730001CH19)	0	11-Sep-21A	11-Nov-21A																			
	K170-70546990	C-F1-27300010004D-MEW-Montaje - Galerías Viga Cantilever T34 (T-34 [W])	0	01-Oct-21A	15-Oct-21A																			
	K170-70547190	C-F1-27300010004D-MEW-Montaje - Chute Descarga (2730-CV-002-CH1)	0	01-Oct-21A	14-Nov-21A																			
	K170-70547030	C-F1-27300010004D-MEW-Montaje Polipasto Polea Cabeza (2730-HT-007)	0	15-Jan-22A	19-Feb-22A																			
	K170-70547060	C-F1-27300010004D-MEW-Montaje - Winche Mantenimiento Polea Cabeza (2730-CV-0	0	18-Jan-22A	05-May-22A																			
	K170-70547220	C-F1-27300010004D-MEW-Montaje - Idler Guarding (2730-CV-002-XM5)	0	05-May-22A	25-Jul-22A																			
	K170-70547160	C-F1-27300010004D-MEW-Montaje - Supresor De Polvo (2730-PU-002)	0	06-May-22A	19-May-22A																			
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - SVC - Galerías Viga Cantilever T32	0																						
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - SVC - Galerías Viga Cantilever T33	0																						
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - SVC - Galerías Viga Cantilever T34	0																						
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - SVC - Polea Cabeza	0																						
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - SVC - Polipasto Polea Cabeza	0																						
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - SVC - Winche Mantenimiento Polea Cabeza	0																						
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - SVC - Supresor de Polvo	0																						
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - SVC - Chute Descarga	0																						
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - EA - SVC - Idler Guarding	0																						
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - Conveyor Belt Splice	0	19-Dec-21A	24-Feb-22A																				
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - CBS - Faja Transportadora Conveyor Go - Conveyor Splicing	0	19-Dec-21A	24-Feb-22A																				
	K170-70530950	C-F3-27300010004D-MEW-Conveyor Belt Lying and Splicing Go (2730-CV-002)	0	19-Dec-21A	24-Feb-22A																			
	C - EF3 - 27300010004D - MEW - CBS - Faja Transportadora Conveyor Return - Conveyor Splicing	0	26-Jan-22A	24-Feb-22A																				
	K170-70534250	C-F3-27300010004D-MEW-Conveyor Belt Lying and Splicing Return (2730-CV-002)	0	26-Jan-22A	24-Feb-22A																			
	C - EF3 - COH - SER - ER - 27200010006 - Electrical Works	0	01-Jun-21A	04-Oct-22A																				
	K170-80560820	C-F3-27300010005D-ELW-Electrical Works	0	01-Jun-21A	01-Sep-22A																			
	K170-80560940	C-F3-27300010005D-ELW-Electrical Works- Tendido de Cable de poste hacia pozo	0	02-Sep-22A	04-Oct-22A																			
	C - EF3 - COH - CBS - OCB - 27300010005D - Piping Works	0	15-Jan-22A	15-Aug-22A																				
	K170-70557900	C-F3-27300010005D-PPW-Piping Works F03	0	15-Jan-22A	19-May-22A																			
	K170-80562790	Pump and pipe installation, on Stacker area (fire fighting system going from the Tie in)	0	25-Jan-22A	15-Aug-22A																			
	C - EF3 - 27300010005D - PPW - Soportes Tuberías	0																						
	C - EF3 - COH - CBS - OCB - 27300010007D - I&C Works	0	15-Jan-22A	03-Nov-22A																				
	K170-70547430	C-F3-27300010007D-ICW-Traslado a obra y calibración	0	15-Jan-22A	03-Nov-22A																			
	K170-70547470	C-F3-27300010007D-ICW-Colocación de Soportes de instrumentos	0	22-Jan-22A	16-Oct-22A																			
	K170-70547510	C-F3-27300010007D-ICW-Instalación de Instrumentos	0	05-Feb-22A	17-Oct-22A																			
	K170-70547550	C-F3-27300010007D-ICW-Canalización y Cableado	0	29-Apr-22A	16-Oct-22A																			
	K170-70547950	C-F3-27300010007D-ICW-Prueba y liberación	0	29-Apr-22A	17-Oct-22A																			
	C - EF3 - 27300010007D - ICW - Gabinete CCTV	0																						
	C - EF3 - 27300010007D - ICW - Panel	0																						
	C - EF3 - 27300010007D - ICW - Placa de Montaje	0																						
	C - EF3 - 27300010007D - ICW - Rack Remoto	0																						
	C - EF3 - 27300010007D - ICW - Baliza	0																						
	C - EF3 - 27300010007D - ICW - Caja de Conexión	0																						
	C - EF3 - 27300010007D - ICW - Cámara CCTV	0																						
	C - EF3 - 27300010007D - ICW - Detección de Ruptura	0																						
	C - EF3 - 27300010007D - ICW - Indicador	0																						
C - EF3 - 27300010007D - ICW - Interruptor	0																							
C - EF3 - 27300010007D - ICW - Sensor	0																							
C - EF3 - 27300010007D - ICW - Sirena	0																							
C - EF3 - 27300010007D - ICW - Transmisor	0																							
C - EF3 - 27300010007D - ICW - Pesómetro	0																							
C - EF3 - 2800 MINE ANCILIARY FACILITIES	22	13-Oct-20A	17-Feb-23																			17-Feb-23		
C - EF3 - MAF - 2840 - Fuel Tanks And Stations	22	13-Oct-20A	17-Feb-23																			17-Feb-23		
K171-80560150	C-F2-28100010000-CVW-Montaje de tanque por otro contratista 2840-TK-001/002	0	16-Dec-20A	21-Sep-21A																				
C - EF3 - MAF - FTA - 2840002 - Light Duty Vehicles Fuel Station	0	01-Aug-22A	22-Aug-22A																					
C - EF3 - MAF - FTA - LDV - 28400020002 - Steel Works	0	01-Aug-22A	22-Aug-22A																					
C - EF3 - 28400020002 - SSW - Estructura Acero	0	08-Aug-22A	22-Aug-22A																					
K170-70545190	C-F2-28400020002-SSW-Montaje Estructura Acero	0	08-Aug-22A	22-Aug-22A																				

K-CC2-170 "Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina"

Cronograma Actualizado - Data Date 27Ene2023 - Chancador Primario y Faja Transportadora

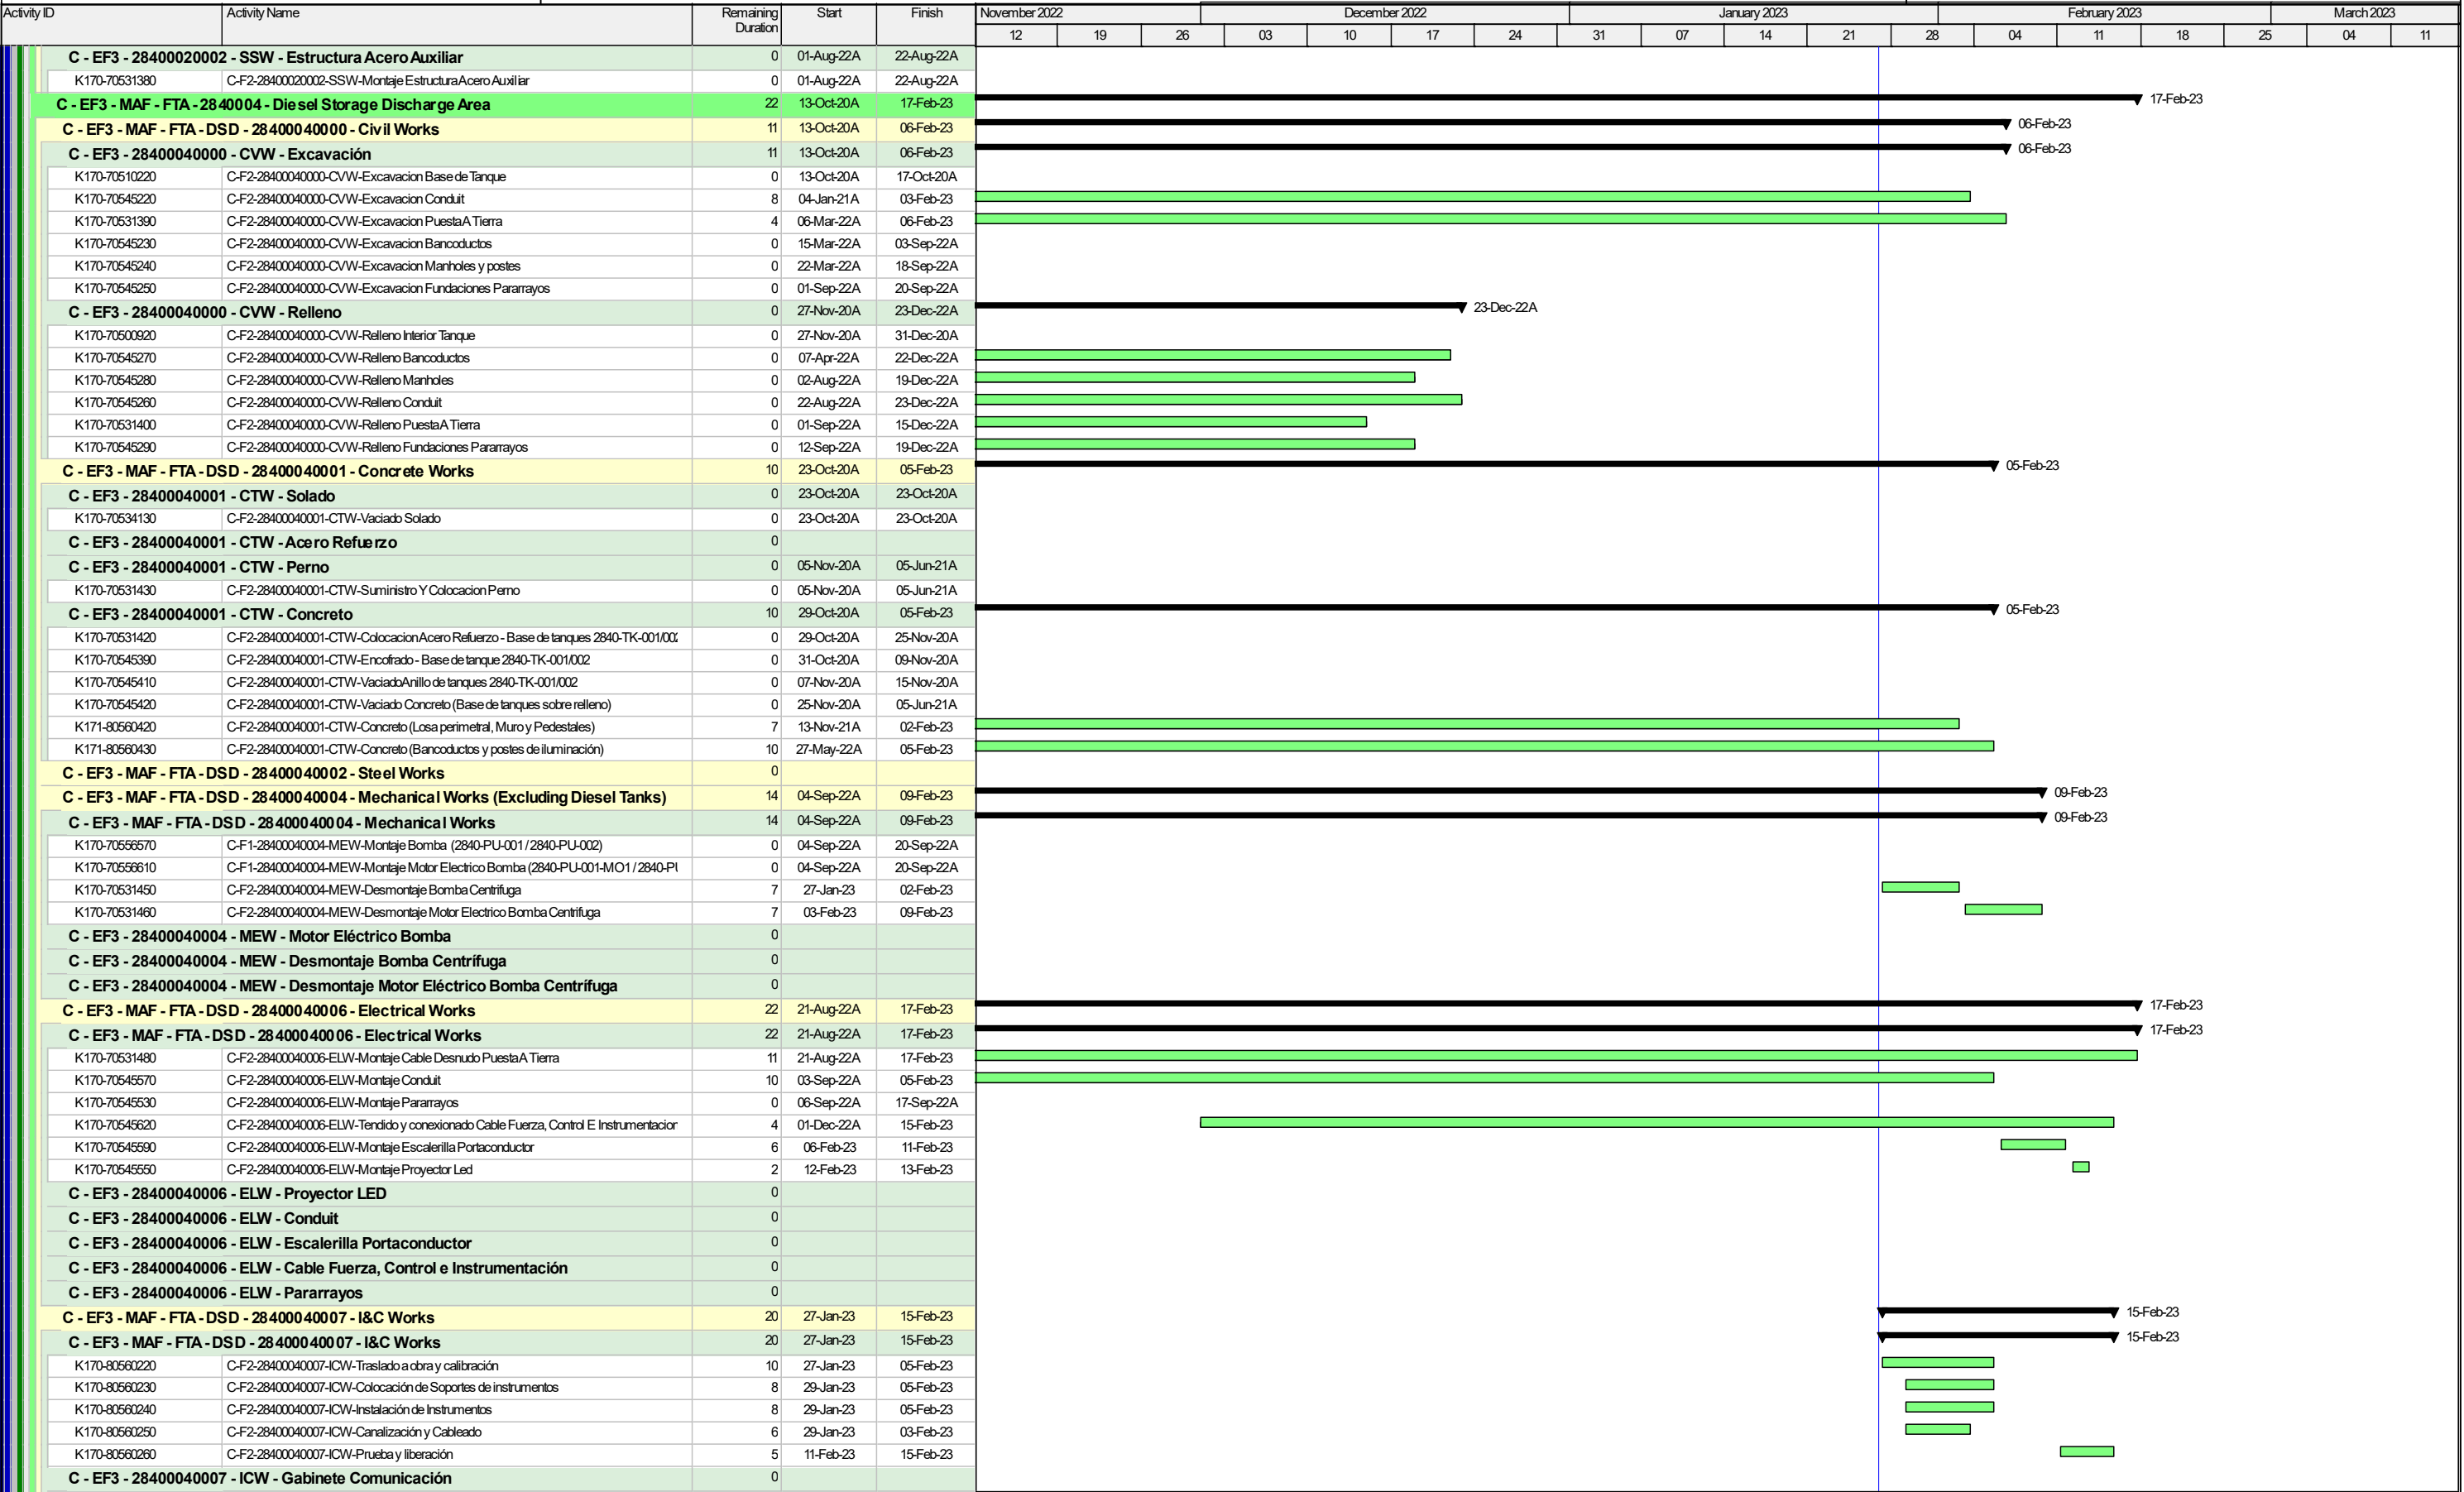

		K-CC2-170 "Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina"																						
		Cronograma Actualizado - Data Date 27Ene2023 - Chancador Primario y Faja Transportadora																						
Activity ID		Activity Name	Remaining Duration	Start	Finish	November 2022			December 2022				January 2023				February 2023				March 2023			
						12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11	
	C - EF3 - 28400040007 - ICW - Baliza		0																					
	C - EF3 - 28400040007 - ICW - Soporte Instalación Cámara CCTV		0																					
	C - EF3 - 28400040007 - ICW - Cámara CCTV		0																					
	C - EF3 - 28400040007 - ICW - Indicador		0																					
	C - EF3 - 28400040007 - ICW - Interruptor		0																					
	C - EF3 - 28400040007 - ICW - Sirena		0																					
	C - EF3 - 28400040007 - ICW - Transmisor		0																					
	C - EF3 - MAF - FTA - 2840007 - Piping A/G Diesel Storage (Charge & Discharge)		16	05-Feb-22A	11-Feb-23																			
	K170-80560270	C-F3-28400070005-PPW-Traslado a obra		0	05-Feb-22A	29-Aug-22A																		
	K170-80560280	C-F3-28400070005-PPW-Soldadura de tuberías y spools		0	08-Feb-22A	15-Sep-22A																		
	K170-80560290	C-F3-28400070005-PPW-Instalación de tuberías		0	12-Feb-22A	17-Sep-22A																		
	K170-80560300	C-F3-28400070005-PPW-Colocación de soportes y alineación		14	02-Aug-22A	09-Feb-23																		
	K170-80560310	C-F3-28400070005-PPW-Pruebas y aceptación		8	01-Sep-22A	11-Feb-23																		
	C - EF3 - MAF - FTA - PAG - 28400070005 - Piping Works		0																					
	C - EF3 - 28400070005 - PPW - Fabricación Spools		0																					
	C - EF3 - 28400070005 - PPW - Fabricación Uniones Spools		0																					
	C - EF3 - 28400070005 - PPW - Instalación Tuberías		0																					
	C - EF3 - 28400070005 - PPW - Instalación Spools		0																					
	C - EF3 - 28400070005 - PPW - Instalación Uniones Tuberías		0																					
	C - EF3 - 28400070005 - PPW - Instalación Miscelaneos Tuberías		0																					
	C - EF3 - 28400070005 - PPW - Modificación Spools		0																					
	C - EF3 - 28400070005 - PPW - Pruebas Tuberías		0																					
	C - EF3 - 28400070005 - PPW - Pruebas Spools		0																					
	C - EXECUTION FRONT 4		0	07-Dec-19A	19-Dec-21A																			
	C - EF4 - MODULARIZATION AREA HABILITATION		0	07-Dec-19A	15-Mar-20A																			
	C - EF4 - MAH - Platform Enablement		0																					
	C - EF4 - MAH - Warehouse Installation		0	07-Dec-19A	15-Mar-20A																			
	K170-A-4010	C - EF4 - MAH - WHI - Postergación por demora en llegada de suministros		0	07-Dec-19A	15-Mar-20A																		
	C - EF4 - MAH - Office Installation		0																					
	C - EF4 - MAH - Workshops Installation		0																					
	C - EF4 - 2600 PRIMARY CRUSHER BUILDING		0	12-Aug-21A	17-Oct-21A																			
	C - EF4 - PCB - 2610 - Primary Crusher Building		0	12-Aug-21A	17-Oct-21A																			
C - EF4 - PCB - PCB - 2610004 - Primary Crusher		0	12-Aug-21A	17-Oct-21A																				
C - EF4 - PCB - PCB - PC - 26100040083 - Modularizacion		0	12-Aug-21A	17-Oct-21A																				
K170-70531640	C - 26100040083 - Modularizacion - PREENSAMBLE BLDG-STAIRS BOXA XISB		0	12-Aug-21A	17-Oct-21A																			
C - EF4 - PCB - PCB - 2610014 - Control Room, UPS & Communication Rooms		0																						
C - EF4 - PCB - PCB - CRA - 26100090083 - Modularizacion		0																						
C - EF4 - PCB - PCB - CRA - 26100140083 - Modularizacion		0																						
C - EF4 - 2700 COARSE ORE HANDLING TO STOCKPILE		0	16-Nov-20A	19-Dec-21A																				
C - EF4 - COH - 2730 - Conveyor Belt from Primary Crusher Ore to Stockpile		0	16-Nov-20A	19-Dec-21A																				
C - EF4 - COH - CBP - 2730001 - Overland Conveyor Belt to Coarse Ore Stockpile		0	16-Nov-20A	18-Dec-21A																				
C - EF4 - COH - COH - OCB - 27300010083 - Modularizacion		0	16-Nov-20A	18-Dec-21A																				
C - EF4 - COH - COH - OCB - 27300010083 - Modularizacion Tramo A		0	16-Nov-20A	14-Jul-21A																				
K170-70534145	C - 27300010083A - Modularizacion - Platform Enabling / Warehouse & Wokshop Installat		0	16-Nov-20A	10-Dec-20A																			
K170-70534150	C - 27300010083A - Modularizacion - PREENSAMBLE IMPACT TABLE		0	01-May-21A	10-Jun-21A																			
K170-70534160	C - 27300010083A - Modularizacion - PREENSAMBLE LOAD TABLE		0	11-May-21A	14-Jul-21A																			
C - EF4 - COH - COH - OCB - 27300010083 - Modularizacion Tramo B		0	12-Apr-21A	18-Sep-21A																				
K170-70534310	C - 27300010083B - Modularizacion - PREENSAMBLE LOAD TABLE		0	12-Apr-21A	18-Sep-21A																			
C - EF4 - COH - COH - OCB - 27300010083 - Modularizacion Tramo C		0	24-May-21A	18-Sep-21A																				
K170-70534340	C - 27300010083C - Modularizacion - PREENSAMBLE LOAD TABLE		0	24-May-21A	18-Sep-21A																			
C - EF4 - COH - COH - OCB - 27300010083 - Modularizacion Tramo D		0	03-Dec-20A	18-Dec-21A																				
K170-70534375	C - 27300010083D - Modularizacion - PREENSAMBLE TORREANCLAJE		0	03-Dec-20A	29-Jan-21A																			
K170-80561690	C - 27300010083D - Modularizacion - PREENSAMBLE (BENT24 - TRUSS30)		0	29-Jan-21A	31-Mar-21A																			
K170-70534370	C - 27300010083D - Modularizacion - PREENSAMBLE LOAD TABLE		0	08-Feb-21A	18-Dec-21A																			
K170-70534380	C - 27300010083D - Modularizacion - PREENSAMBLE GALERIES (BENT 26 TO TRU		0	12-Mar-21A	22-Apr-21A																			
K170-70534390	C - 27300010083D - Modularizacion - PREENSAMBLE GALERIES (TRUSS 3 TO TRU		0	26-Mar-21A	19-Sep-21A																			
C - EF4 - COH - CBP - 2730002 - Sacrificial Conveyor To Transfer Tower		0	17-Apr-21A	19-Dec-21A																				
C - EF4 - COH - COH - SCT - 27300020083 - Modularizacion		0	17-Apr-21A	19-Dec-21A																				
K170-70531680	C - 27300020083 - Modularizacion - PREENSAMBLE GALERIES (T1 - T2)		0	17-Apr-21A	19-Dec-21A																			
K170-70534170	C - 27300020083 - Modularizacion - PREENSAMBLE IMPACT TABLE		0	04-May-21A	12-Aug-21A																			
K170 Primary Crusher Conveyor Belt EXECUTION SCHEDULE		Page 31 of 32	Date		Revision		Checked		Approved		Actual Work Remaining Work Critical Milestone Summary													
			29-Apr-22		REVISIÓN 0		MM		IM															

		K-CC2-170 "Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina"																						
		Cronograma Actualizado - Data Date 27Ene2023 - Chancador Primario y Faja Transportadora																						
Activity ID		Activity Name		Remaining Duration	Start	Finish	November 2022			December 2022				January 2023				February 2023				March 2023		
							12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11
	K170-70534180	C - 27300020083 - Modularizacion - PREENSAMBLE LOAD TABLE		0	09-May-21A	12-Aug-21A																		
C - EF4 - 2900 MINE SERVICES				0																				
C - EF4 - MS - 2930 - Plant Water Treatment Plant				0																				
C - EF4 - MS - PWT - 2930001 - Reverse Osmosis And Potable Water Treatment Plant				0																				
C - EF4 - MS - PWT - ROA - 29300010083 - Modulariza cion				0																				
C - EF4 - MS - 2940 - Plant Mine Sewage Treatment Plant				0																				
C - EF4 - MS - PMS - 2940001 - Mine Sewage Treatment Plant				0																				
C - EF4 - MS - PWT - MST - 29400010083 - Modularizacion				0																				
K170 - FACILITIES				0	29-Nov-21A	13-Dec-21A																		
C - EF1 - PC - PCB - PCB - 26100040007 - ICW - Laboratorio de Pruebas				0	29-Nov-21A	13-Dec-21A																		
	K170-70527810	C-F1-26100040007-ICW- Laboratorio De Pruebas		0	29-Nov-21A	13-Dec-21A																		
K170 - COMMISSIONING				25	27-Jan-23	20-Feb-23																		
K170 - PRECOMMISSIONING				25	27-Jan-23	20-Feb-23																		
	K170-80561030	Start Precomissioning Crusher 2610-CR-001		0		27-Jan-23																		
	K170-80561040	Start Precomissioning Crusher 2610-CR-002		0		20-Feb-23																		

