


CRONOGRAMA DE OBRA


Cronograma General


 Actual Level of Effort
 Remaining Work
 Milestone
 Actual Work
  Critical Remaining Work
  summary

 Actual Level of Effort
  Remaining Work
  Milestone


 Actual Work
 Critical Remaining Work
 summary

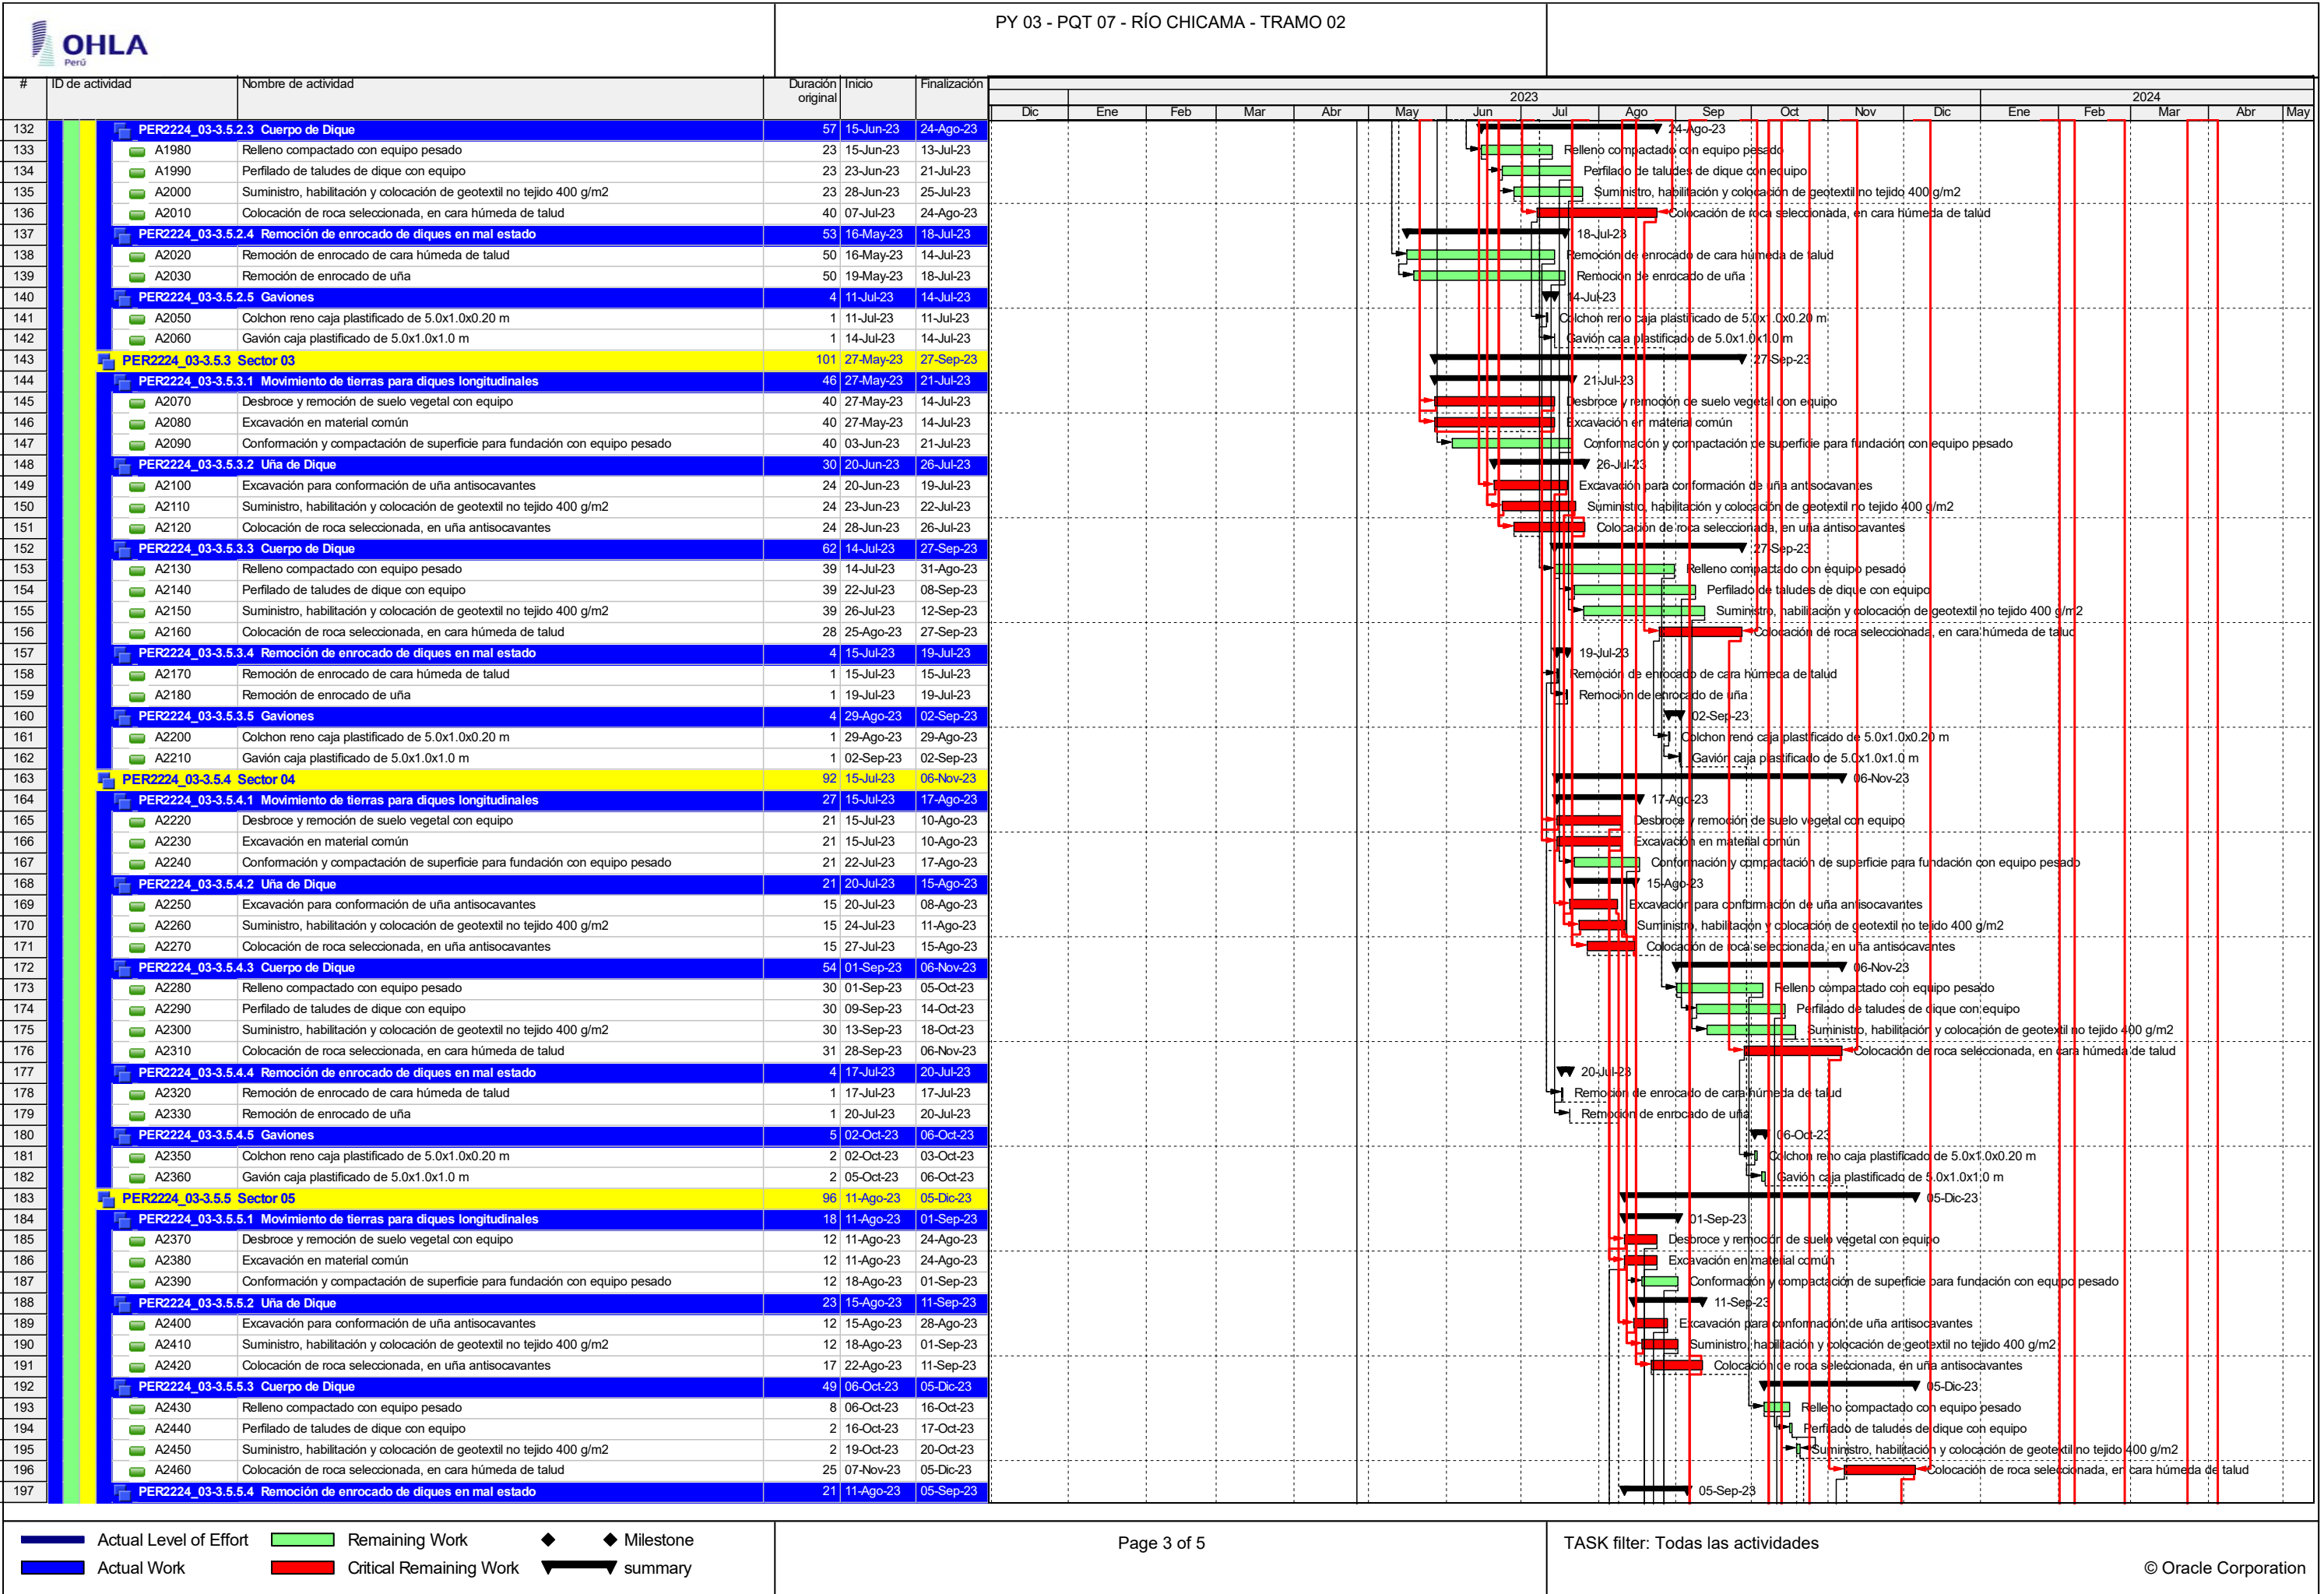

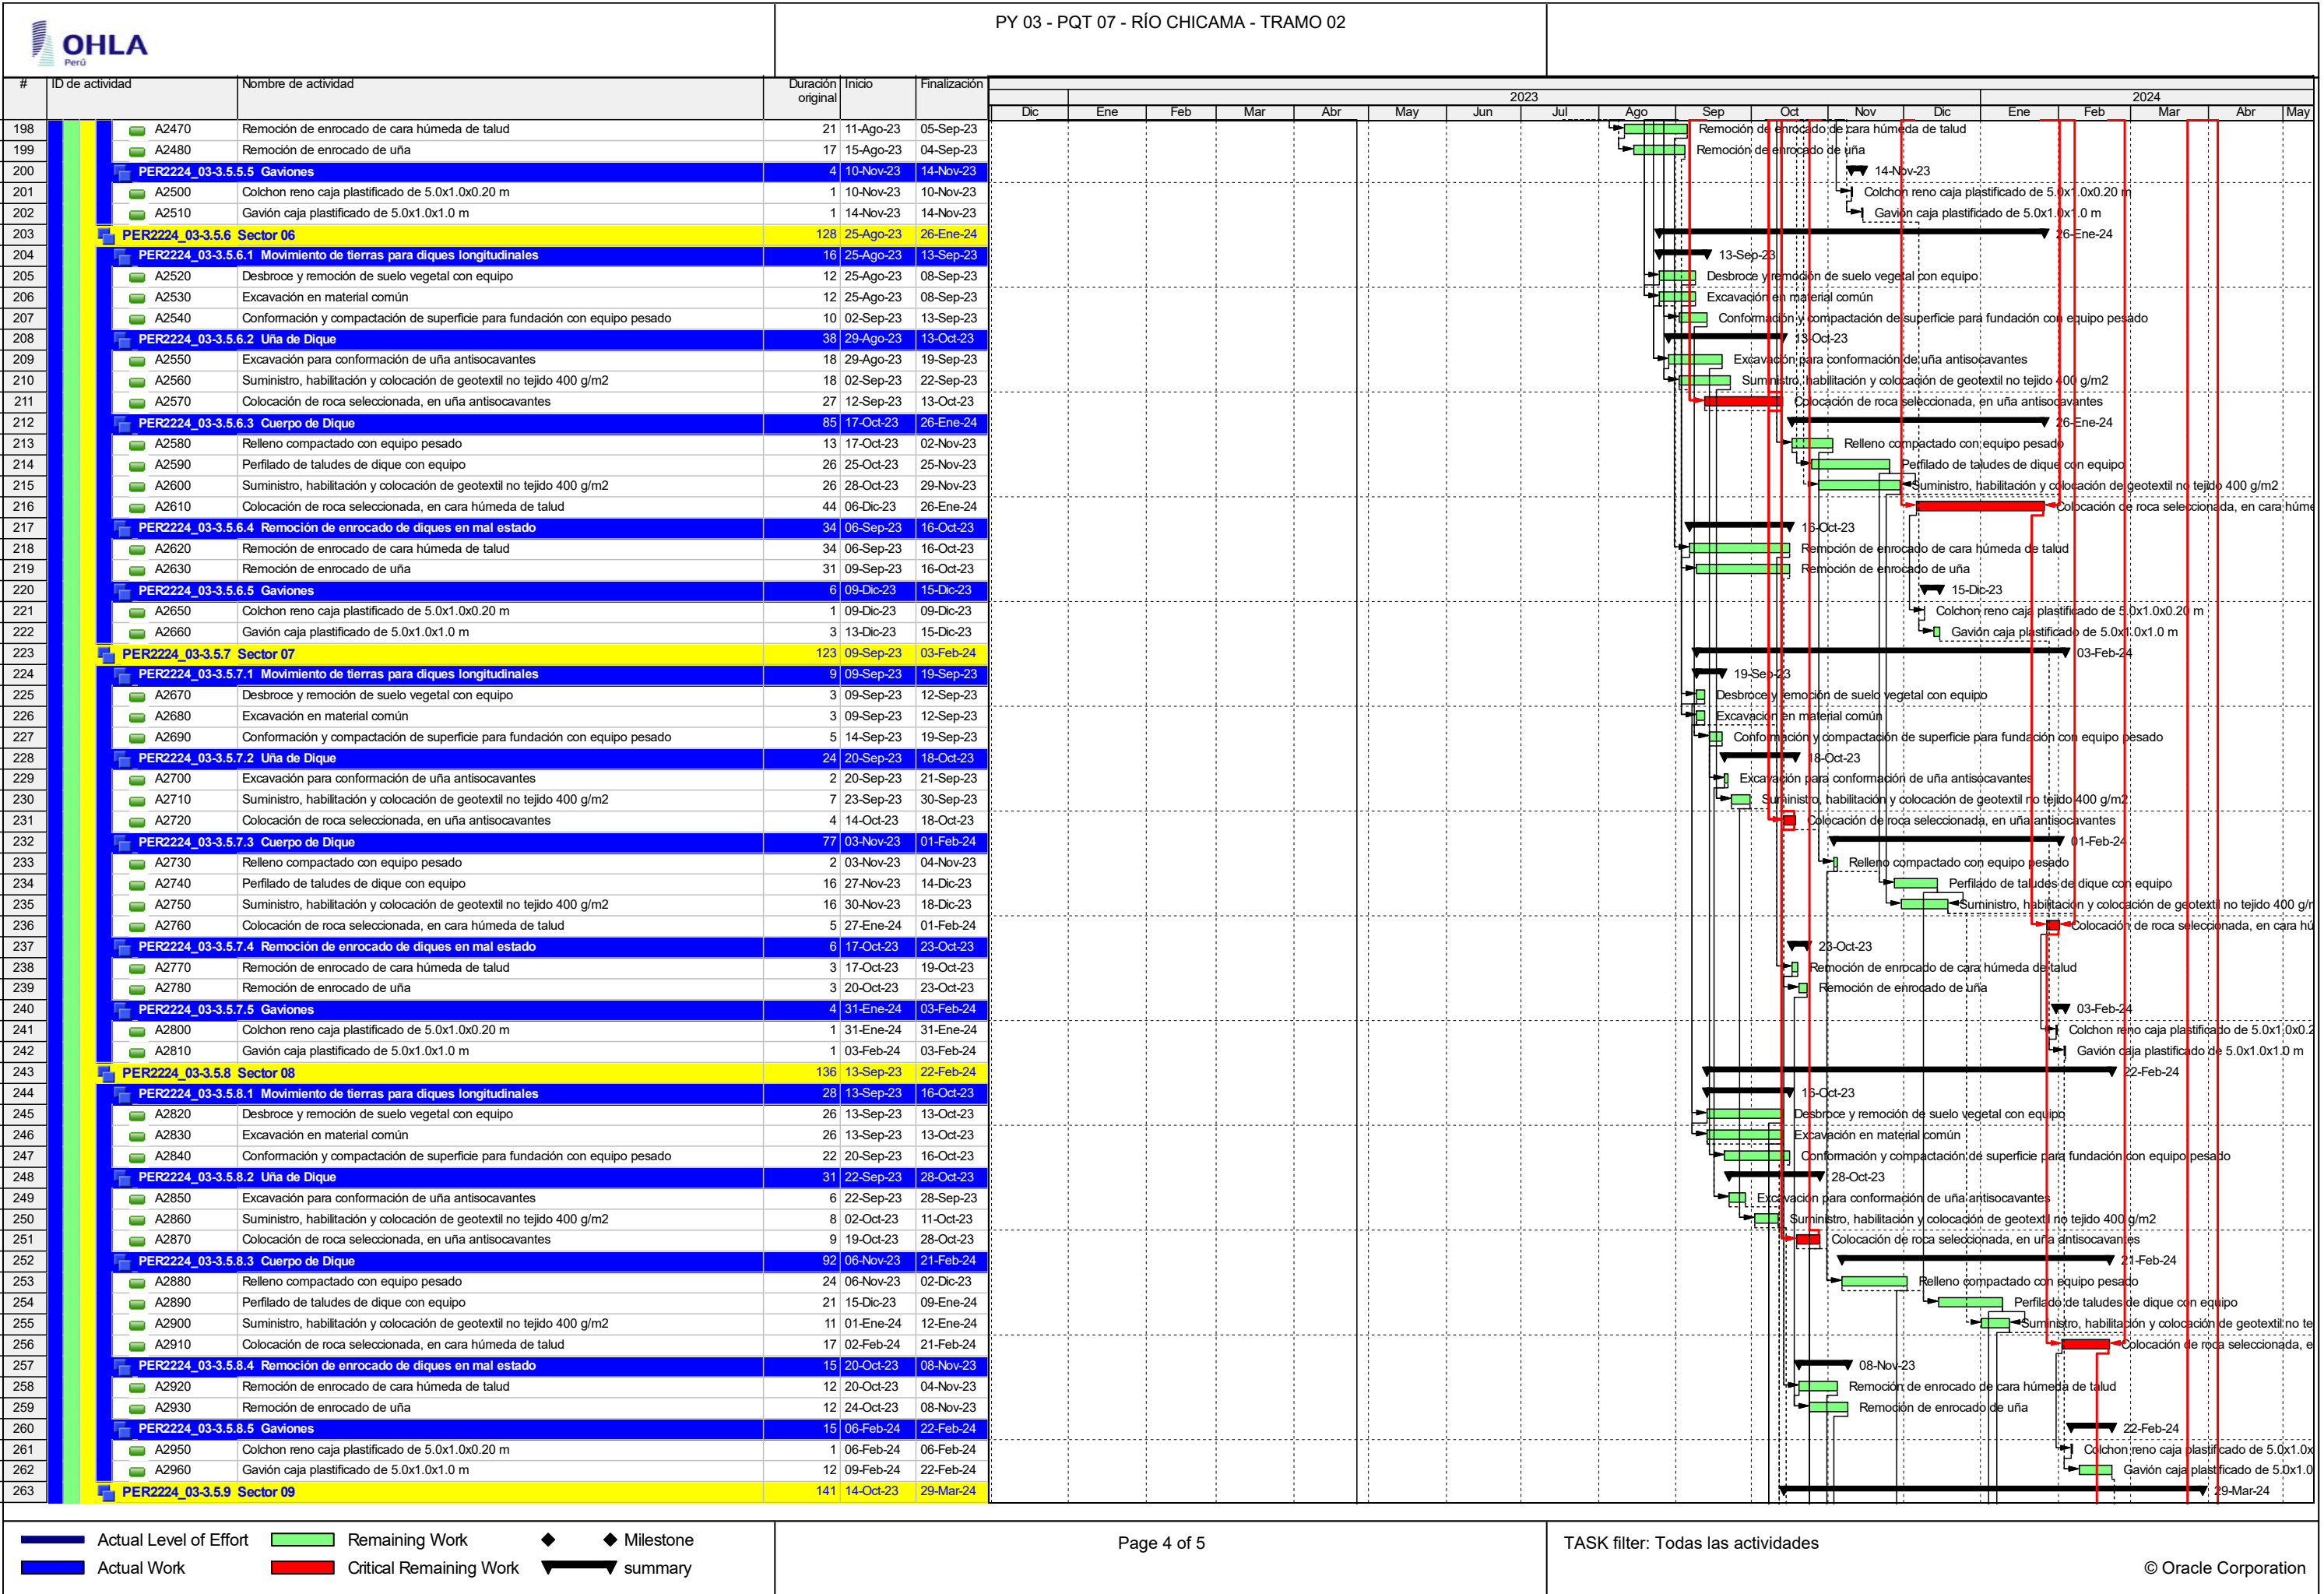

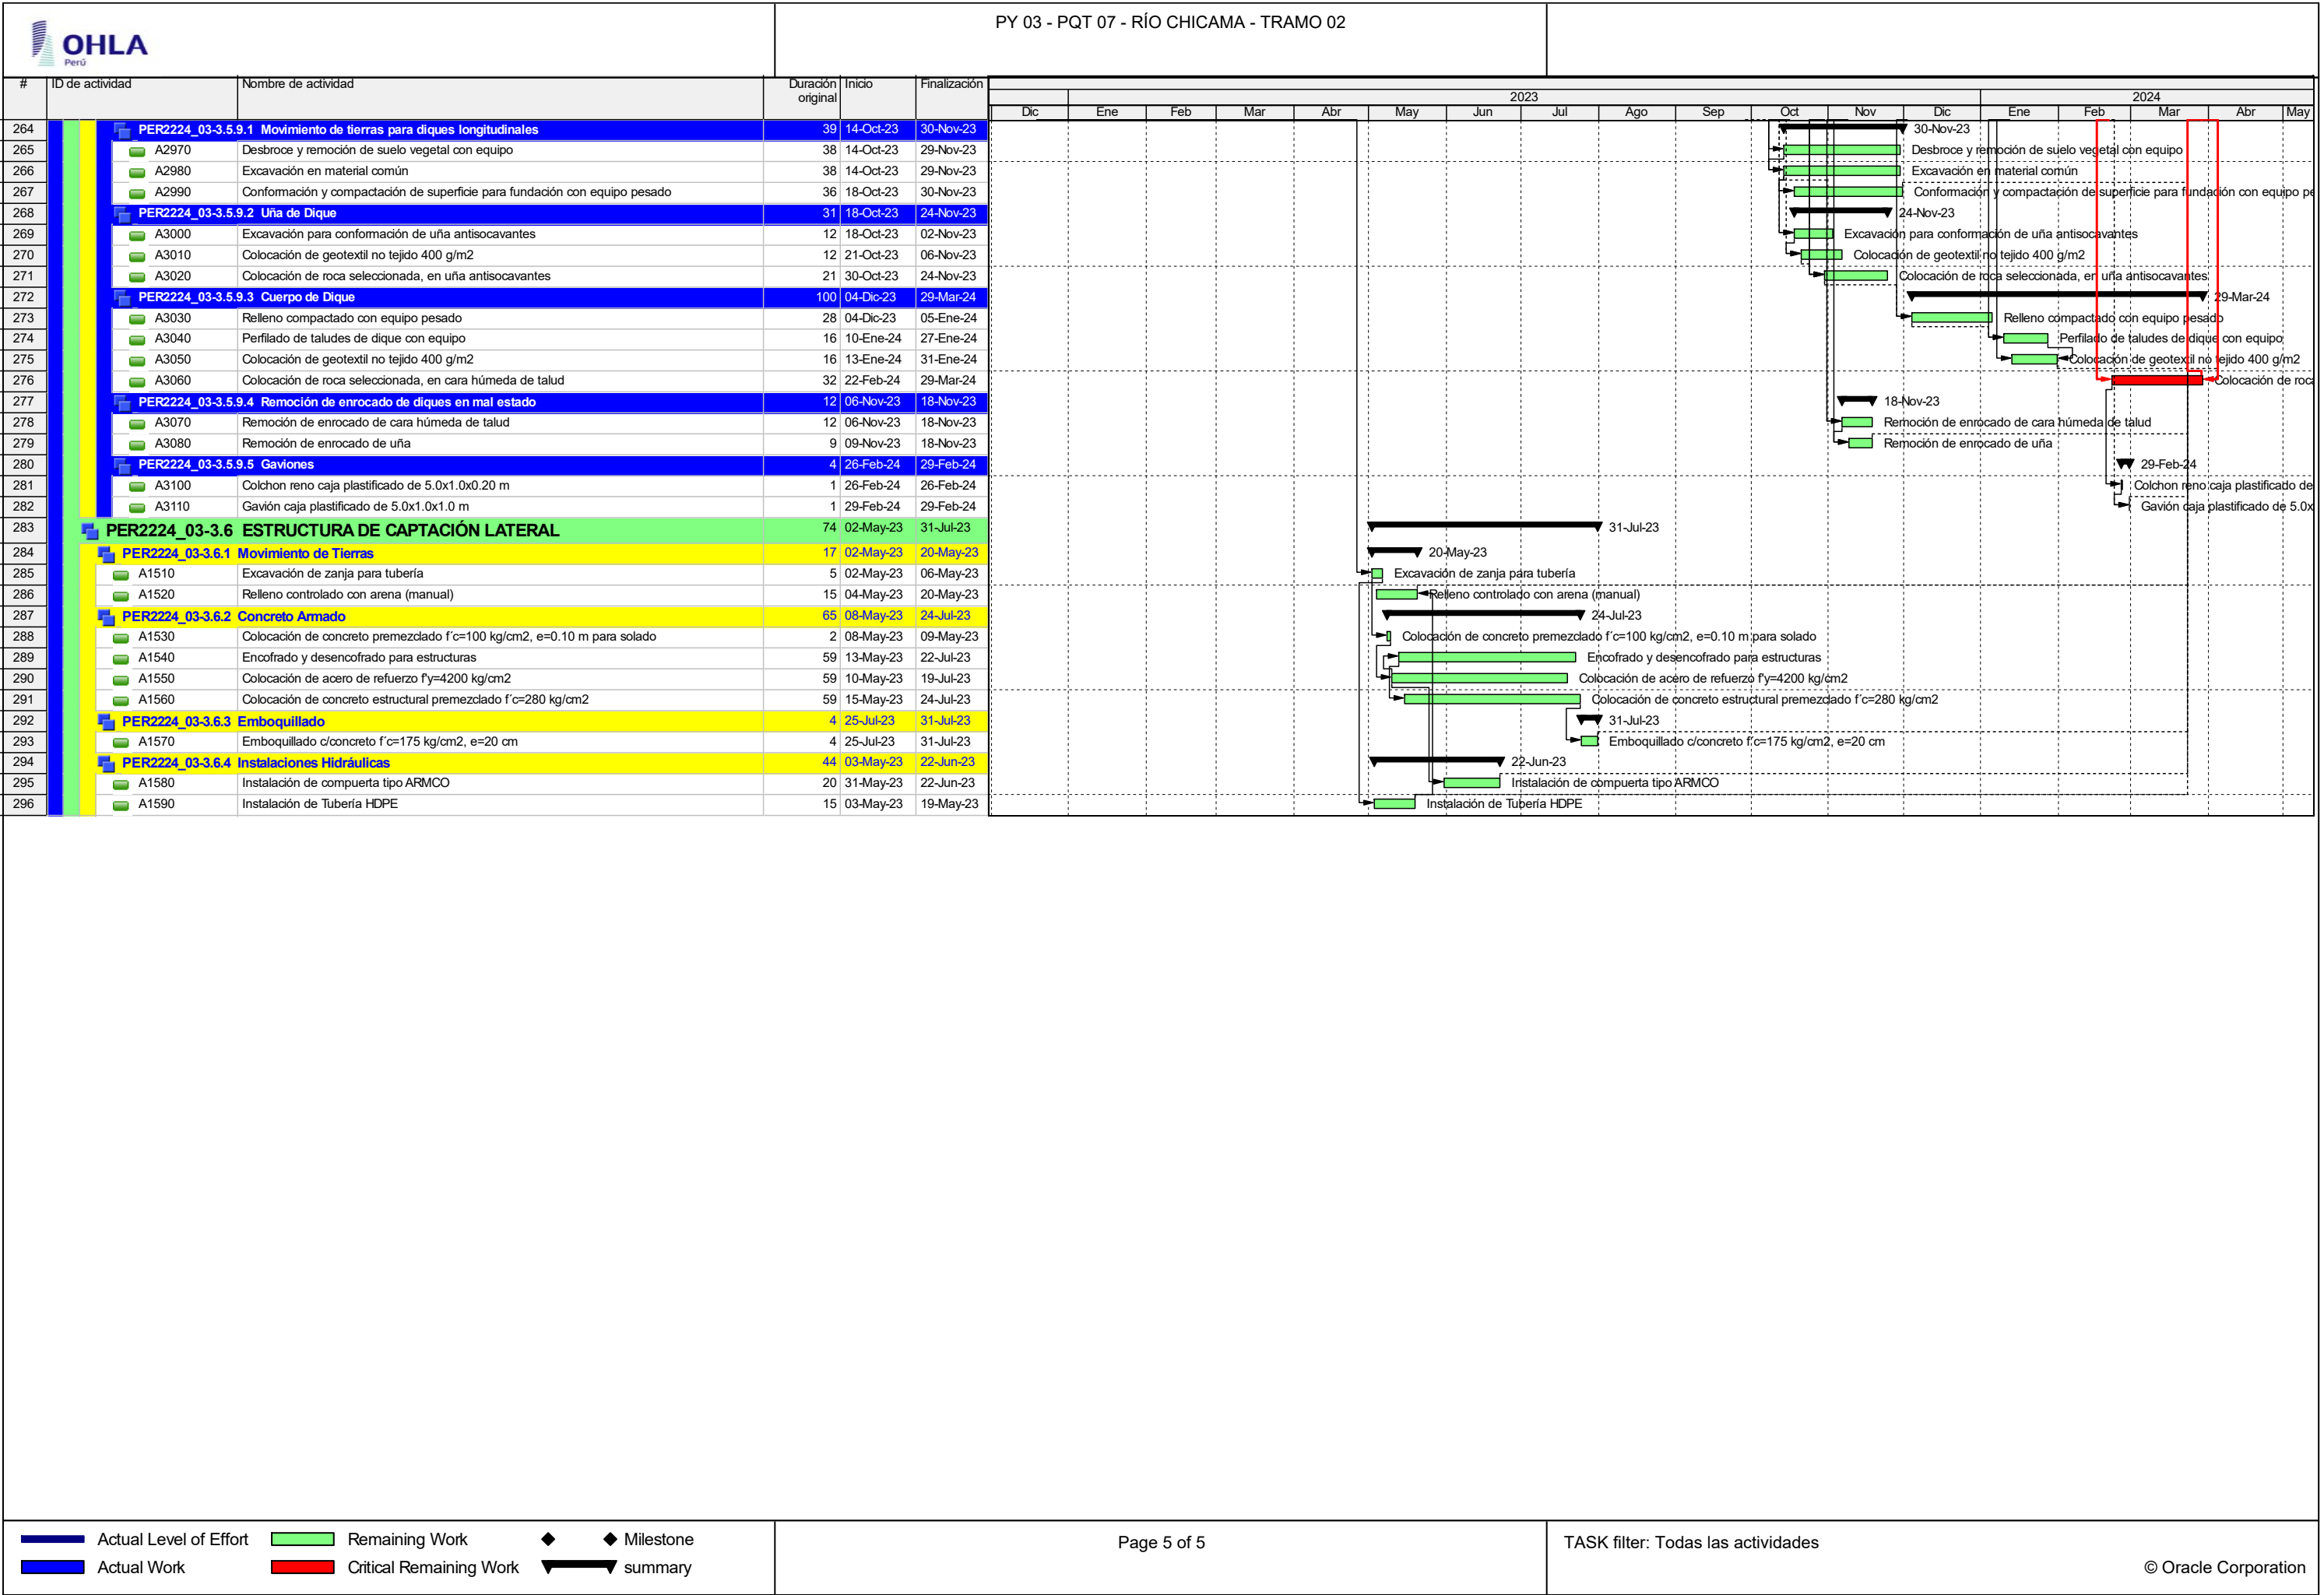

Cronograma – Nivel 4

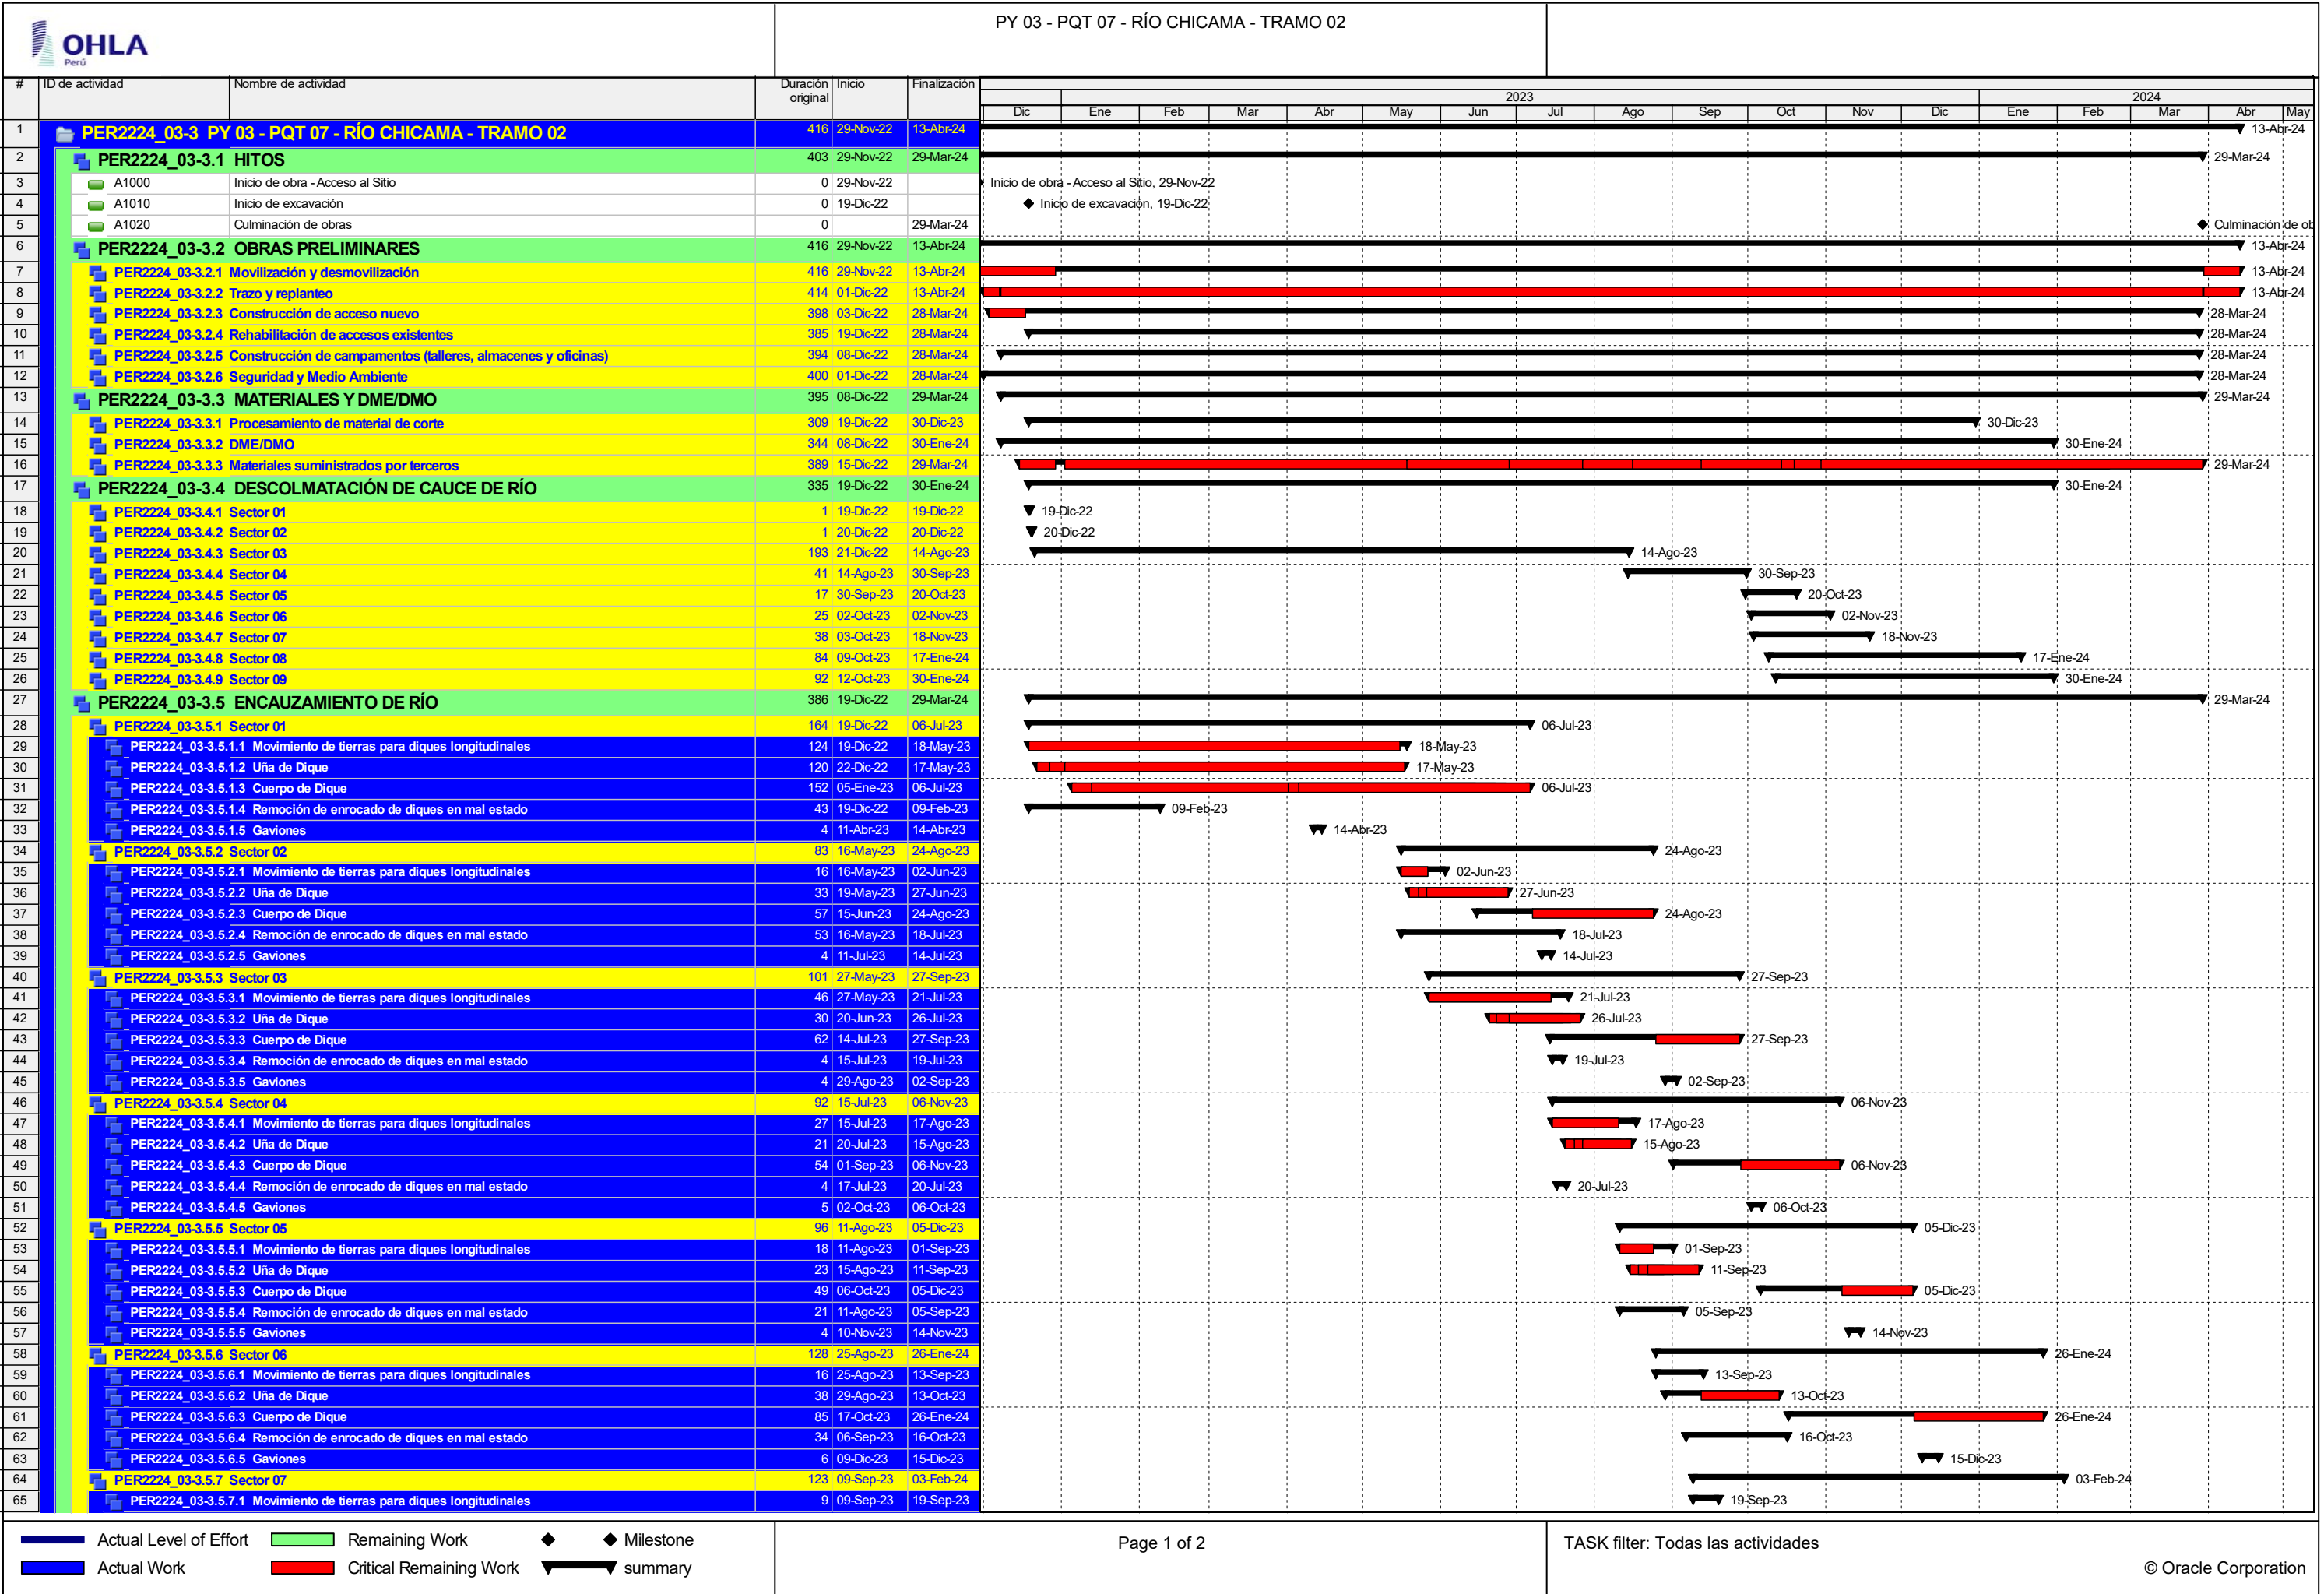

OHLA Perú			PY 03 - PQT 07 - RÍO CHICAMA - TRAMO 02																				
#	ID de actividad	Nombre de actividad	Duración original	Inicio	Finalización	2023												2024					
						Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May
66		PER2224_03-3.5.7.2 Uña de Dique	24	20-Sep-23	18-Oct-23												18-Oct-23						
67		PER2224_03-3.5.7.3 Cuerpo de Dique	77	03-Nov-23	01-Feb-24														01-Feb-24				
68		PER2224_03-3.5.7.4 Remoción de enrocado de diques en mal estado	6	17-Oct-23	23-Oct-23												23-Oct-23						
69		PER2224_03-3.5.7.5 Gaviones	4	31-Ene-24	03-Feb-24														03-Feb-24				
70		PER2224_03-3.5.8 Sector 08	136	13-Sep-23	22-Feb-24															22-Feb-24			
71		PER2224_03-3.5.8.1 Movimiento de tierras para diques longitudinales	28	13-Sep-23	16-Oct-23												16-Oct-23						
72		PER2224_03-3.5.8.2 Uña de Dique	31	22-Sep-23	28-Oct-23												28-Oct-23						
73		PER2224_03-3.5.8.3 Cuerpo de Dique	92	06-Nov-23	21-Feb-24														21-Feb-24				
74		PER2224_03-3.5.8.4 Remoción de enrocado de diques en mal estado	15	20-Oct-23	08-Nov-23												08-Nov-23						
75		PER2224_03-3.5.8.5 Gaviones	15	06-Feb-24	22-Feb-24														22-Feb-24				
76		PER2224_03-3.5.9 Sector 09	141	14-Oct-23	29-Mar-24																	29-Mar-24	
77		PER2224_03-3.5.9.1 Movimiento de tierras para diques longitudinales	39	14-Oct-23	30-Nov-23													30-Nov-23					
78		PER2224_03-3.5.9.2 Uña de Dique	31	18-Oct-23	24-Nov-23													24-Nov-23					
79		PER2224_03-3.5.9.3 Cuerpo de Dique	100	04-Dic-23	29-Mar-24															29-Mar-24			
80		PER2224_03-3.5.9.4 Remoción de enrocado de diques en mal estado	12	06-Nov-23	18-Nov-23													18-Nov-23					
81		PER2224_03-3.5.9.5 Gaviones	4	26-Feb-24	29-Feb-24															29-Feb-24			
82		PER2224_03-3.6 ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN LATERAL	74	02-May-23	31-Jul-23									31-Jul-23									
83		PER2224_03-3.6.1 Movimiento de Tierras	17	02-May-23	20-May-23						20-May-23												
84		PER2224_03-3.6.2 Concreto Armado	65	08-May-23	24-Jul-23								24-Jul-23										
85		PER2224_03-3.6.3 Emboquillado	4	25-Jul-23	31-Jul-23								31-Jul-23										
86		PER2224_03-3.6.4 Instalaciones Hidráulicas	44	03-May-23	22-Jun-23						22-Jun-23												

Actual Level of Effort

Actual Work

Remaining Work

Critical Remaining Work

Milestone

summary

Page 2 of 2

TASK filter: Todas las actividades

© Oracle Corporation

Ruta Crítica

 Actual Level of Effort
  Remaining Work
  Milestone

 Actual Work
 Critical Remaining Work
 summary

