



PROYECTO: "SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"

CRONOGRAMA ACT. LINEA BASE - "Operador Canteras Huarney"

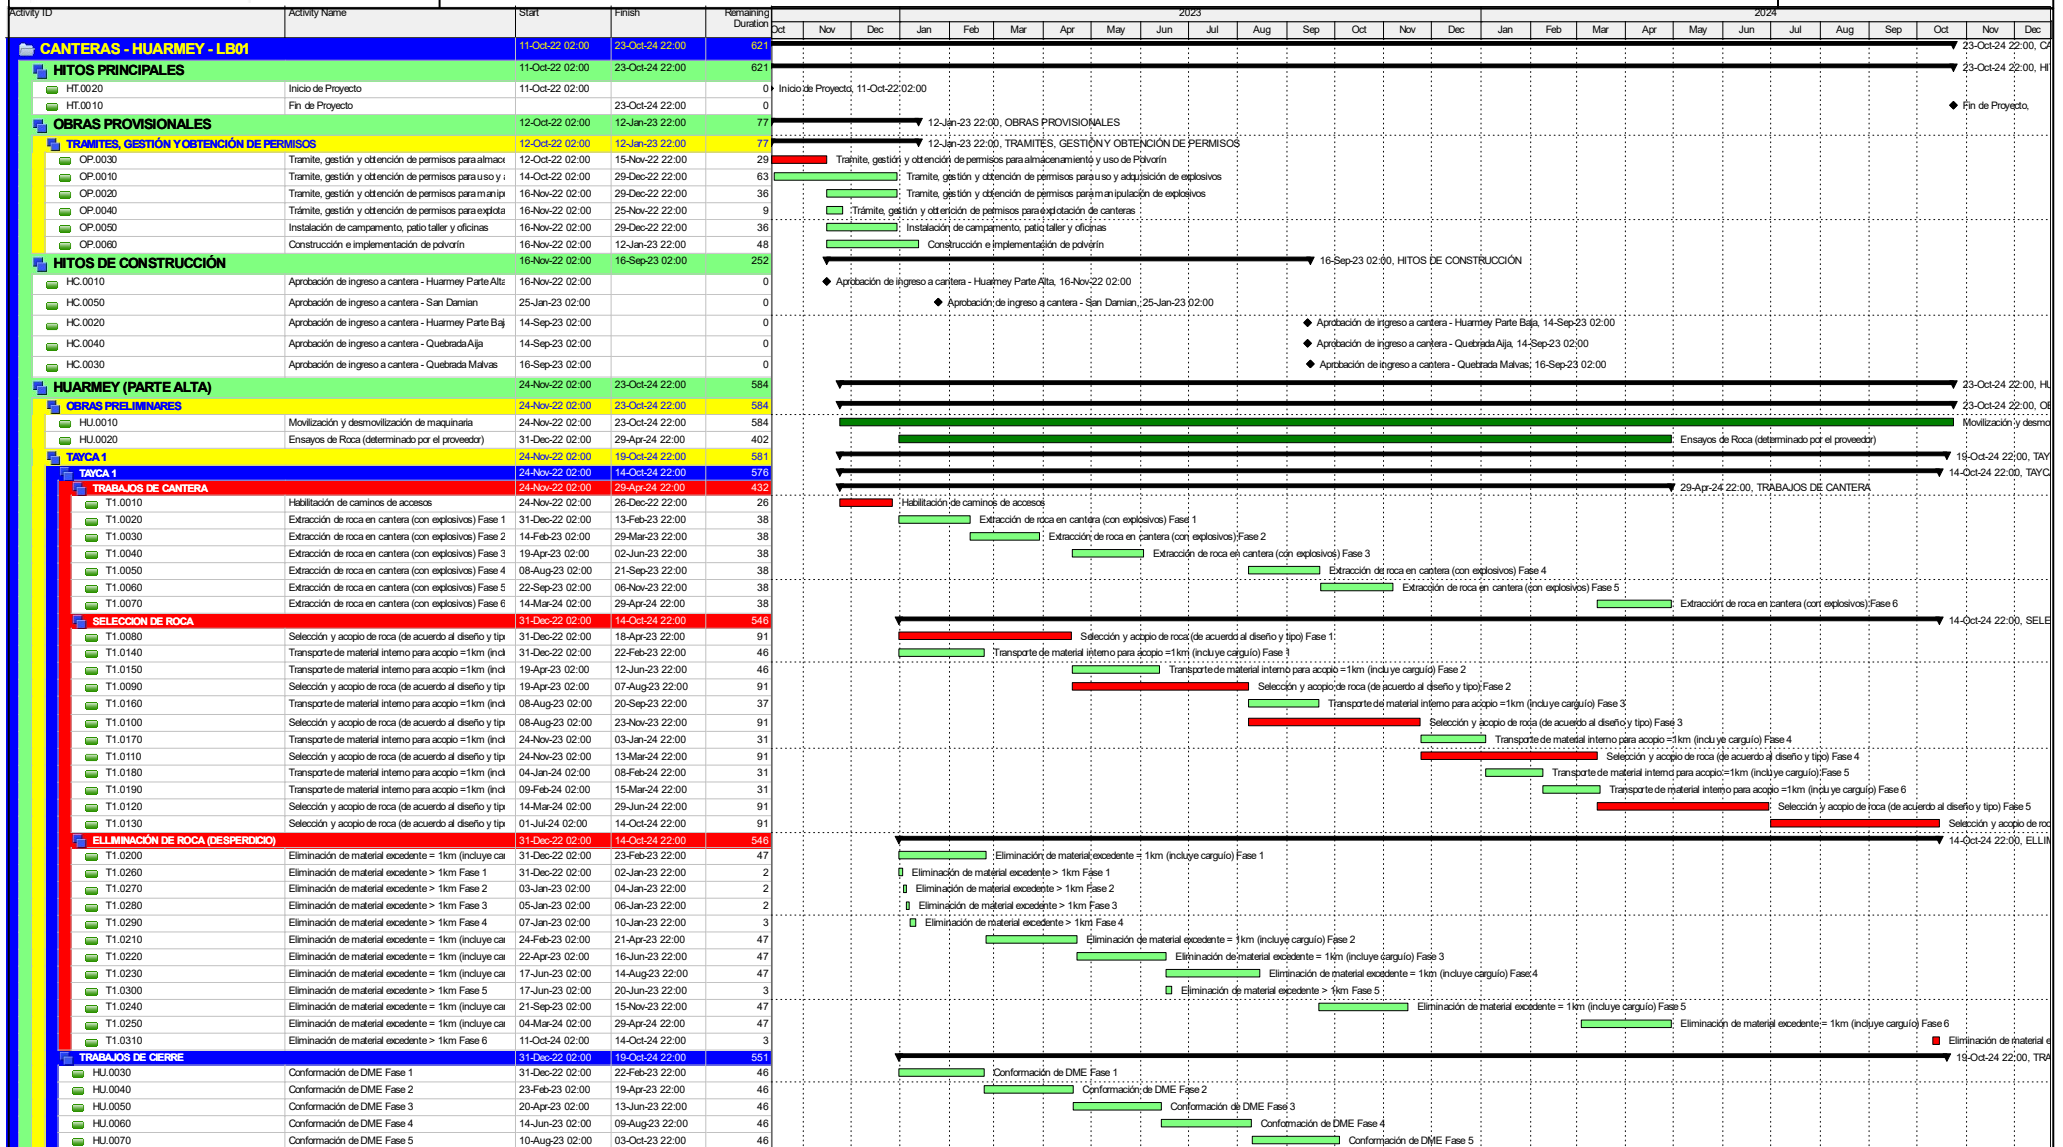

■ Remaining Level of Effort ■ Actual Work
■ Actual Level of Effort ■ Remaining Work

PROYECTO: "SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CRONOGRAMA ACT. LINEA BASE - "Operador Canteras Huarney"

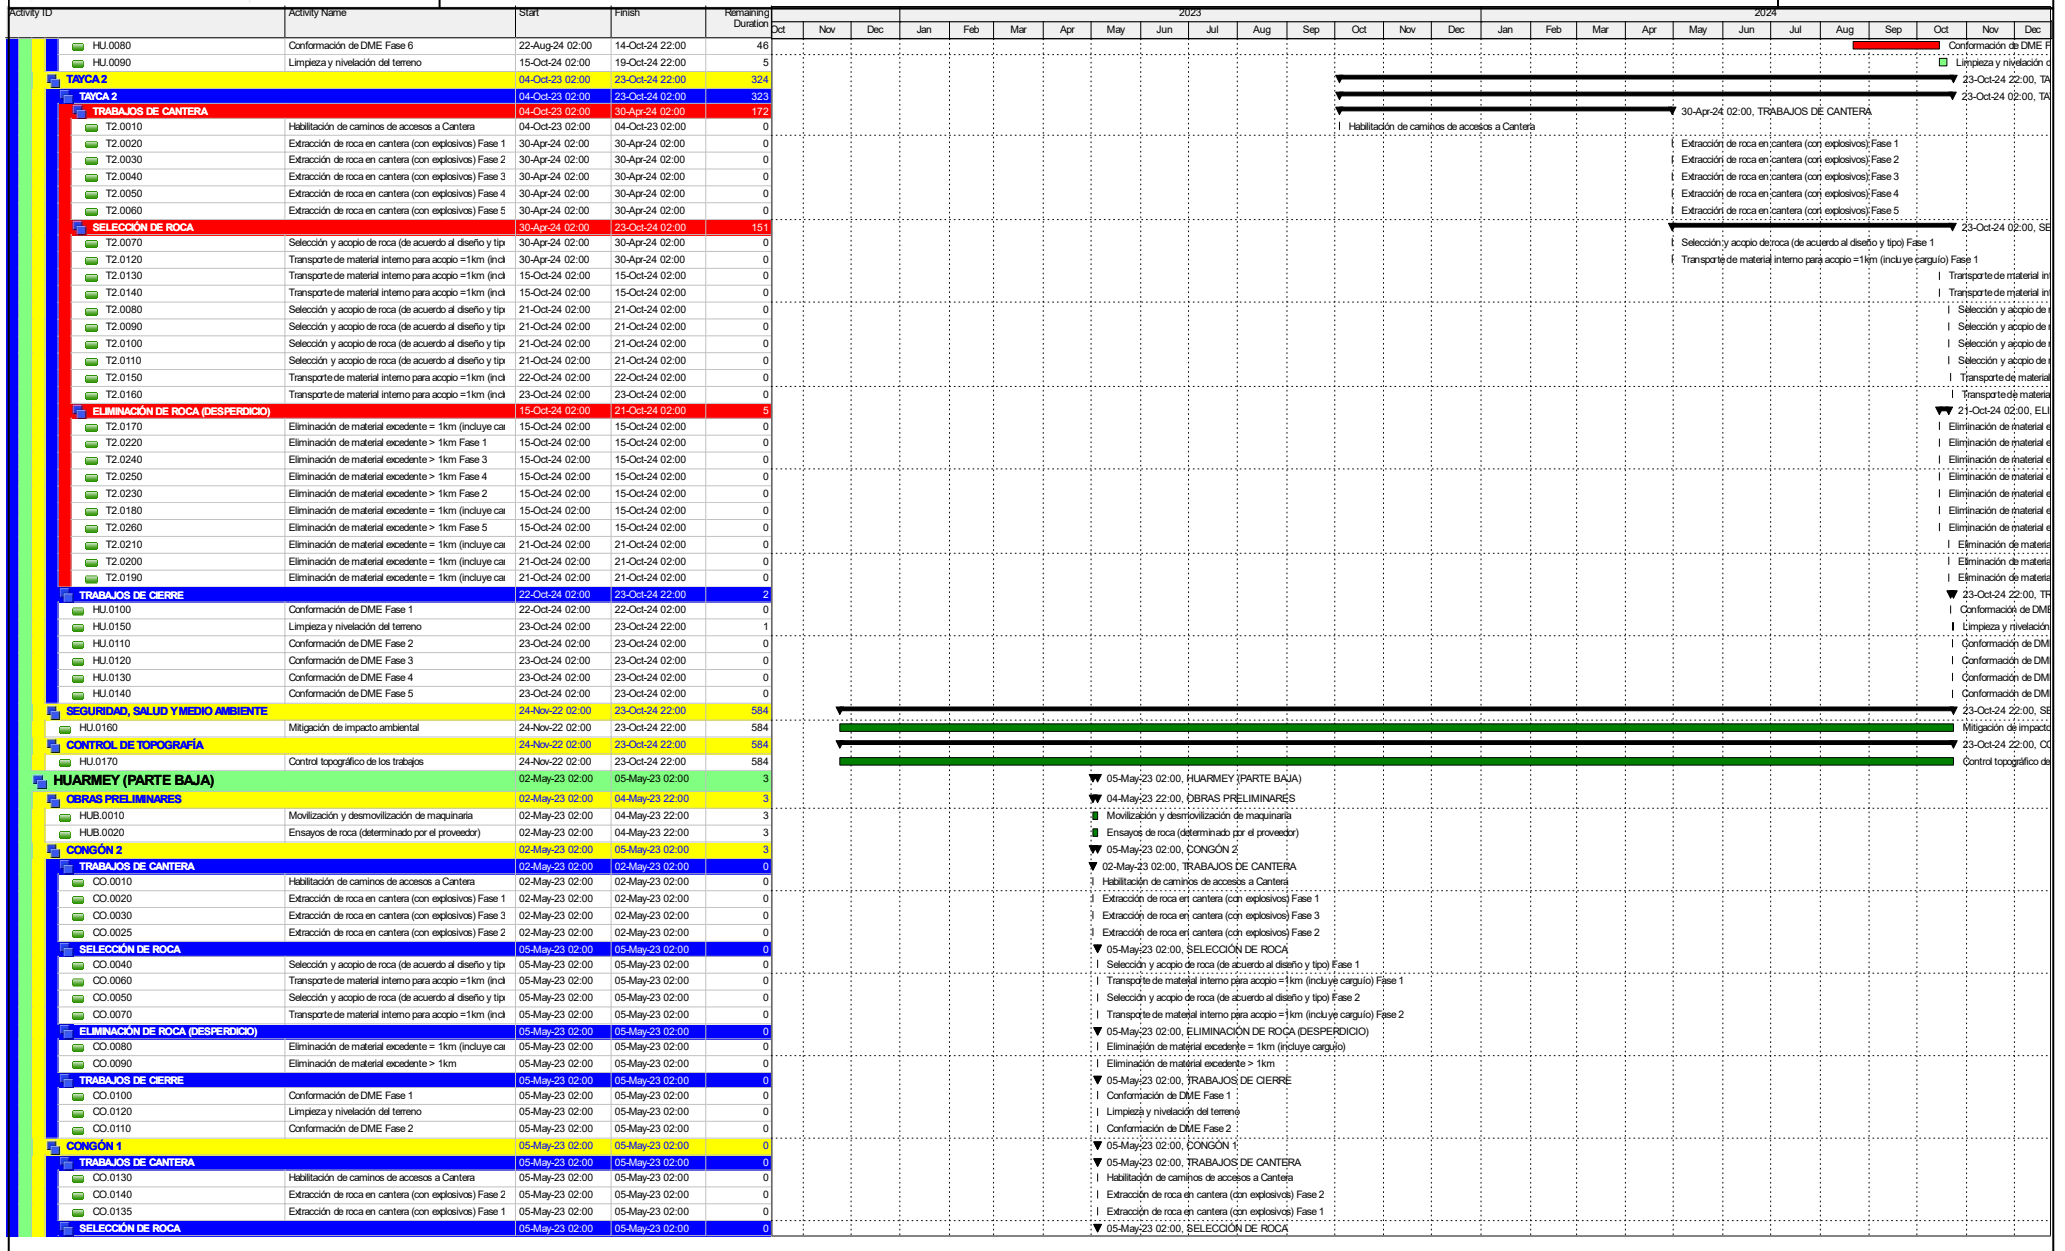

PROYECTO: "SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMHEY"

CRONOGRAMA ACT. LINEA BASE - "Operador Canteras Huarmey"

Activity ID					Activity Name	Start	Finish	Remaining Duration	2023												2024														
									Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
		CO.0150			Selección y acopio de roca (de acuerdo al diseño y tipo)	05-May-23 02:00	05-May-23 02:00	0																											
		CO.0160			Transporte de material interno para acopio =1km (incl)	05-May-23 02:00	05-May-23 02:00	0																											
		ELIMINACIÓN DE ROCA (DESPERDICIO)				05-May-23 02:00	05-May-23 02:00	0																											
		CO.0170			Eliminación de material excedente = 1km (incluye ca	05-May-23 02:00	05-May-23 02:00	0																											
		CO.0180			Eliminación de material excedente > 1km	05-May-23 02:00	05-May-23 02:00	0																											
		TRABAJO DE CIERRE				05-May-23 02:00	05-May-23 02:00	0																											
		CO.0190			Conformación de DME	05-May-23 02:00	05-May-23 02:00	0																											
		CO.0200			Limpieza y nivelación del terreno	05-May-23 02:00	05-May-23 02:00	0																											
		SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE				02-May-23 02:00	04-May-23 22:00	3																											
		CO.0210			Mitigación de impacto ambiental	02-May-23 02:00	04-May-23 22:00	3																											
	CONTROL DE TOPOGRAFÍA				02-May-23 02:00	04-May-23 22:00	3																												
	CO.0220			Control topográfico de los trabajos	02-May-23 02:00	04-May-23 22:00	3																												
	QUEBRADA MALVAS				16-Sep-23 02:00	27-Sep-23 02:00	9																												
	OBRAS PRELIMINARES				16-Sep-23 02:00	26-Sep-23 22:00	9																												
	QM.0010				Movilización y desmovilización de maquinaria	16-Sep-23 02:00	26-Sep-23 22:00	9																											
	QM.0020				Ensayos de roca (determinado por el proveedor)	16-Sep-23 02:00	21-Sep-23 22:00	5																											
	ROCA 2				16-Sep-23 02:00	22-Sep-23 02:00	5																												
	TRABAJO DE CANTERA				16-Sep-23 02:00	16-Sep-23 02:00	0																												
	A2080				Habilitación de caminos de accesos a Cantera	16-Sep-23 02:00	16-Sep-23 02:00	0																											
	A2090				Extracción de roca en cantera (con explosivos) Fase 1	16-Sep-23 02:00	16-Sep-23 02:00	0																											
	A2100				Extracción de roca en cantera (con explosivos) Fase 3	16-Sep-23 02:00	16-Sep-23 02:00	0																											
	A2095				Extracción de roca en cantera (con explosivos) Fase 2	16-Sep-23 02:00	16-Sep-23 02:00	0																											
	SELECCIÓN DE ROCA				22-Sep-23 02:00	22-Sep-23 02:00	0																												
	QM.0060				Selección y acopio de roca (de acuerdo al diseño y tipo)	22-Sep-23 02:00	22-Sep-23 02:00	0																											
	QM.0070				Transporte de material interno para acopio =1km (incl)	22-Sep-23 02:00	22-Sep-23 02:00	0																											
	ELIMINACIÓN DE ROCA (DESPERDICIO)				22-Sep-23 02:00	22-Sep-23 02:00	0																												
	QM.0080				Eliminación de material excedente = 1km (incluye ca	22-Sep-23 02:00	22-Sep-23 02:00	0																											
	QM.0090				Eliminación de material excedente > 1km	22-Sep-23 02:00	22-Sep-23 02:00	0																											
	TRABAJO DE CIERRE				22-Sep-23 02:00	22-Sep-23 02:00	0																												
	QM.0100				Conformación de DME	22-Sep-23 02:00	22-Sep-23 02:00	0																											
	QM.0110				Limpieza y nivelación del terreno	22-Sep-23 02:00	22-Sep-23 02:00	0																											
	CERRO MALVAS				22-Sep-23 02:00	27-Sep-23 02:00	4																												
	TRABAJO DE CANTERA				22-Sep-23 02:00	22-Sep-23 02:00	0																												
	QM.0120				Habilitación de caminos de accesos a Cantera	22-Sep-23 02:00	22-Sep-23 02:00	0																											
	QM.0130				Extracción de roca en cantera (con explosivos) Fase 1	22-Sep-23 02:00	22-Sep-23 02:00	0																											
	QM.0220				Extracción de roca en cantera (con explosivos) Fase 2	22-Sep-23 02:00	22-Sep-23 02:00	0																											
	SELECCIÓN DE ROCA				27-Sep-23 02:00	27-Sep-23 02:00	0																												
	QM.0140				Selección y acopio de roca (de acuerdo al diseño y tipo)	27-Sep-23 02:00	27-Sep-23 02:00	0																											
	QM.0150				Transporte de material interno para acopio =1km (incl)	27-Sep-23 02:00	27-Sep-23 02:00	0																											
	ELIMINACIÓN DE ROCA (DESPERDICIO)				27-Sep-23 02:00	27-Sep-23 02:00	0																												
	QM.0160				Eliminación de material excedente = 1km (incluye ca	27-Sep-23 02:00	27-Sep-23 02:00	0																											
	QM.0170				Eliminación de material excedente > 1km	27-Sep-23 02:00	27-Sep-23 02:00	0																											
	TRABAJO DE CIERRE				27-Sep-23 02:00	27-Sep-23 02:00	0																												
	QM.0180				Conformación de DME	27-Sep-23 02:00	27-Sep-23 02:00	0																											
	QM.0190				Limpieza y nivelación del terreno	27-Sep-23 02:00	27-Sep-23 02:00	0																											
	SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE				16-Sep-23 02:00	26-Sep-23 22:00	9																												
	QM.0200				Mitigación de impacto ambiental	16-Sep-23 02:00	26-Sep-23 22:00	9																											
	CONTROL DE TOPOGRAFÍA				16-Sep-23 02:00	26-Sep-23 22:00	9																												
	QM.0210				Control topográfico de los trabajos	16-Sep-23 02:00	26-Sep-23 22:00	9																											
	QUEBRADA ALJA				14-Sep-23 02:00	16-Sep-23 02:00	2																												
	OBRAS PRELIMINARES				14-Sep-23 02:00	15-Sep-23 22:00	2																												
	QA.0010				Movilización y desmovilización de maquinaria	14-Sep-23 02:00	15-Sep-23 22:00	2																											

Actividad ID	Activity Name	Start	Finish	Remaining Duration	2023												2024																			
					Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
OBRAS PRELIMINARES					25-Jan-23 02:00					13-Sep-23 22:00					192																					
SD.0010					Movilización y desmovilización de maquinaria					25-Jan-23 02:00					13-Sep-23 22:00					192																
SD.0020					Ensayos de roca (determinado por el proveedor)					28-Jan-23 02:00					27-Mar-23 22:00					50																
ROCA IRMAN					25-Jan-23 02:00					13-Sep-23 22:00					192																					
TRABAJOS DE CANTERA					25-Jan-23 02:00					27-Mar-23 22:00					53																					
SD.0040					Habilitación de caminos de acceso a Canteras					25-Jan-23 02:00					27-Jan-23 22:00					3																
SD.0050					Extracción de roca en cantera (con explosivos) Fase 1					28-Jan-23 02:00					25-Feb-23 22:00					25																
SD.0140					Extracción de roca en cantera (con explosivos) Fase 2					27-Feb-23 02:00					27-Mar-23 22:00					25																
SELECCIÓN DE ROCA					25-Jan-23 02:00					26-Jul-23 22:00					150																					
SD.0060					Selección y acopio de roca (de acuerdo al diseño y tipo)					28-Jan-23 02:00					27-Apr-23 22:00					75																
SD.0070					Transporte de material interno para acopio >1km (incl)					28-Jan-23 02:00					25-Mar-23 22:00					49																
SD.0075					Transporte de material interno para acopio >1km (incl)					27-Mar-23 02:00					25-Apr-23 22:00					24																
SD.0085					Selección y acopio de roca (de acuerdo al diseño y tipo)					28-Apr-23 02:00					26-Jul-23 22:00					75																
ELIMINACIÓN DE ROCA (DESPERDICIO)					25-Jan-23 02:00					12-Sep-23 22:00					188																					
SD.0090					Eliminación de material excedente > 1km (incluye ca					28-Jan-23 02:00					20-May-23 22:00					94																
SD.0090					Eliminación de material excedente > 1km Fase 1					28-Jan-23 02:00					07-Feb-23 22:00					9																
SD.0150					Eliminación de material excedente > 1km Fase 2					08-Feb-23 02:00					11-Feb-23 22:00					4																
SD.0085					Eliminación de material excedente > 1km (incluye ca					22-May-23 02:00					12-Sep-23 22:00					94																
TRABAJOS DE CIERRE					27-Feb-23 02:00					13-Sep-23 22:00					164																					
SD.0100					Conformación de DME					27-Feb-23 02:00					29-Apr-23 22:00					52																
SD.0110					Limpieza y nivelación del terreno					13-Sep-23 02:00					13-Sep-23 22:00					1																
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE					25-Jan-23 02:00					13-Sep-23 22:00					192																					
SD.0120					Mitigación de impacto ambiental					25-Jan-23 02:00					13-Sep-23 22:00					192																
CONTROL DE TOPOGRAFÍA					25-Jan-23 02:00					13-Sep-23 22:00					192																					
SD.0130					Control topográfico de los trabajos					25-Jan-23 02:00					13-Sep-23 22:00					192																
OTROS					11-Oct-22 02:00					23-Oct-24 22:00					621																					
VA.0040					Exámenes Médicos - Personal Directo (Ingreso y sal					11-Oct-22 02:00					20-Dec-22 22:00					58																
VA.0010					Transporte Interno - Personal Directo (Camioneta+ch					16-Nov-22 02:00					23-Oct-24 22:00					591																
VA.0070					AGUA - Personal Directo (1lt/persona/día=30lt/mes)					16-Nov-22 02:00					23-Oct-24 22:00					591																
VA.0020					EPPS - Personal Directo (renovación cada 6 meses)					21-Dec-22 02:00					06-Jan-23 22:00					15																
VA.0050					Certificado de Operadores - Personal Directo					07-Jan-23 02:00					05-Jul-23 22:00					150																
VA.0060					Charla de Inducción - Personal Directo					07-Jan-23 02:00					05-Jul-23 22:00					150																
VA.0030					EPPS - Personal Directo (renovación cada 6 meses)					16-Aug-23 02:00					02-Sep-23 22:00					15																
