

CRONOGRAMA DE SERVICIO

Id	EDT	Nombre	ZONA	Comienzo	Duración	Fin	junio 2024julio 2024agosto 2024																														
							31	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
1	1	Serv. Investigación Geofísica y Perf. Diamantina en Pqt.1C: Cant. Virú y Pqt.1C: Cant. Chicama		1/06/2024	71 días	10/08/2024																															
2	1.1	MOVILIZACIÓN - INSTALACIÓN		1/06/2024	70 días	9/08/2024																															
3	1.1.1	Movilización		1/06/2024	10 días	10/06/2024																															
4	1.1.2	Admisión de Personal y Unidad Móvil de camioneta		1/06/2024	10 días	10/06/2024																															
5	1.1.3	Homologación de camioneta		1/06/2024	10 días	10/06/2024																															
6	1.1.4	Instalaciones Temporales en campamento		1/06/2024	10 días	10/06/2024																															
7	1.1.5	Desmovilización		9/08/2024	1 día	9/08/2024																															
8	1.2	CANTERA CERRO BLANCO 1-2	I	11/06/2024	17 días	27/06/2024																															
9	1.2.1	Construcción de acceso		11/06/2024	7 días	17/06/2024																															
10	1.2.2	Sondaje diamantino y logueo		18/06/2024	9 días	26/06/2024																															
11	1.2.3	Informe técnico de sondaje		19/06/2024	9 días	27/06/2024																															
12	1.2.4	Refracción sísmica, MASW-2D, MASW, MAM		11/06/2024	4 días	14/06/2024																															
13	1.2.5	informe técnico en gabinete		13/06/2024	8 días	20/06/2024																															
14	1.3	CANTERA CERRO NIÑO BAJO	I	16/06/2024	22 días	7/07/2024																															
15	1.3.1	Construcción de acceso		20/06/2024	7 días	26/06/2024																															
16	1.3.2	Sondaje diamantino y logueo		27/06/2024	10 días	6/07/2024																															
17	1.3.3	Informe técnico de sondaje		28/06/2024	10 días	7/07/2024																															
18	1.3.4	Refracción sísmica, MASW-2D, MASW, MAM		16/06/2024	4 días	19/06/2024																															
19	1.3.5	informe técnico en gabinete		18/06/2024	8 días	25/06/2024																															
20	1.4	CANTERA TOMABAL 5	I	21/06/2024	27 días	17/07/2024																															
21	1.4.1	Construcción de acceso		29/06/2024	7 días	5/07/2024																															
22	1.4.2	Sondaje diamantino y logueo		7/07/2024	10 días	16/07/2024																															
23	1.4.3	Informe técnico de sondaje		8/07/2024	10 días	17/07/2024																															
24	1.4.4	Refracción sísmica, MASW-2D, MASW, MAM		21/06/2024	4 días	24/06/2024																															
25	1.4.5	informe técnico en gabinete		23/06/2024	8 días	30/06/2024																															
26	1.5	CANTERA CERRO BLANCO 3	I	26/06/2024	32 días	27/07/2024																															
27	1.5.1	Construcción de acceso		8/07/2024	7 días	14/07/2024																															
28	1.5.2	Sondaje diamantino y logueo		17/07/2024	10 días	26/07/2024																															
29	1.5.3	Informe técnico de sondaje		18/07/2024	10 días	27/07/2024																															
30	1.5.4	Refracción sísmica, MASW-2D, MASW, MAM		26/06/2024	4 días	29/06/2024																															
31	1.5.5	informe técnico en gabinete		28/06/2024	8 días	5/07/2024																															
32	1.6	CANTERA CARABAMBA 1	II	1/07/2024	10 días	10/07/2024																															
33	1.6.1	Refracción sísmica, MASW-2D, MASW, MAM		1/07/2024	4 días	4/07/2024																															
34	1.6.2	informe técnico en gabinete		3/07/2024	8 días	10/07/2024																															
35	1.7	CANTERA SAN BARTOLO 1	III	11/06/2024	57 días	6/08/2024																															
36	1.7.1	Construcción de acceso		11/06/2024	7 días	17/06/2024																															
37	1.7.2	Sondaje diamantino y logueo		27/07/2024	10 días	5/08/2024																															
38	1.7.3	Informe técnico de sondaje		28/07/2024	10 días	6/08/2024																															
39	1.7.4	Refracción sísmica, MASW-2D, MASW, MAM		5/07/2024	4 días	8/07/2024																															
40	1.7.5	informe técnico en gabinete		7/07/2024	8 días	14/07/2024																															
41	1.8	CANTERA NUEVO ALTO PERU 3	III	20/06/2024	31 días	20/07/2024																															
42	1.8.1	Construcción de acceso		20/06/2024	7 días	26/06/2024																															
43	1.8.2	Sondaje diamantino y logueo		27/06/2024	15 días	11/07/2024																															
44	1.8.3	Informe técnico de sondaje		28/06/2024	15 días	12/07/2024																															
45	1.8.4	Refracción sísmica, MASW-2D, MASW, MAM		10/07/2024	8 días	17/07/2024																															
46	1.8.5	informe técnico en gabinete		13/07/2024	8 días	20/07/2024																															
47	1.9	CANTERA OSO 3	III	29/06/2024	30 días	28/07/2024																															
48	1.9.1	Construcción de acceso		29/06/2024	7 días	5/07/2024																															
49	1.9.2	Sondaje diamantino y logueo		12/07/2024	9 días	20/07/2024																															
50	1.9.3	Informe técnico de sondaje		13/07/2024	9 días	21/07/2024																															

Tareas críticas

División crítica

Tarea

División

.....

●————●

.....

Hito

Atraso

Resumen

Resumen del proyecto

—————

—————

—————

Hito

Atraso

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea crítica resumida

División crítica resumida

Tarea inactiva

Hito inactivo

.....

◆

Tarea crítica resumida

División crítica resumida

Tarea inactiva

Hito inactivo

.....

◆

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

[

]


Hito externo

Fecha límite

Progreso

1

CRONOGRAMA DE SERVICIO

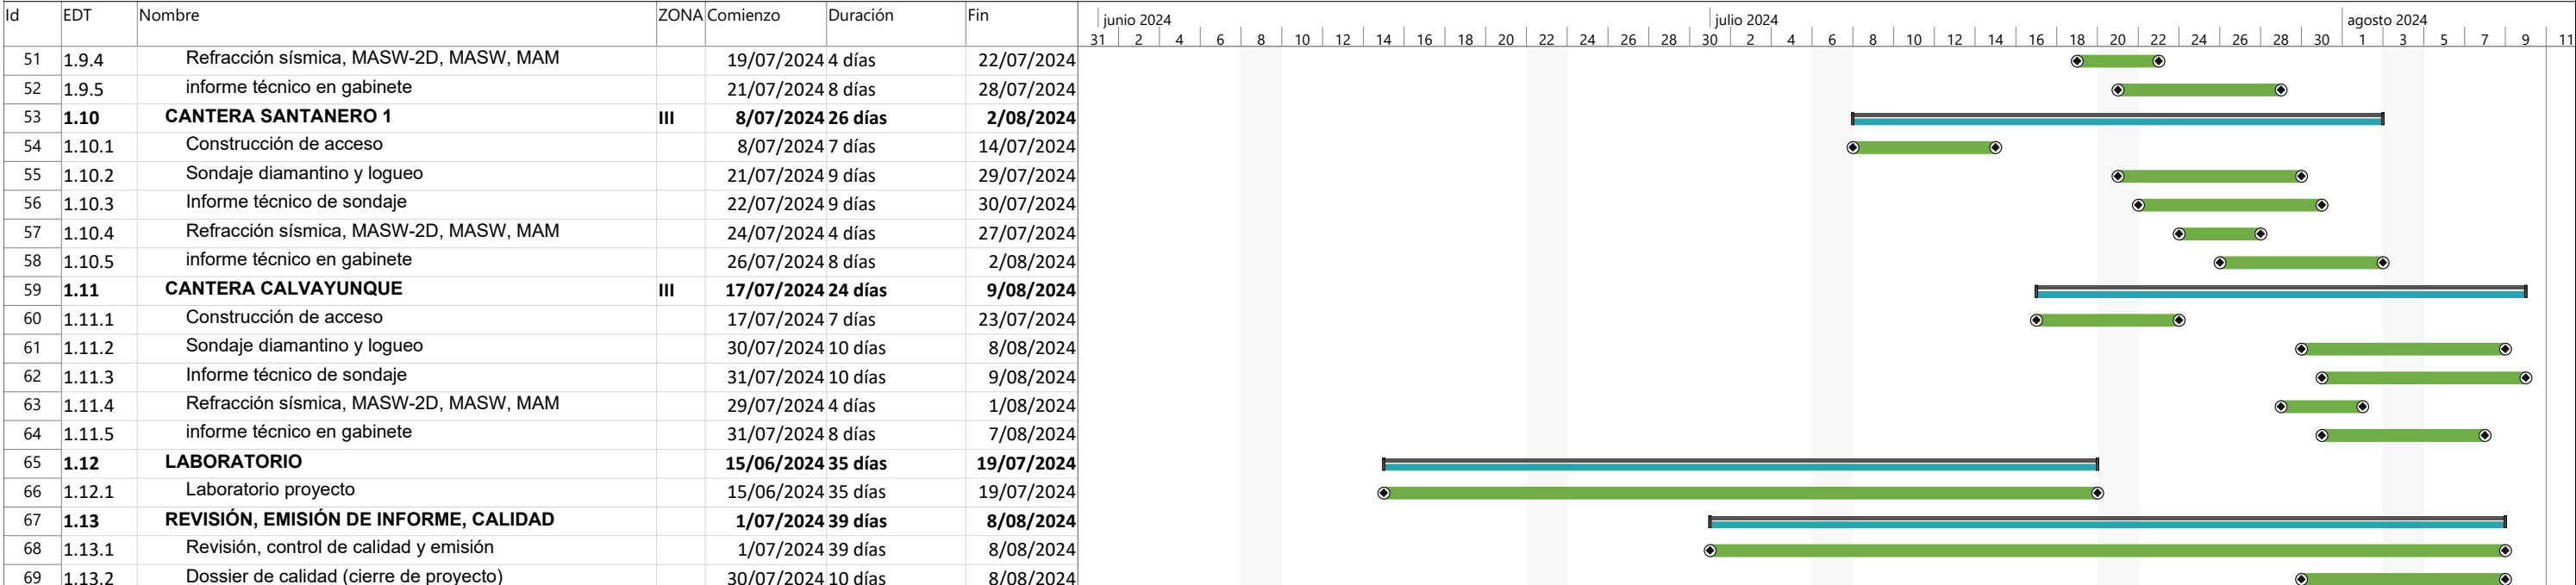

Tareas críticas		Hito		Tarea crítica resumida		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo	
División crítica		Atraso		División crítica resumida		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha limite	
Tarea		Resumen		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
División		Resumen del proyecto		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas			
