


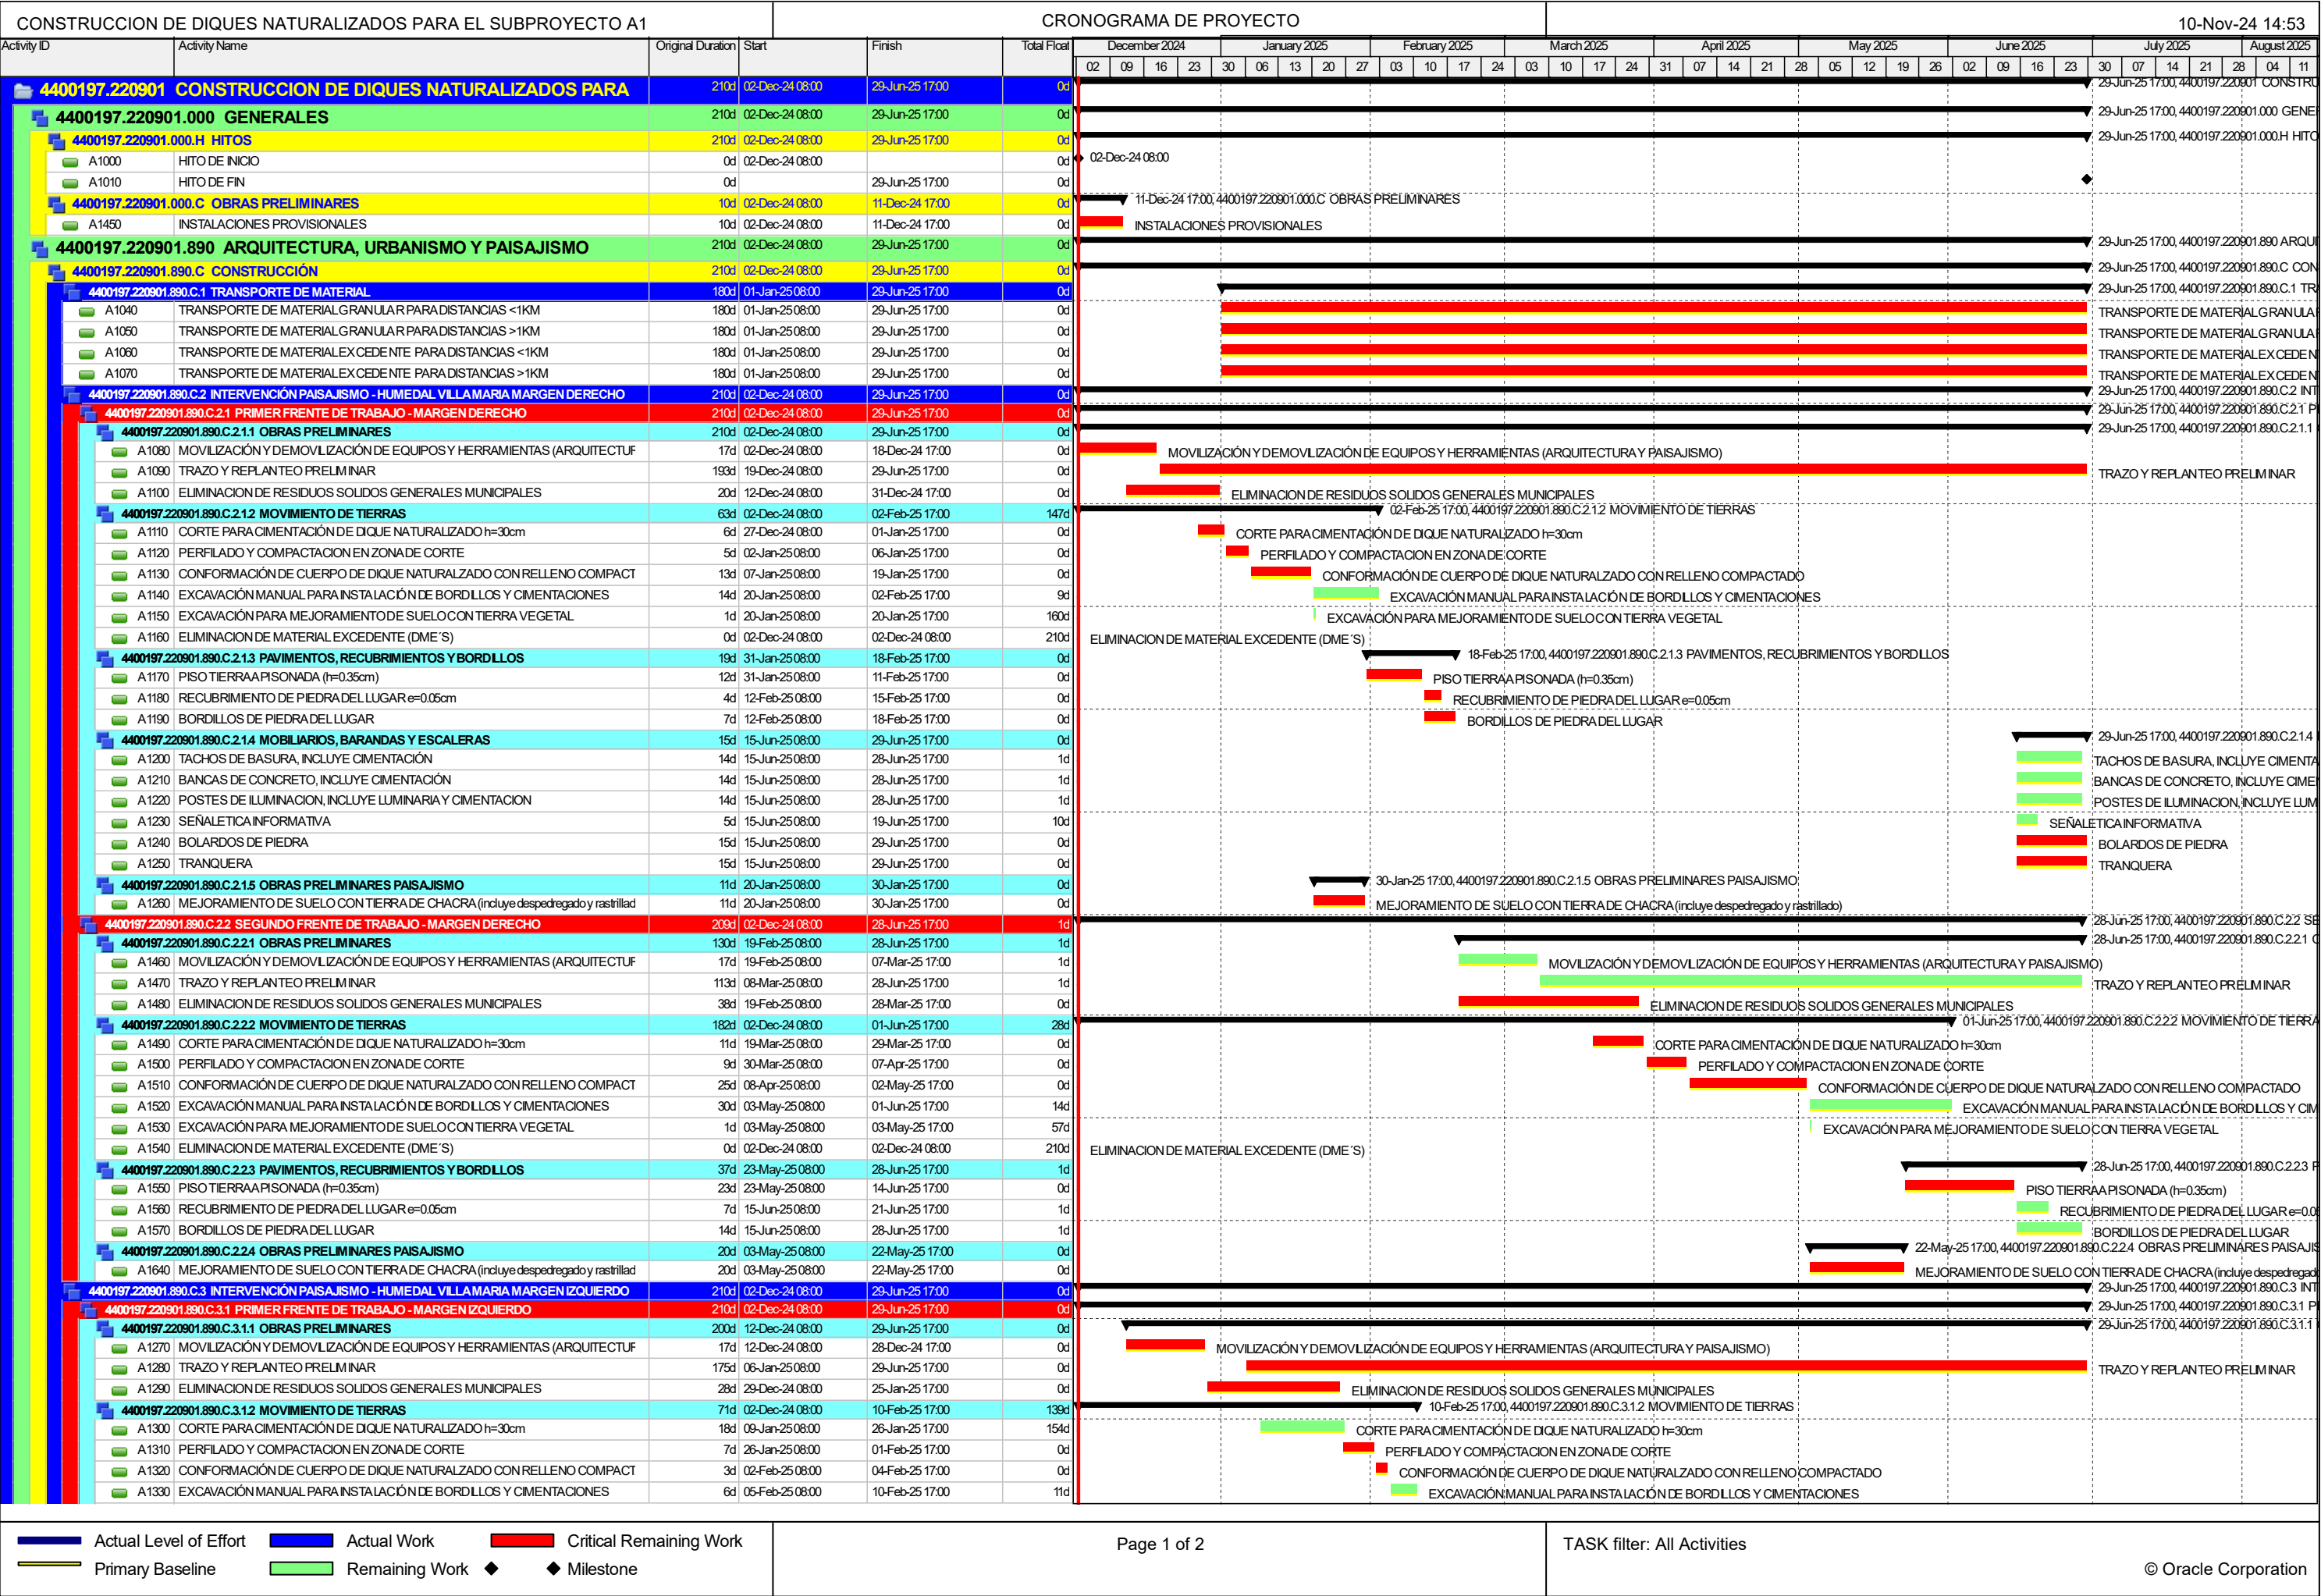

CONSTRUCCION DE DIQUES NATURALIZADOS PARA EL SUBPROYECTO A1						CRONOGRAMA DE PROYECTO												10-Nov-24 14:53																								
Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Total Float	December 2024				January 2025				February 2025				March 2025				April 2025				May 2025				June 2025				July 2025				August 2025				
						02	09	16	23	30	06	13	20	27	03	10	17	24	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11
	A 1340 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S)	0d	02-Dec-24 08:00	02-Dec-24 08:00	210d	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S)																																				
	4400197.220901.890.C.3.1.3 PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS	16d	16-Feb-25 08:00	03-Mar-25 17:00	118d																																					
	A 1350 PISO TIERRA A PISONADA (h=0.35cm)	6d	16-Feb-25 08:00	21-Feb-25 17:00	0d																																					
	A 1360 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	4d	22-Feb-25 08:00	25-Feb-25 17:00	124d																																					
	A 1370 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	10d	22-Feb-25 08:00	03-Mar-25 17:00	0d																																					
	4400197.220901.890.C.3.1.4 MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS	64d	27-Apr-25 08:00	29-Jun-25 17:00	0d																																					
	A 1380 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	25d	27-Apr-25 08:00	21-May-25 17:00	39d																																					
	A 1390 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	15d	27-Apr-25 08:00	11-May-25 17:00	49d																																					
	A 1400 POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN	25d	27-Apr-25 08:00	21-May-25 17:00	39d																																					
	A 1410 SEÑALÉTICA INFORMATIVA	10d	27-Apr-25 08:00	06-May-25 17:00	54d																																					
	A 1420 BOLARDOS DE PIEDRA	64d	27-Apr-25 08:00	29-Jun-25 17:00	0d																																					
	A 1430 TRANQUERA	15d	27-Apr-25 08:00	11-May-25 17:00	49d																																					
	4400197.220901.890.C.3.1.5 OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO	11d	05-Feb-25 08:00	15-Feb-25 17:00	0d																																					
	A 1440 MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado)	11d	05-Feb-25 08:00	15-Feb-25 17:00	0d																																					
	4400197.220901.890.C.3.2 SEGUNDO FRENTE DE TRABAJO - MARGEN IZQUIERDO	156d	02-Dec-24 08:00	06-May-25 17:00	54d																																					
	4400197.220901.890.C.3.2.1 OBRAS PRELIMINARES	64d	04-Mar-25 08:00	06-May-25 17:00	54d																																					
	A 1660 MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)	17d	04-Mar-25 08:00	20-Mar-25 17:00	54d																																					
	A 1660 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	47d	21-Mar-25 08:00	06-May-25 17:00	54d																																					
	A 1670 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERALES MUNICIPALES	28d	04-Mar-25 08:00	31-Mar-25 17:00	0d																																					
	4400197.220901.890.C.3.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS	137d	02-Dec-24 08:00	17-Apr-25 17:00	73d																																					
	A 1680 CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm	17d	01-Apr-25 08:00	17-Apr-25 17:00	3d																																					
	A 1690 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	7d	01-Apr-25 08:00	07-Apr-25 17:00	0d																																					
	A 1700 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALIZADO CON RELLENO COMPACTADO	2d	08-Apr-25 08:00	09-Apr-25 17:00	0d																																					
	A 1710 EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	6d	10-Apr-25 08:00	15-Apr-25 17:00	65d																																					
	A 1720 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S)	0d	02-Dec-24 08:00	02-Dec-24 08:00	210d	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S)																																				
	4400197.220901.890.C.3.2.3 PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS	16d	21-Apr-25 08:00	06-May-25 17:00	54d																																					
	A 1730 PISO TIERRA A PISONADA (h=0.35cm)	6d	21-Apr-25 08:00	26-Apr-25 17:00	0d																																					
	A 1740 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	3d	27-Apr-25 08:00	29-Apr-25 17:00	3d																																					
	A 1750 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	10d	27-Apr-25 08:00	06-May-25 17:00	54d																																					
	4400197.220901.890.C.3.2.4 OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO	11d	10-Apr-25 08:00	20-Apr-25 17:00	0d																																					
	A 1820 MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado)	11d	10-Apr-25 08:00	20-Apr-25 17:00	0d																																					
