

PROYECTO : "PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONTRATO : P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY
CODIGO DE PROYECTO : 2501291 **REGISTRO N° :** T1 - LB - AR - 101
UBICACIÓN : HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA **FECHA :** 25/08/2023
PLANO DE REFERENCIA : CO-PE-1PE406-GE-D-105-VAL-11-007 **PROGRESIVA :**
DESCRIPCIÓN GENERAL : 5.1 Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) - ACOPIO DE ROCA N°93 - TIPO D50=90 - TAYCA

INSPECCION TOPOGRAFICA

ITEM	DESCRIPCION TOPOGRAFICA	NOTAS	CONFORME	NO CONFORME
001	Marcos preliminares	Verificado	☒	☐
002	Línea base de topografía	Verificado	☒	☐
003	Nivelación de los Rellenos	N/A	☐	☐
004	Nivelación final de los Rellenos	N/A	☐	☐
005	Layout de estacas	Delimitado	☒	☐
006	Nivelación de la excavación	N/A	☐	☐
007	Nivelación final de la excavación	N/A	☐	☐
008	Niveles y geometría	Conforme	☒	☐
009	Revisión de limpieza y remoción	N/A	☐	☐
010	Verificación de equipo topográfico	Verificado	☒	☐
011	Certificado de Calibración	Conforme	☒	☐

OBSERVACIONES:

VOLUMEN: MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA 1
VOLUMEN ACTUAL: 1,120.21 m3


Ing. Pascual Covenas Silva
 JEFE DE TOPOGRAFIA
 CIP: 305278
 CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Rosada
 Perú

AREA:



HENRY ROJAS
 JEFE DE TOPOGRAFIA
 DEFENSAS RIBEREÑAS - CASMA HUARMEY

Subcontratista: Nombre:  Cargo: Hernán Ayulo Ll Fecha: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Firma: CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY OHLA Rosada Perú	Contratista: Nombre:  Cargo: OHILA Fecha: ING. JULIO BEDRAGAL DELGADO VALDIVIA Firma: INGENIERO RESIDENTE CIP: 213298 DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY	Supervisión ARCC: Nombre:  Cargo: GROBER DENES Fecha: RODRIGUEZ SALINAS Firma: INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 67445	Gerente de proyecto: Nombre:  Cargo:  Fecha:  Firma:  28/08/23 H. Ceballos
--	---	--	--

PROYECTO	:	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"		
CONTRATO	:	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		
CODIGO DE PROYECTO	:	2501291	REGISTRO N° :	T1 - LB - AR - 101
UBICACIÓN	:	HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA	FECHA :	25/08/2023
PLANO DE REFERENCIA	:	CO-PE-1PE406-GE-D-105-VAL-11-007	PROGRESIVA :	
DESCRIPCIÓN GENERAL	:	5.1 Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) - ACOPIO DE ROCA N°93 - TIPO D50=90 - TAYCA		

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:

ACOPIO N°93
D50=90
Vol= 1,120.21 m3

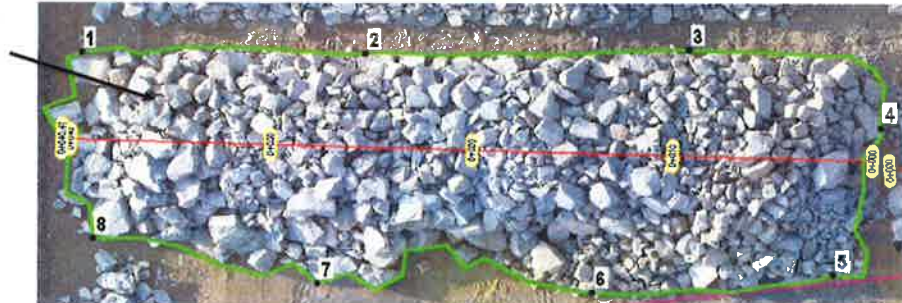[illegible]**OBSERVACIONES:**


MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA 1

VOLUMEN ACTUAL: 1,120.21 m3


Ing. Pascual Covenas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP. 306278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMAY
OHLA Pasada

HENRY JESER ROJAS
JES DE MPOBANA
DEFENDAS RIBERAS - CASAS INURAS

Subcontratista:	Contratista:	Supervisión ARCC:	Gerente de proyecto:
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:	Cargo:
Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:

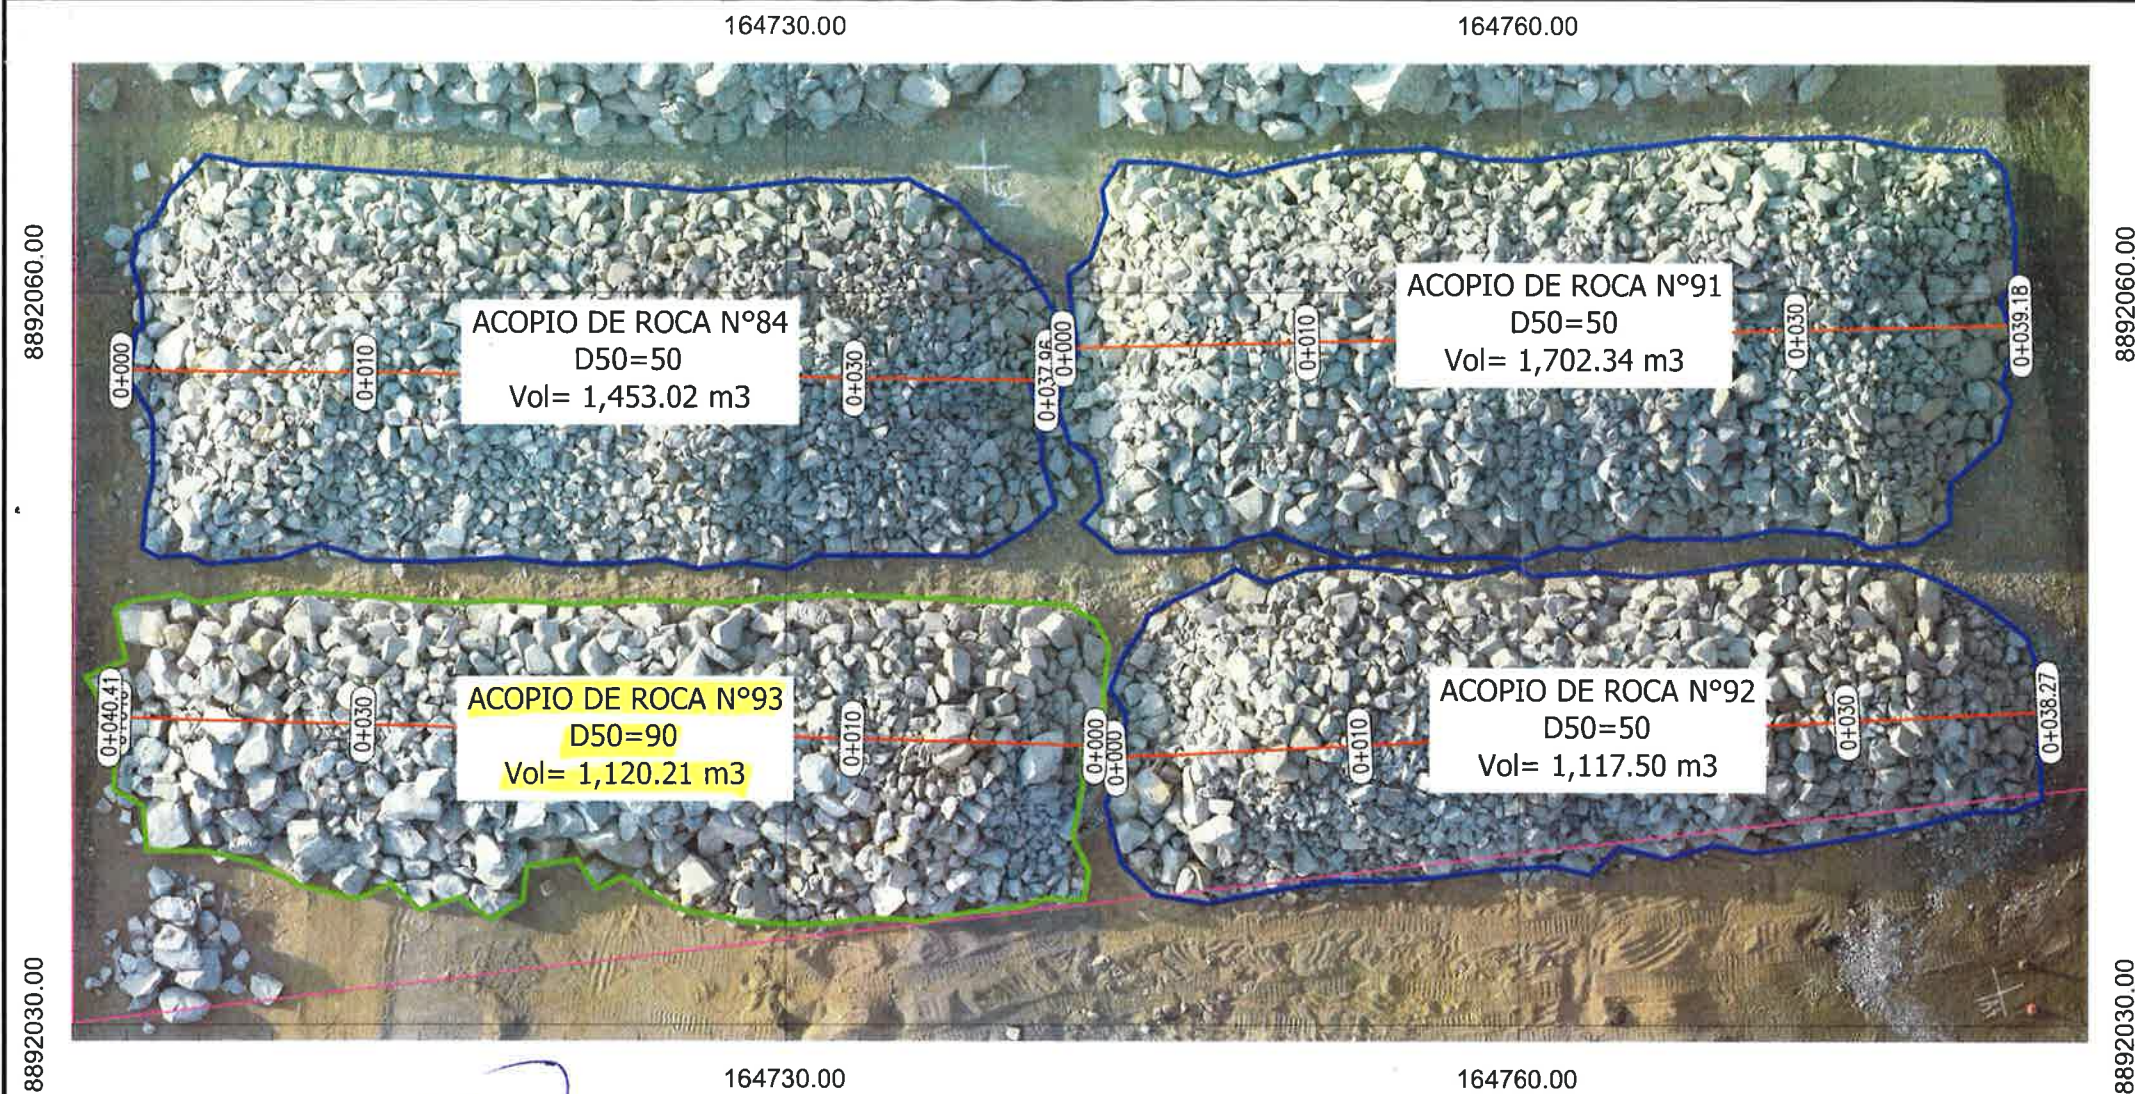


VISTA EN PLANTA – ACOPIO DE ROCA N°84, N°91, N°92 y N°93– Plataforma N°9
ESC:1/250




PROGRESIVA	0+000	0+010	0+020	0+030
COTA TERRENO	110.22	110.07	109.85	109.80
COTA RASANTE	110.22	110.07	109.85	109.80
ALTURA DE ACOPIO		4.6	3.3	4.1

PERFIL LONGITUDINAL – ACOPIO N°84
ESC:1/500




PROGRESIVA	0+000	0+010	0+020	0+030
COTA TERRENO	109.89	109.77	109.70	109.60
COTA RASANTE	109.89	109.77	109.70	109.60
ALTURA DE ACOPIO		5.3	4.7	3.7

PERFIL LONGITUDINAL – ACOPIO N°91
ESC:1/500



PROGRESIVA	0+000	0+010	0+020	0+030
COTA TERRENO	109.54	109.51	109.37	109.09
COTA RASANTE	109.54	109.51	109.37	109.09
ALTURA DE ACOPIO		4.7	4.2	3.7

PERFIL LONGITUDINAL – ACOPIO N°92
ESC:1/500



PROGRESIVA	0+000	0+010	0+020	0+030
COTA TERRENO	109.54	109.51	109.37	109.09
COTA RASANTE	109.54	109.51	109.37	109.09
ALTURA DE ACOPIO		3.9	3.2	3.0

PERFIL LONGITUDINAL – ACOPIO N°93
ESC:1/500

VOLUMEN EN ACOPIO N°84 - TAYCA					
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
5.1	Cerrado	Selección y Acopio de Roca (Acuerdo al diseño y por Tipo)	D50=50	m3	1,453.02
TOTAL					1,453.02

VOLUMEN EN ACOPIO N°91 - TAYCA					
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
5.1	Cerrado	Selección y Acopio de Roca (Acuerdo al diseño y por Tipo)	D50=50	m3	1,702.34
TOTAL					1,702.34

VOLUMEN EN ACOPIO N°92 - TAYCA					
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
5.1	Cerrado	Selección y Acopio de Roca (Acuerdo al diseño y por Tipo)	D50=50	m3	1,117.50
TOTAL					1,117.50


VOLUMEN EN ACOPIO N°93 - TAYCA					
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
5.1	Cerrado	Selección y Acopio de Roca (Acuerdo al diseño y por Tipo)	D50=90	m3	1,120.21
TOTAL					1,120.21

HENRY JAVIER ROJAS
JEFE DE TOPOGRAFIA
DEFENSAS RIBEREÑAS - CASMA - HUARMAY

Hernán Ayulo Ll
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMAY
OHLA Pasada

Ing. Pascual Coveñas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP - 306278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMAY
OHLA Pasada

GROBER DENES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP-13-0-0445

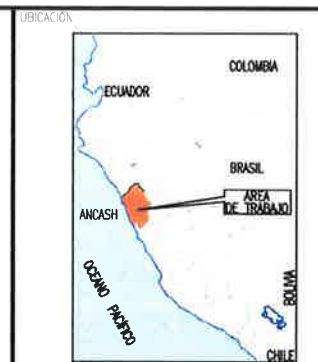

PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION DE LA REVISIÓN	REVISADO	DIRECTOR
DISEÑO	25.08.2023			
DIBUJO	25.08.2023			
REVISIÓN	25.08.2023			
APROBACIÓN	25.08.2023			
DIRECTOR DE PROYECTO	25.08.2023			

CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMAY
OHLA Pasada

PERU
Presidencia del Consejo de Ministros

RECONSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA
Y HUARMAY (PAQUETE 4)"

PLANO
PLATAFORMA N°9
ACOPIO DE ROCA N°84,91~93
TAYCA

ESPECIALIDAD :
TOPOGRAFIA

USO :
GENERAL

ZONA :
RIO HUERMAY-HUARMAY-ANCAH

ESCALA :
INDICADAS

FECHA :
25.08.2023

REV :
R00

CODIGO DEL PLANO :
CO-PE-1PE406-GE-D-105-VAL-11-007

PROYECTO/PAQUETE: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA HUARMEY" REFERENCIA NPI: H-041

SUBCONTRATO: P1 - OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY FECHA: 16/08/2023

CUI: 2501291 CODIGO DE SUBCONTRATISTA: 1PE406

UBICACIÓN: CANTERA TAYCA 1 N° REGISTRO: TAYCA-1_D90 N° 081

INSPECCIONADO POR: ING. JHONATAN JOSMELL CELIS CRISTOBAL PAGINA: 1 DE 1

ROCA SELECCIONADA TAMAÑO DIAMETRO NOMINAL D50 ☐ 50 ☒ 90

PROCEDENCIA/CANTERA CANTERA TAYCA 1

MÉTODO DE EXPLOTACIÓN VOLADURA

Jhonatan Josmell Celis Cristóbal JEFE DE CALIDAD - OBRA Carlos J. Portocarrero Contreras SUPERVISOR DE CALIDAD miércoles, 16 de Agosto de 2023

CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY LUGAR DE INSPECCIÓN CASMA Y HUARMEY CANTERA ☒ ACOPIO N° 93 - Ensayo N° 01

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
ROCA SOLIDA Y NO DELEZNABLE SIN SEÑALES DE METEORIZACIÓN, DESCOMPOSICIÓN O GRIETAS	☒		
DIAMETROS DE ROCA SEGÚN PARAMETROS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	☒		
REQUISITOS DE CALIDAD (ENSAYOS) CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	☒		


Lizbeth M. Rojas Trinidad SUPERVISOR DE CALIDAD CIP 230478

Reporte Fotográfico

Registro N° TAYCA-1_D90 N° 081



REVISADO Y APROBADO POR

SUBCONTRATISTA:	CONTRATISTA:	SUPERVISOR DE CALIDAD:	GERENTE DE PROYECTO:
Nombre:  Fecha: 16/08/23 Firma: 16/08/23	Nombre:  Fecha: 16/08/23 Firma: 16/08/23	Nombre:  Fecha: 22/08/23 Firma: 22/08/23	Nombre:  Fecha: 22/08/23 Firma: 22/08/23
