

PROYECTO : "PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONTRATO : P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY
CODIGO DE PROYECTO : 2501291 **REGISTRO N° :** T1 - LB - AR - 107
UBICACIÓN : HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA **FECHA :** 20/10/2023
PLANO DE REFERENCIA : CO-PE-1PE406-GE-D-128-VAL-13-005 **PROGRESIVA :**
DESCRIPCIÓN GENERAL : 5.1 Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) - ACOPIO DE ROCA N°99 - TIPO D50=50 - TAYCA

INSPECCION TOPOGRAFICA

ITEM	DESCRIPCION TOPOGRAFICA	NOTAS	CONFORME	NO CONFORME
001	Marcos preliminares	Verificado	☒	☐
002	Línea base de topografía	Verificado	☒	☐
003	Nivelación de los Rellenos	N/A	☐	☐
004	Nivelación final de los Rellenos	N/A	☐	☐
005	Layout de estacas	Delimitado	☒	☐
006	Nivelación de la excavación	N/A	☐	☐
007	Nivelación final de la excavación	N/A	☐	☐
008	Niveles y geometría	Conforme	☒	☐
009	Revisión de limpieza y remoción	N/A	☐	☐
010	Verificación de equipo topográfico	Verificado	☒	☐
011	Certificado de Calibración	Conforme	☒	☐

OBSERVACIONES:

VOLUMEN: MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA 1

VOLUMEN ACTUAL: 4,530.92 m3

AREA:


 Ing. Pascual Coveñas Silva
 JEFE DE TOPOGRAFIA
 GIP. 308278
 CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
 OHLA Rosada
 26-10-23

Subcontratista:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Ing. Fernando Emilio Fuentes Fernandez
 CIP: 141122
 RESIDENTE DE OBRA
 CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
 OHLA Rosada

Contratista:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

JEFFERSON DAVID ZULOETA SANCHEZ
 JEFE DE PRODUCCION
 CIP 138325

Supervisión ARCC:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

ROGER DENES
 RODRIGUEZ SALINAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg: CIP N° 67445

Gerente de proyecto:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma:

Marco Cobane
 21/10/23

PROYECTO : "PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONTRATO : P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY

CODIGO DE PROYECTO : 2501291 REGISTRO N° : T1 - LB - AR - 107

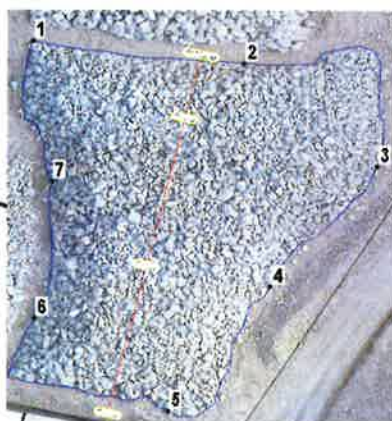
UBICACIÓN : HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA FECHA : 20/10/2023

PLANO DE REFERENCIA : CO-PE-1PE406-GE-D-128-VAL-13-005 PROGRESIVA :

DESCRIPCIÓN GENERAL : 5.1 Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) - ACOPIO DE ROCA N°99 - TIPO D50=50 - TAYCA

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:

ACOPIO N°99
D50=50
Vol= 4,530.92 m3





N° PUNTO	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION ANTERIOR	ELEVACION NIVEL ANTERIOR	FECHA DE INSPECCION ACTUAL	ELEVACION NIVEL ACTUAL	DIFERENCIA
	NORTE	ESTE					
001	8892014.720	164752.260				109.000	
002	8892011.800	164777.140				108.790	
003	8891998.250	164792.840				108.650	
004	8891982.380	164780.270				108.680	
005	8891965.950	164768.270				108.700	
006	8891978.160	164752.420				108.920	
007	8891996.240	164754.470				109.150	

OBSERVACIONES:

MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA 1

VOLUMEN ACTUAL: 4,530.92 m3

OHLA
Ing. Pascual Coveñas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP: 306278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Rosada
26-10-23

Subcontratista:	Contratista:	Supervisión ARCO:	Gerente de proyecto:
Nombre: 	Nombre: 	Nombre: 	Nombre: Marco Cabano
Cargo: 	Cargo: JEFE DE PRODUCCION	Cargo: INGENIERO CIVIL	Cargo: 21/10/23
Fecha: 20/10/23	Fecha: 20/10/23	Fecha: 20/10/23	Fecha: 20/10/23
Firma: 	Firma: 	Firma: 	Firma: 

Ing. Fernando Emilio Fuentes Fernandez
CIP: 141122
Firma: RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA HUARMEY
OHLA Rosada

164720.00

164800.00

PLATAFORMA
N°10

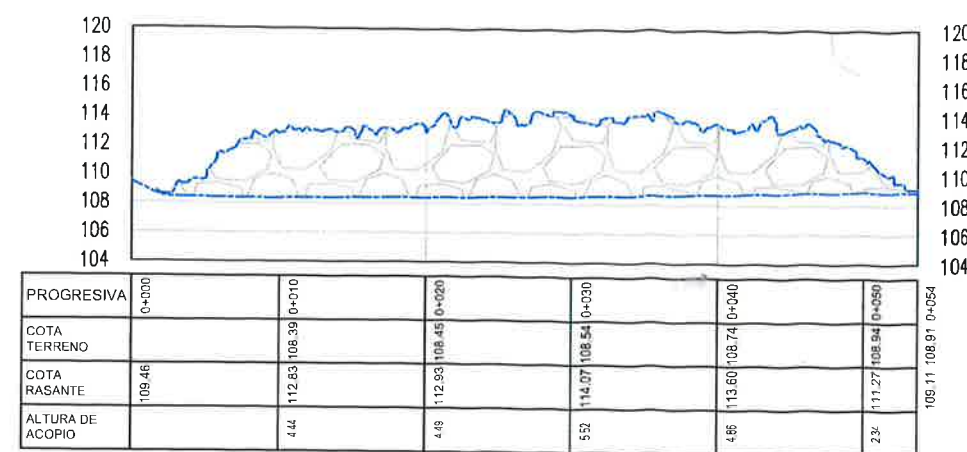
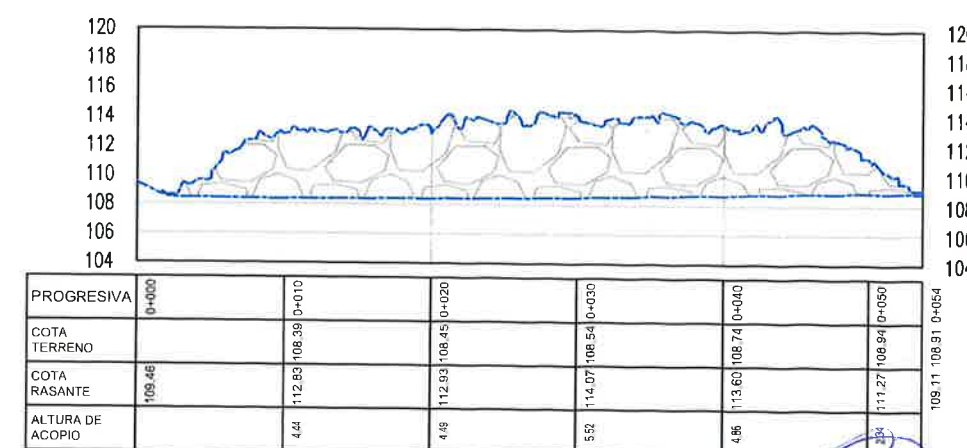
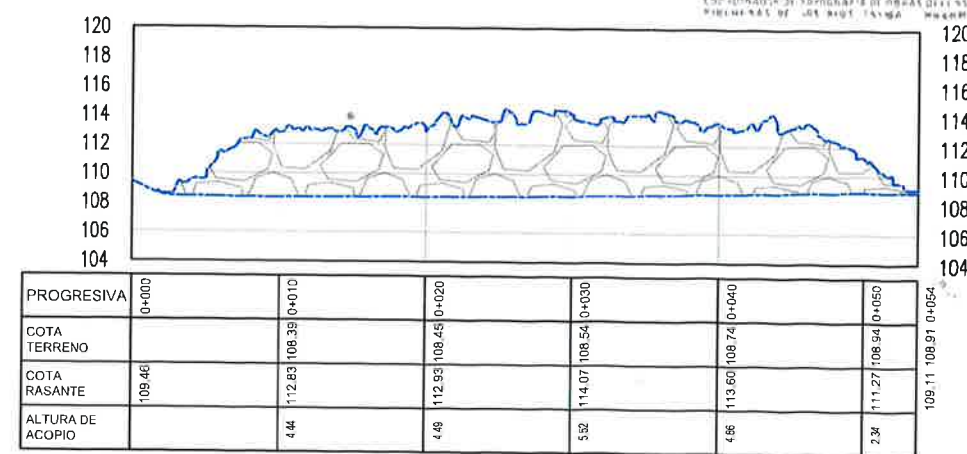
164720.00

PLANTA GENERAL ACOPIO 98~100 - TAYCA
ESC:1/500

VOLUMEN EN ACOPIO N°98 - TAYCA					
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
5.1	Cerrado	Selección y Acopio de Roca (Acuerdo al diseño y por tipo)	D50=50	m3	4,148.06
Total					4,148.06

VOLUMEN EN ACOPIO N°99 - TAYCA					
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
5.1	Cerrado	Selección y Acopio de Roca (Acuerdo al diseño y por tipo)	D50=50	m3	4,530.92
Total					4,530.92

VOLUMEN EN ACOPIO N°100 - TAYCA					
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
5.1	Cerrado	Selección y Acopio de Roca (Acuerdo al diseño y por tipo)	D50=90	m3	1,870.48
Total					1,870.48

PERFIL LONGITUDINAL - ACOPIO 98 D50
ESC:1/500PERFIL LONGITUDINAL - ACOPIO 99 D50
ESC:1/500PERFIL LONGITUDINAL - ACOPIO 100 D90
ESC:1/500

JEFFERSON DAVID ZULOETA SÁNCHEZ
JEFE DE PRODUCCIÓN
CIP 138325

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	ELABORADO	DIRECTOR
01	20.10.2023	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH	
02	20.10.2023	REVISIÓN	Max. Huamani	
03	20.10.2023	APROBACIÓN	Fernando Fuentes	
04	20.10.2023	DIRECTOR DE PROYECTO	José Cabello	

CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMAY

OHLA Posada

PERU Presidencia
del Consejo de MinistrosRECONSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA
Y HUARMAY (PAQUETE 4)"

"OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA
DE ROCA CUENCA HUARMAY"

PLANO
PLANTA GENERAL
ACOPIO 98~100
TAYCA

ESPECIALIDAD:
TOPOGRAFÍAUSO:
GENERAL

RÍO HUARMAY-HUARMAY-ANCASH
FECHA: 20.10.2023
REV: R00

CÓDIGO DEL PLANO:
CO-PE-IPE406-GE-D-128-VAL-13-005

Ing. Pascual Covenas Silva
JEFE DE TOPOGRAFÍA
CIP: 305378
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMAY
OHLA Posada

Ing. Fernando Emilio Fuentes Fernández
CIP: 141022
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMAY
OHLA Posada

PROYECTO/PAQUETE: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY" REFERENCIA NPI: H-048
SUBCONTRATO: P1: OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY FECHA: 4/10/2023
CUI: 2501291 CODIGO DE SUBCONTRATISTA: 1PE406
UBICACIÓN: CANTERA TAYCA 1 N° REGISTRO: RM-TAYCA 1 N° 160
MUESTREADO POR: ING. JHONATAN JOSMELL CELIS CRISTOBAL PAGINA: 1 DE 1

PROCEDENCIA/CANTERA

TAYCA 1

LUGAR DE MUESTREO

☐ CANTERA

☒ ACOPIO

Acopio N° 99 - Tipo D50=50 - Ensayo N° 01

COORDENADAS (solo aplica para muestras tomadas en cantera)

ESTE: -

NORTE: -

COTA: -

msnm

Jhonatan Josmell Celis Cristóbal
JEFE DE CALIDAD - OBRA
CIP: 201818
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Pasada

DESCRIPCIÓN DE ENSAYOS A REALIZAR

MUESTRA N° 161:

1.- Resistencia a la degradación en agregados gruesos de tamaño grande por Abrasión e Impacto en la Máquina de los Angeles.

2.- Gravedad Especifica, Absorción y Porosidad de la Roca

Carlos J. Portocarrero Contreras
SUPERVISOR DE CALIDAD
DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIOS
CASMA Y HUARMEY

Elmer Bertrando Cama
COORDINADOR DE CALIDAD CIP 274124
DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY

LABORATORIO DONDE SE REALIZARAN LOS ENSAYOS

LABORATORIO GEOTECNICO - RUMI

Reporte Fotográfico



REVISADO Y APROBADO POR

SUBCONTRATISTA:

CONTRATISTA:

SUPERVISOR DE CALIDAD

GERENTE DE PROYECTO:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Firma: Fernando Emilio Fuentes Fernandez
CIP: 144122

Firma: Alan O. Castillo Arevalo
CIP: 103307

Firma: ARTURO PICON MONTOYA
SUPERVISOR DE CALIDAD Y SSOMA
REG. CIP 061259

Firma: Marco Pichardo

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA HUARMEY
OHLA Pasada

ESPECIALISTA DE CALIDAD CIP 103307
DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY

FECHA: 05/10/23

FECHA: 16/10/23

04-10-23

04-10-23
