

PROYECTO : "PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONTRATO : P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY
CODIGO DE PROYECTO : 2501291 **REGISTRO N° :** T1-LB-AR-109
UBICACIÓN : HUARMEY - CANTERA TAYCA **FECHA :** 25/10/2023
PLANO DE REFERENCIA : CO-PE-1PE406-GE-D-133-VAL-13-010 **PROGRESIVA :**
DESCRIPCIÓN GENERAL : 5.1 Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) - ACOPIO DE ROCA N°101 - TIPO D50=50 - TAYCA

INSPECCION TOPOGRAFICA

ITEM	DESCRIPCION TOPOGRAFICA	NOTAS	CONFORME	NO CONFORME
001	Marcos preliminares	Verificado	☒	☐
002	Línea base de topografía	Verificado	☒	☐
003	Nivelación de los Rellenos	N/A	☐	☐
004	Nivelación final de los Rellenos	N/A	☐	☐
005	Layout de estacas	Delimitado	☒	☐
006	Nivelación de la excavación	N/A	☐	☐
007	Nivelación final de la excavación	N/A	☐	☐
008	Niveles y geometría	Conforme	☒	☐
009	Revisión de limpieza y remoción	N/A	☐	☐
010	Verificación de equipo topográfico	Verificado	☒	☐
011	Certificado de Calibración	Conforme	☒	☐

OBSERVACIONES:

EL METODO DE MEDICION EMPLEADO ES POR DIFERENCIA DE SUPERFICIE - DROW.

VOLUMEN:

MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA

VOLUMEN ACTUAL: 1,835.92 m3

AREA:

Ing. Pascual Coveñas Silva
 JEFE DE TOPOGRAFIA
 CIP. 306278
 CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
 OHLA Pasada

OHLA
 C. JESUS OCHOA ROGER CORA CORAQUIRA
 COORDINADOR DE TOPOGRAFIA DE OBRAS DEFENSAS
 RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA - HUARMEY
 26-10-23

Subcontratista:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Ing. Fernando Emilio Fuentes Fernandez
 CIP: 141122
 RESIDENTE DE OBRA
 CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA HUARMEY
 OHLA Pasada

Contratista:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

JEFFERSON DAVID ZULOETA SANCHEZ
 JEFE DE PRODUCCION
 CIP 138325

Supervisión ARCC:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

GROBER DENES
 RODRIGUEZ SALINAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg: CIP N° 67445

Gerente de proyecto:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma:

Hasto abanco
 31/10/23


PROYECTO	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"		
CONTRATO	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		
CODIGO DE PROYECTO	2501291	REGISTRO N° :	T1-LB-AR-109
UBICACIÓN	HUARMEY - CANTERA TAYCA	FECHA :	25/10/2023
PLANO DE REFERENCIA	CO-PE-1PE406-GE-D-133-VAL-13-010	PROGRESIVA :	
DESCRIPCIÓN GENERAL	5.1 Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) - ACOPIO DE ROCA N°101 - TIPO D50=50 - TAYCA		

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:

ACOPIO N°101
D50=50
Vol= 1.835.92 m3

[illegible]**OBSERVACIONES:**

MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA

VOLUMEN ACTUAL: 1,835.92 m3

76-10-23

Ing. Pascual Covenas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP. 306278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUAMANGA
A OHLA Rosada

Subcontratista:

Nombre:

Cargo: In

Fecha: 01/05/2017

Firma:

Contratista:	
--------------	--

Nombre:

Gardco

Fechner

Firma:

Supervisión ARCC

Nombre*

Cargo®

Fecha:

Firma:

Gerente de proyecto:

Nombre

Cargo:

Fecha: / /


Firma _____

164740.00 164760.00



164760.00


PLANTA GENERAL ACOPIO N°101 – TAYCA
ESC:1/200

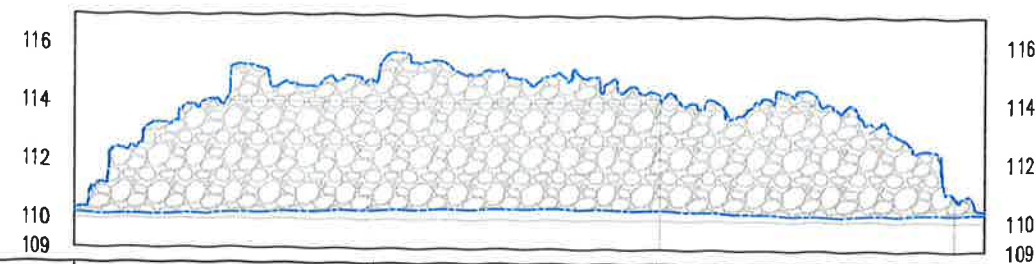

PROGRESIVA	0+000	0+010	0+020	0+030	0+031
COTA TERRENO	110.21	110.32	110.33	110.26	110.28
COTA RASANTE	110.37	114.78	114.15	110.86	110.39
ALTURA DE ACOPIO		4.46	3.82	0.80	

PERFIL LONGITUDINAL – ACOPIO N°101 D50=50
ESC:1/250

VOLUMEN EN ACOPIO N°101 - TAYCA					
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
5.1	Cerrado	Selección y Acopio de Roca (Acuerdo al diseño y por tipo)	D50=50	m3	1,835.92
				Total	1,835.92



OHILA
JEFFERSON DAVID ZULOETA SÁNCHEZ
JEFE DE PRODUCCIÓN
CIP 138325

R00	25.10.23	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH
REV N	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	REVISADO POR
		FECHA	FIRMA
DISEÑO :		25.10.2023	Leto
Pascual Coveñas			
DIBUJO :		25.10.2023	PH
Peter Marcelo			
REVISIÓN :		25.10.2023	
Max Huaman			
APROBACIÓN :		25.10.2023	PH
Fernando Fuentes			
DIRECTOR DE PROYECTO :		25.10.2023	
José Cabello			

CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY

OHILA Posada
Perú

Ing. Fernando Emilio Fuentes Fernández
CIP: 141122
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY
OHILA Posada
Perú

PERÚ Presidencia
del Consejo de Ministros

RECONSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA
Y HUARMEY (PAQUETE 4)"

"OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA
DE ROCA CUENCA HUARMEY"

PLANO
PLANTA GENERAL
ACOPIO N°101
TAYCA

ESPECIALIDAD :
TOPOGRAFÍA

USO :
GENERAL

ZONA:
RÍO HUARMEY-HUARMEY-ANCASH

ESCALA :
INDICADAS

FECHA :
25.10.2023

REV :
R00

CODIGO DEL PLANO :
CO-PE-1PE406-GE-D-133-VAL-13-010

8892100.00

8892080.00

8892100.00

8892080.00

DA:\PETER MCHUARMEY\1.- CANTERA TAYCA\2.-ACOPIOS\VALORACION N°13\ACOPIO 101\VOLUMEN ACOPIOS DEL 101.DWG

CO-PE-1PE406-GE-D-133-VAL-13-010

PROYECTO/PAQUETE: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY" REFERENCIA NPI: H-050
SUBCONTRATO: P1: OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY FECHA: 17/10/2023
CUI: 2501291 CODIGO DE SUBCONTRATISTA: 1PE406
UBICACIÓN: CANTERA TAYCA 1 N° REGISTRO: RM-TAYCA 1 N° 165
MUESTREADO POR: ING. JHONATAN JOSMELL CELIS CRISTOBAL PAGINA: 1 DE 1

PROCEDENCIA/CANTERA

TAYCA 1

LUGAR DE MUESTREO

☐ CANTERA

☒ ACOPIO

Acopio N° 101 - Tipo D50=50 - Ensayo N° 01

COORDENADAS (solo aplica para muestras tomadas en cantera)

ESTE: -

NORTE: -

COTA: -

msnm

Jhonatan Josmell Celis Cristóbal
JEFE DE CALIDAD - OBRA

DESCRIPCIÓN DE ENSAYOS A REALIZAR

MUESTRA N° 166:

CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Rosada

1.- Resistencia a la degradación en agregados gruesos de tamaño grande por Abrasión e Impacto en la Máquina de los Angeles.

2.- Gravedad Específica, Absorción y Porosidad de la Roca

Carlos J. Portocarrero Contreras
SUPERVISOR DE CALIDAD

Lizbeth M. Rojas Trinidad
SUPERVISOR DE CALIDAD CIP 238476

LABORATORIO DONDE SE REALIZARAN LOS ENSAYOS

LABORATORIO GEOTECNICO - RUMI

Reporte Fotográfico



REVISADO Y APROBADO POR

SUBCONTRATISTA:

CONTRATISTA:

SUPERVISOR DE CALIDAD

GERENTE DE PROYECTO:

Nombre: Ing. Fernando Emilio Fuentes Fernandez

Nombre: OHLA

Nombre: Arturo Picon Montoya

Nombre: Marco Cármon

Fecha: 17-10-23

Fecha: 17-10-23

Fecha: 18/10/23

Fecha: 18/10/23

Firma: 17-10-23

Firma: 17-10-23

Firma: 18/10/23

Firma: 18/10/23
