

PROYECTO : "PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONTRATO : P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY
CODIGO DE PROYECTO : 2501291 **REGISTRO N°** : T1-LB-AR-116
UBICACIÓN : HUARMEY - CANTERA TAYCA **FECHA** : 23/11/2023
PLANO DE REFERENCIA : CO-PE-1PE406-GE-D-148-VAL-14-007 **PROGRESIVA** :
DESCRIPCIÓN GENERAL : 5.1 Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) - ACOPIO DE ROCA N°108 - TIPO D50=50 - TAYCA

INSPECCIÓN TOPOGRAFICA

ITEM	DESCRIPCION TOPOGRAFICA	NOTAS	CONFORME	NO CONFORME
001	Marcos preliminares	Verificado	☒	☐
002	Línea base de topografía	Verificado	☒	☐
003	Nivelación de los Rellenos	N/A	☐	☐
004	Nivelación final de los Rellenos	N/A	☐	☐
005	Layout de estacas	Delimitado	☒	☐
006	Nivelación de la excavación	N/A	☐	☐
007	Nivelación final de la excavación	N/A	☐	☐
008	Niveles y geometría	Conforme	☒	☐
009	Revisión de limpieza y remoción	N/A	☐	☐
010	Verificación de equipo topográfico	Verificado	☒	☐
011	Certificado de Calibración	Conforme	☒	☐

OBSERVACIONES: El método de medición empleado es por diferencia de alturas - BWN

VOLUMEN: MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA

VOLUMEN ACTUAL: 3,750.73 m³

AREA:

Ing. Pascual Covenas Silva
 JEFE DE TOPOGRAFIA
 CIP: 306278
 CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
 OHLA Pasada

OHLA

CHRISTOPHER POZO CORDA COPIADURA
 LUBRICACION DE EQUIPOS DE TRABAJO
 SERVICIOS DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO

Subcontratista:

Nombre:

Cargo:

Ing. Fernando Emilio Fuentes Fernandez
 CIP: 141122
 RESIDENTE DE OBRA
 CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
 OHLA Pasada

Contratista:

Nombre:

Cargo:

OHLA
 JEFFERSON DAVID ZULOETA SANCHEZ
 JEFE DE PRODUCCION
 CIP 188325

Supervisión ARCC:

Nombre:

Cargo:

GILBERTO DENES
 RODRIGUEZ SALINAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg: CIP N° 67445

Gerente de proyecto:

Nombre:

Cargo:


Fecha:

Firma:

Marco Antonio Zulueta

PROYECTO	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"		
CONTRATO	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		
CODIGO DE PROYECTO	2501291	REGISTRO N° :	T1-LB-AR-116
UBICACIÓN	HUARMEY - CANTERA TAYCA	FECHA :	23/11/2023
PLANO DE REFERENCIA	CO-PE-1PE406-GE-D-148-VAL-14-007	PROGRESIVA :	
DESCRIPCIÓN GENERAL	5.1 Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) - ACOPIO DE ROCA N°108 - TIPO D50=50 - TAYCA		

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:

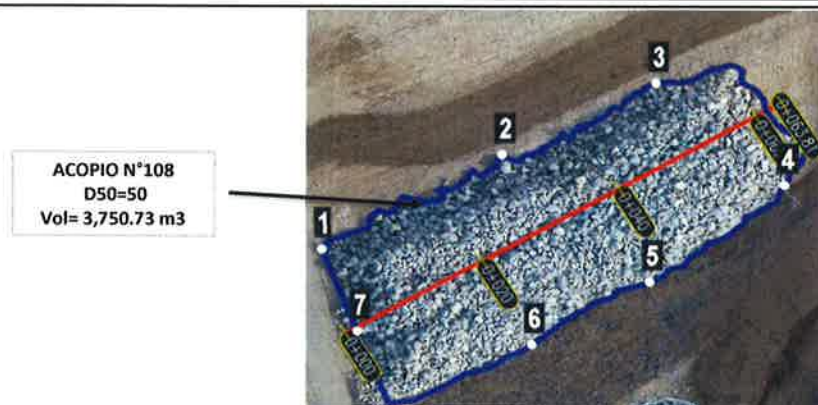[illegible]**OBSERVACIONES:**

MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA

VOLUMEN ACTUAL: 3,750.73 m3

CRIS: 00150 PAPER CODA (COMMITTEE)
A COMMITTEE OF THE BOARD OF THE PARAS OFFICE

Ing. Pascual Covenas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP. 308278
CONSORCIO CANTARRAS RIOS CASABA - HUARAITI
CHLA Pasada

Subcontratista:	Contratista:	Supervisión ARCC:	Gerente de proyecto:
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Ing. Fernando Emilio Fuentes Fernandez			
Cargo:	Cargo:	Cargo:	Cargo:
RESIDENTE DE OBRA	JEFE DE PRODUCCIÓN	INGENIERO CIVIL	
FEEDBACK CONSULTING S.R.L.	JEFE DE PRODUCCIÓN	INGENIERO CIVIL	
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:

PROYECTO/PAQUETE: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY" REFERENCIA NPI: H-054
SUBCONTRATO: P1: OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY FECHA: 18/11/2023
CUI: 2501291 CODIGO DE SUBCONTRATISTA: 1PE408
UBICACIÓN: CANTERA TAYCA 1 N° REGISTRO: RM-TAYCA 1 N° 179
MUESTREADO POR: ING. JHONATAN JOSMELL CELIS CRISTOBAL PAGINA: 1 DE 1

PROCEDENCIA/CANTERA

TAYCA 1

LUGAR DE MUESTREO

☐ CANTERA

☒ ACOPIO

Acopio N° 108 - Tipo D50=50 - Ensayo N° 01

COORDENADAS (solo aplica para muestras tomadas en cantera)

ESTE:

-

NORTE:

-

COTA:

- msnm -

DESCRIPCIÓN DE ENSAYOS A REALIZAR

MUESTRA N° 180:

Jhonatan Josmell Celis Cristóbal
JEFE DE CALIDAD - OBRA
CIP 201818
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY

1.- Resistencia a la degradación en agregados gruesos de tamaño grande por Abrasión e Impacto en la Máquina de los Angeles.


2.- Gravedad Específica, Absorción y Porosidad de la Roca

OHILA
Eliomar Berrospi Camá
COORDINADOR DE CALIDAD
DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY

LABORATORIO DONDE SE REALIZARAN LOS ENSAYOS

LABORATORIO GEOTECNICO - RUMI

Reporte Fotográfico

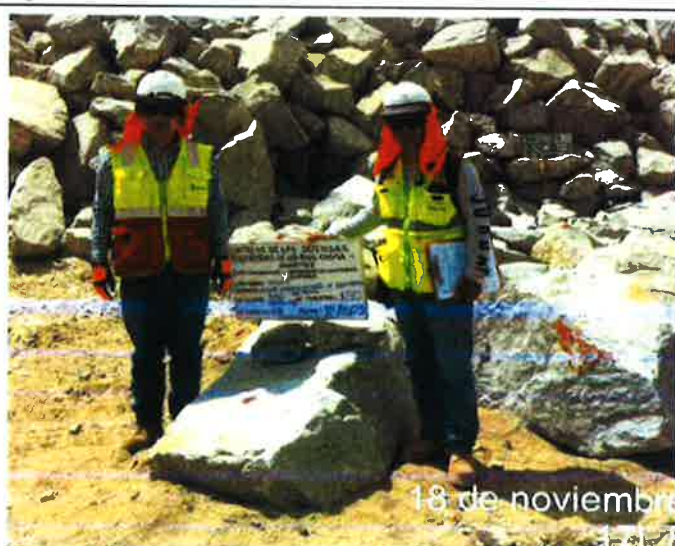

REVISADO Y APROBADO POR

SUBCONTRATISTA:

CONTRATISTA:

SUPERVISOR DE CALIDAD

GERENTE DE PROYECTO:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

18/11/23

21-11-23

21-11-23

Marco Cerezo 25/11/23

164650.00


164700.00



164650.00

164700.00

PLANTA GENERAL ACOPIO N°108 – PLATAFORMA N°2 – TAYCA
ESC:1/250

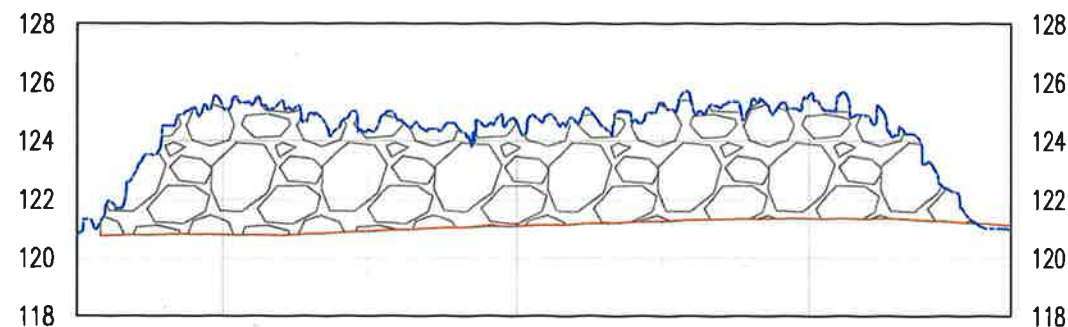

PROGRESIVA	0+000	0+010	0+020	0+030	0+040	0+050	0+060	0+064
COTA TERRENO		120.78	120.90	121.08	121.25	121.34	121.22	121.11
COTA RASANTE	120.81	125.15	124.38	124.66	125.30	125.59	122.25	120.97
ALTURA DE RELLENO		4.37	3.48	3.58	4.05	4.25	1.03	

PERFIL LONGITUDINAL – ACOPIO 108 D50
ESC:1/200

VOLUMEN EN ACOPIO N°108 - TAYCA

Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
5.1	Cerrado	Selección y Acopio de Roca (Acuerdo al diseño y por tipo)	D50=90	m3	3,750.73
Total					3,750.73

UBICACIÓN



R.O. 11.2023

REV. N° FECHA DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN REVISADO DIRECTOR

FECHA FIRMA

DISEÑO: Pascual Coveñas 23.11.2023

DIBUJO: Peter Marcelo 23.11.2023

REVISIÓN: Max Huaman 23.11.2023

APROBACIÓN: Fernando Fuentes 23.11.2023

REVISOR DE PROYECTO: Cabello 23.11.2023

JEFE DE PRODUCCIÓN
CIP 138325

CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMY

OHLA Pasada
Perú

Ing. Fernando Emilio Fuentes Fernandez
CIP: 141122
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMY

PERU Presidencia
del Consejo de Ministros

RECONSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS

Ing. Pascual Coveñas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP: 305278
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMY

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA
Y HUARMY (PAQUETE 4)"

"OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA
DE ROCA CUENCA HUARMY"

PLANO
PLANTA GENERAL
ACOPIO N°108
TAYCA

ESPECIALIDAD:
TOPOGRAFIA

USO:
GENERAL

ZONA:
RÍO HUARMY - HUARMY - ANCASH

ESCALA: INDICADAS FECHA: 23.11.2023 REV: R.O.

CÓDIGO DEL PLANO:
CO-PE-1PE406-GE-D-148-VAL-14-007
