Descripcion	Dias Cal.	Inicio	Fin
PARTIDAS PAQUETE 4 - CASMA SECTOR RIO GRANDE	240	01/11/2022	30/06/2023
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS	240	01/11/2022	30/06/2023
OBRAS PROVISIONALES	8	01/11/2022	08/11/2022
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.	1	01/11/2022	01/11/2022
INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS	8	01/11/2022	08/11/2022
OBRAS PRELIMINARES	240	01/11/2022	30/06/2023
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA	240	01/11/2022	30/06/2023
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	17	09/11/2022	25/11/2022
CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN	213	26/11/2022	26/06/2023
HABILITACIÓN DE ACCESOS	18	26/11/2022	13/12/2022
DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES	35	26/11/2022	30/12/2022
MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS	240	01/11/2022	30/06/2023
OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL	35	26/11/2022	30/12/2022
EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA	24	26/11/2022	19/12/2022
PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE	35	26/11/2022	30/12/2022
MOVIMIENTO DE TIERRAS	226	17/11/2022	30/06/2023
CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO	217	26/11/2022	30/06/2023
DESBROCE Y LIMPIEZA	24	26/11/2022	19/12/2022
EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO	176	19/12/2022	12/06/2023
EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO	8	19/12/2022	26/12/2022
EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO	17	19/12/2022	04/01/2023
EXCAVACIÓN DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREÁTICO	176	19/12/2022	12/06/2023
CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE	106	16/03/2023	29/06/2023
ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1	184	29/12/2022	30/06/2023
ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2	184	29/12/2022	30/06/2023
ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1	184	29/12/2022	30/06/2023
ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2	184	29/12/2022	30/06/2023
DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	194	19/12/2022	30/06/2023
REFINE Y PERFILADO DE TALUD	93	03/01/2023	05/04/2023
MEJORAMIENTO DEL SUELO DE FUNDACION	117	26/12/2022	22/04/2023
ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL	86	09/03/2023	02/06/2023
GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION	108	15/02/2023	02/06/2023
GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION	37	15/02/2023	23/03/2023
CONFORMACIÓN DE DME/DMO	72	26/12/2022	07/03/2023
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA	76	03/01/2023	20/03/2023
RELLENO CON MATERIAL PROPIO	50	26/12/2022	13/02/2023
TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS	63	03/01/2023	07/03/2023
REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES	226	17/11/2022	30/06/2023
EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO	70	17/11/2022	25/01/2023
EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO	2	24/01/2023	25/01/2023
EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO	70	17/11/2022	25/01/2023
CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE	37	07/03/2023	12/04/2023
PERFILADO DE TALUD EXISTENTE	21	25/01/2023	14/02/2023
GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION	63	12/04/2023	13/06/2023
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA	18	13/06/2023	30/06/2023
RELLENO CON MATERIAL PROPIO	9	14/02/2023	22/02/2023
TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS	72	12/04/2023	22/06/2023
TRANSPORTES DE MATERIAL	193	14/12/2022	24/06/2023
CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D≤1km	188	14/12/2022	19/06/2023
ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1km	188	14/12/2022	19/06/2023
CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM	176	31/12/2022	24/06/2023
TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM	176	31/12/2022	24/06/2023
CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km	187	19/12/2022	23/06/2023
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km	187	19/12/2022	23/06/2023
CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km	176	29/12/2022	22/06/2023
TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km	176	29/12/2022	22/06/2023
COMPONENTE DE INTERFERENCIAS	121	17/11/2022	17/03/2023

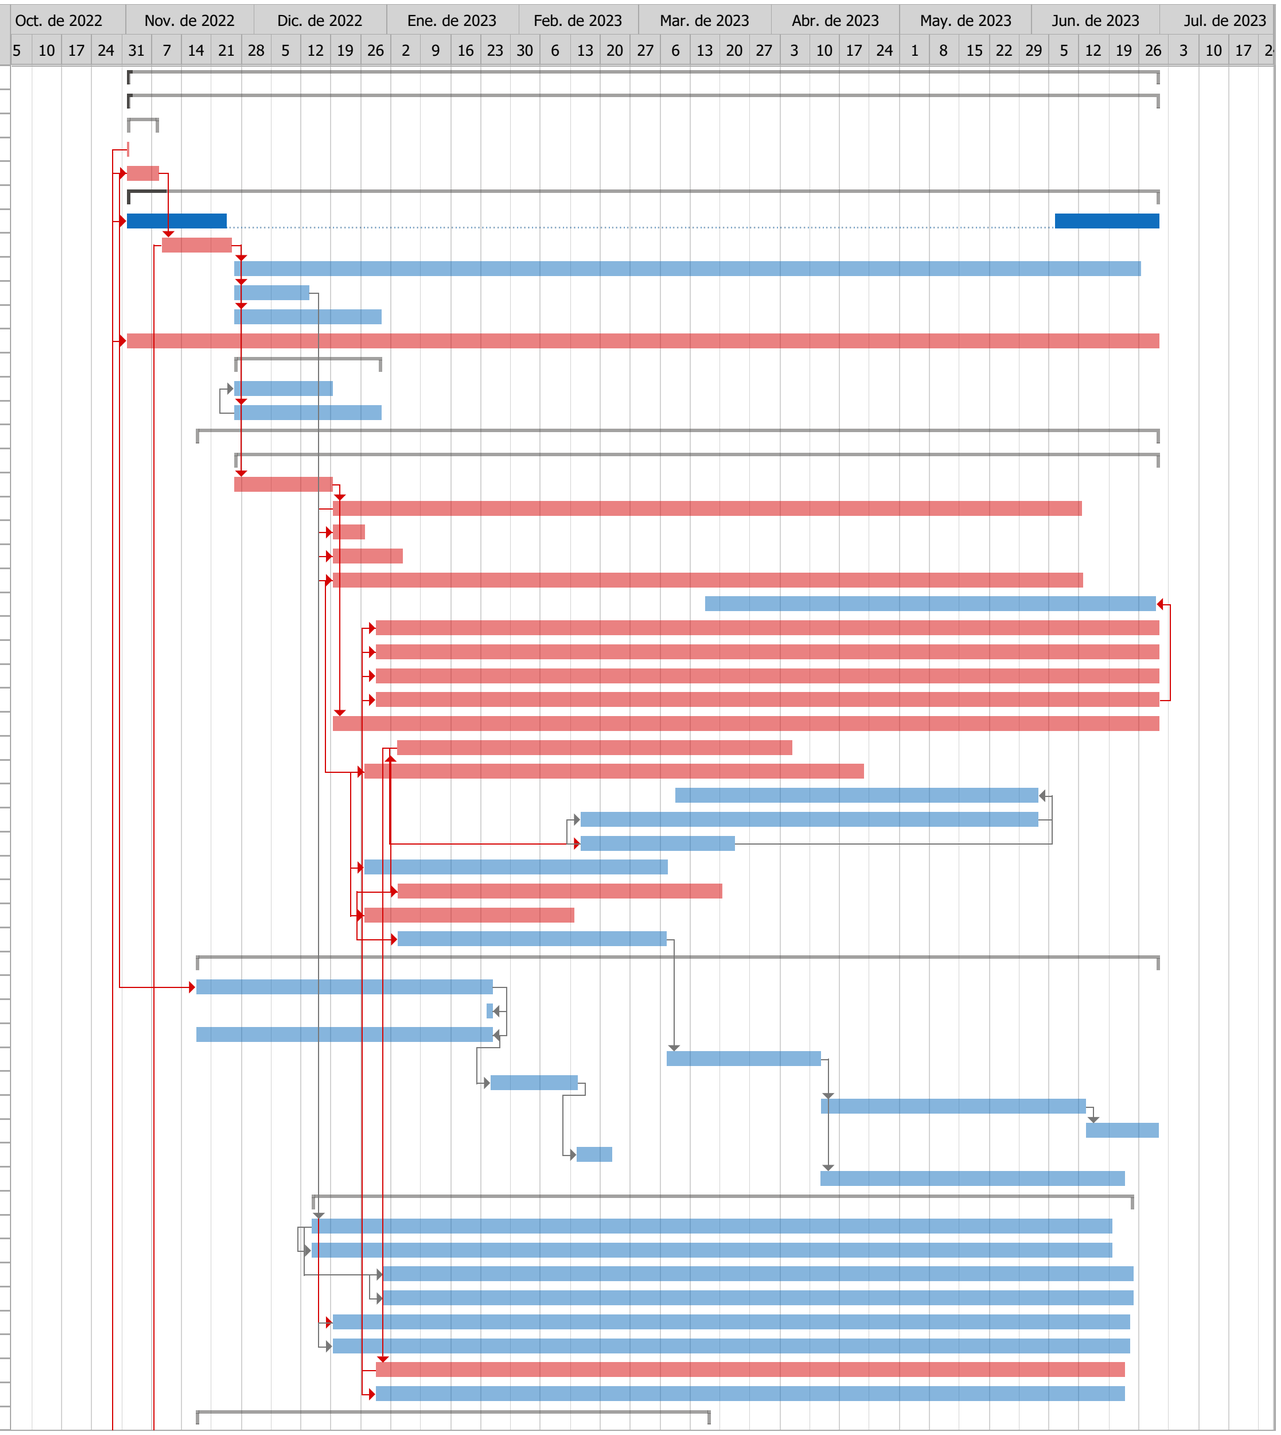

Tarea Programada
Critical
Hito
Resumen de Tarea
Progreso
División de Tarea
Critical Split

Descripcion	Dias Cal.	Inicio	Fin
⊟ OBRAS DE RIEGO	121	17/11/2022	17/03/2023
EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO	9	17/11/2022	25/11/2022
CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA	4	21/11/2022	24/11/2022
CONFORMACIÓN DE DME/DMO	4	21/11/2022	24/11/2022
EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO	117	21/11/2022	17/03/2023
CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO	4	17/12/2022	20/12/2022
CONCRETO (f'c = 14 Mpa)	19	17/12/2022	04/01/2023
CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS	40	17/12/2022	25/01/2023
ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa)	65	30/11/2022	02/02/2023
ENCOFRADO PLANO	71	24/11/2022	02/02/2023
ENCOFRADO CURVO	8	24/11/2022	01/12/2022
TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	8	30/11/2022	07/12/2022
TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	6	30/11/2022	05/12/2022
TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	6	30/11/2022	05/12/2022
COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓ	23	05/12/2022	27/12/2022
COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓ	4	05/12/2022	08/12/2022
COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E I	3	05/12/2022	07/12/2022
REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	12	05/12/2022	16/12/2022
REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	3	05/12/2022	07/12/2022
JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP	6	27/01/2023	02/02/2023
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA	51	26/01/2023	17/03/2023
⊟ TRABAJOS DE CIERRE	240	01/11/2022	30/06/2023
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	240	01/11/2022	30/06/2023

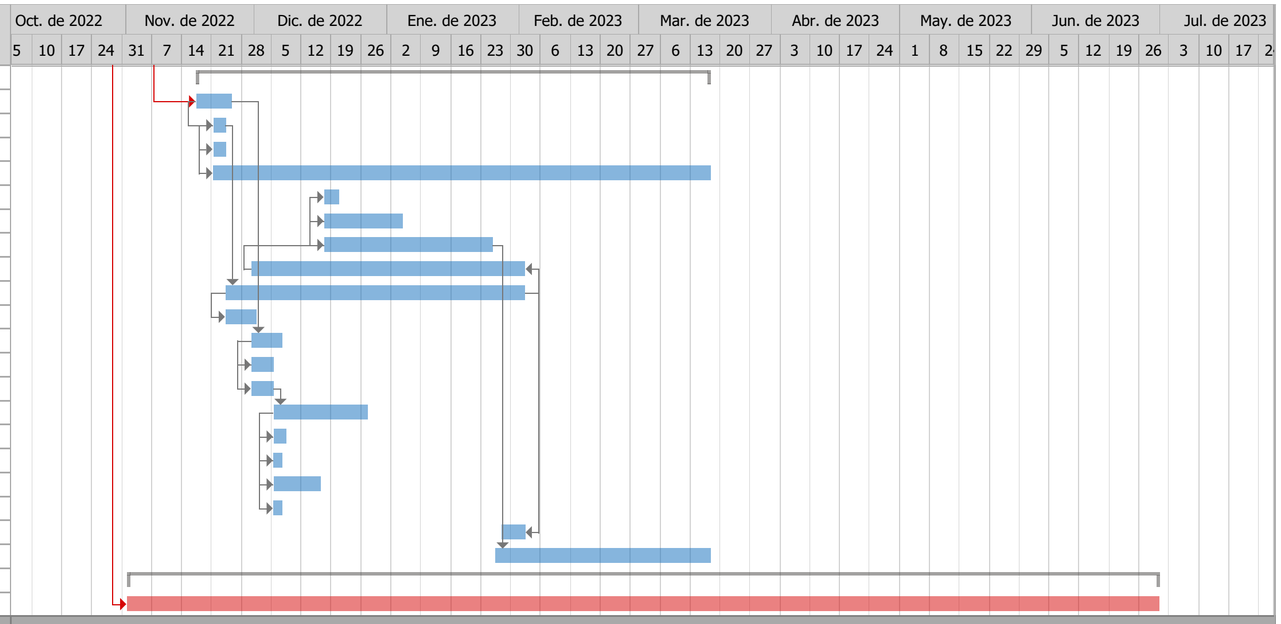

Tarea Programada
Critical
Hito
Resumen de Tarea

Progreso
División de Tarea
Critical Split
