Altesa Contratistas Generales S.A

Proyecto 2: “Creación del servicio de protección contra inundaciones y movimiento de masas en las Quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán en los distritos de Lunahuaná, Pacarán y Zuñiga de la Provincia de Cañete - Departamento de Lima"

10-10-23 16:25

WBS Code	WBS Name	Total Activities		
ALTESA C.N01	PROYECTO 2 - PAQUETE 5 RIO CAÑETE	245	15-03-24	30-12-24
ALTESA C.N01.1	HITOS	16	15-03-24	30-12-24
ALTESA C.N01.2	TRABAJOS PRELIMINARES Y ACOMPAÑAMIENT	11	15-03-24	30-12-24
ALTESA C.N01.2.1	Trabajos provisionales	7	15-03-24	30-12-24
ALTESA C.N01.2.2	Trabajos preliminares	1	13-04-24	19-12-24
ALTESA C.N01.2.3	Señalización	1	02-05-24	19-12-24
ALTESA C.N01.2.4	Transportes	1	15-03-24	19-12-24
ALTESA C.N01.2.5	Calidad	1	02-05-24	19-12-24
ALTESA C.N01.3	CONSTRUCCIÓN	218	02-05-24	23-12-24
ALTESA C.N01.3.1	ETAPA I - SAN JERÓNIMO Y CONDORAY	109	02-05-24	04-12-24
ALTESA C.N01.3.1.1	FRENTE 1 - DEMOLICIONES	3	02-05-24	09-07-24
ALTESA C.N01.3.1.2	FRENTE 2 - MOVIMIENTO DE TIERRAS	10	02-05-24	15-08-24
ALTESA C.N01.3.1.3	FRENTE 3 - ESTRUCTURAS CANALIZADAS	7	10-06-24	23-09-24
ALTESA C.N01.3.1.4	FRENTE 4 - PASO SUPERIOR TIPO MARCO	10	24-06-24	23-09-24
ALTESA C.N01.3.1.5	FRENTE 5 - INTERFERENCIAS	61	24-06-24	22-11-24
ALTESA C.N01.3.1.6	FRENTE 6 - INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAIS	7	03-10-24	04-12-24
ALTESA C.N01.3.1.7	FRENTE 7 - MUROS DE CONTENCIÓN	7	24-06-24	13-07-24
ALTESA C.N01.3.1.7.1	F7 - OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	1	24-06-24	24-06-24
ALTESA C.N01.3.1.7.2	F7 - OBRAS DE CONCRETO ARMADO	5	25-06-24	11-07-24
ALTESA C.N01.3.1.7.3	F7 - ARQUITECTURA	1	11-07-24	13-07-24
ALTESA C.N01.3.1.8	FRENTE 8 - PAVIMENTO RÍGIDO	4	14-09-24	12-10-24
ALTESA C.N01.3.2	ETAPA II - JACAYITA Y PICAMARÁN	109	14-08-24	23-12-24
ALTESA C.N01.3.2.1	FRENTE 1 - DEMOLICIONES	3	14-08-24	19-08-24
ALTESA C.N01.3.2.2	FRENTE 2 - MOVIMIENTO DE TIERRAS	10	14-08-24	03-12-24
ALTESA C.N01.3.2.3	FRENTE 3 - ESTRUCTURAS CANALIZADAS	7	20-08-24	19-12-24
ALTESA C.N01.3.2.4	FRENTE 4 - PASO SUPERIOR TIPO MARCO	10	01-10-24	14-12-24
ALTESA C.N01.3.2.5	FRENTE 5 - INTERFERENCIAS	61	01-10-24	04-12-24
ALTESA C.N01.3.2.6	FRENTE 6 - INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAIS	7	01-10-24	05-12-24
ALTESA C.N01.3.2.7	FRENTE 7 - MUROS DE CONTENCIÓN	7	03-10-24	03-10-24
ALTESA C.N01.3.2.7.1	F7 - OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	1	03-10-24	03-10-24
ALTESA C.N01.3.2.7.2	F7 - OBRAS DE CONCRETO ARMADO	5	03-10-24	03-10-24
ALTESA C.N01.3.2.7.3	F7 - ARQUITECTURA	1	03-10-24	03-10-24
ALTESA C.N01.3.2.8	FRENTE 8 - PAVIMENTO RÍGIDO	4	03-12-24	23-12-24

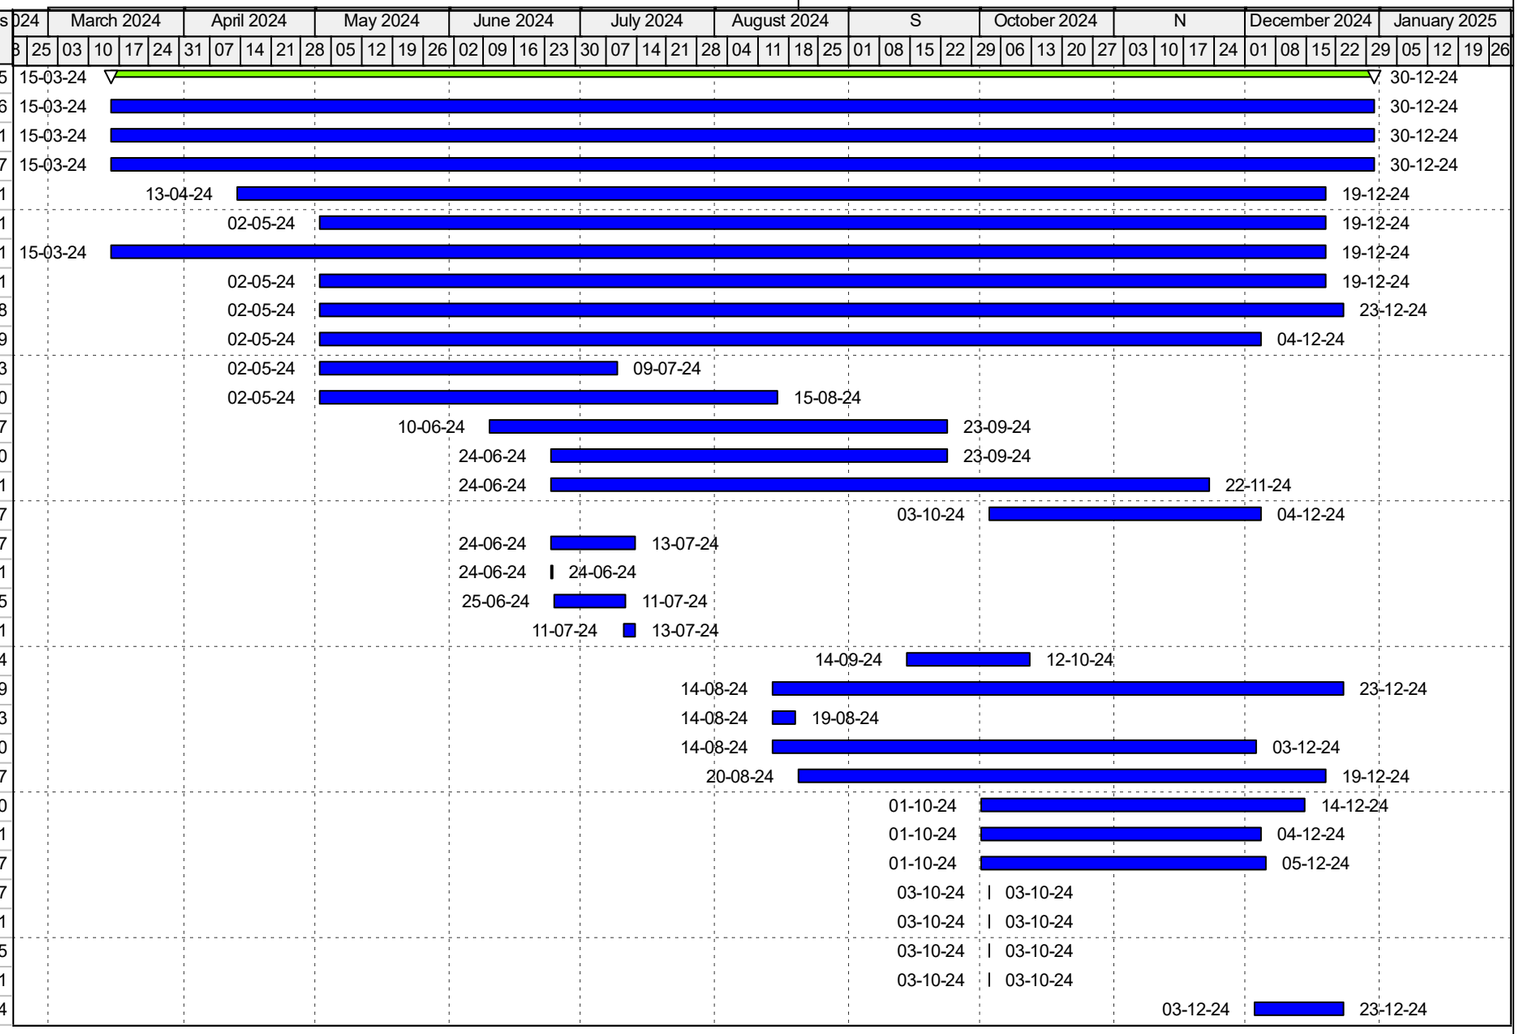

All Projects
Summary
WBS Elements below Project

© Oracle Corporation
