PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO

PROYECTO: "IMPLEMENTACION DE UN DEPOSITO TEMPORAL DE RESIDUOS PARA LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA".

1. OBJETIVOS:

El objetivo del presente plan de trabajo es dar a conocer, la metodología y procedimientos a seguir en la ejecución de los trabajos del servicio la construcción de losas de concreto simple, muros de albañilería, cerco perimétrico con malla olímpica y cobertura con calamina en estricto cumplimiento con las directrices de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, establecidas por **INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B** y **GUPESA CONTRATISTA Y SERVICIOS GENERALES**, con el fin de prevenir, controlar y eliminar los actos y condiciones sub-estandares que puedan provocar daños al personal, equipos, infraestructura y al medio ambiente, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y contractuales vigentes necesarias en la ejecución del proyecto: **"IMPLEMENTACION DE UN DEPOSITO TEMPORAL DE RESIDUOS PARA LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA".**

2. AMBITO DE APLICACION:

La presente instrucción técnica de trabajo rige para todos los proyectos de INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B en las que se efectué los servicios de construcción que involucren trabajos de construcción de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas contractuales del proyecto: **"IMPLEMENTACION DE UN DEPOSITO TEMPORAL DE RESIDUOS PARA LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA".**

3. ALCANCE:

El alcance del presente plan de trabajo comprende la ejecución de losas de concreto simple, muros de albañilería, cerco perimétrico con malla olímpica y cobertura con calamina que forman parte del proyecto: **"IMPLEMENTACION DE UN DEPOSITO TEMPORAL DE RESIDUOS PARA LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA".**

4. RESPONSABILIDADES DE IMPLEMENTACION:

4.1. RESPONSABLE DEL SERVICIO:

Responsable del cumplimiento de todas las obligaciones contraídas en el contrato, hasta el cierre satisfactorio del mismo. Responsable de las actividades del servicio, garantizando el cumplimiento de las normas, reglamentos vigentes y el procedimiento de trabajo. Mantiene coordinación permanente con la Supervisión del servicio para la correcta y oportuna ejecución de las actividades a realizar.
Planifica las actividades del servicio en función del cronograma establecido. Debe asegurar que se disponga y asigne los recursos necesarios para asegurar la calidad y tiempos de ejecución del proyecto.

4.2. ASISTENTE DE CAMPO:

El asistente de campo responsable en el apoyo de planificar, programar, ejecutar y controlar la ejecución del servicio en coordinación con el Ingeniero responsable del servicio. Así mismo asiste en la coordinación con el maestro de obra y el personal involucrado en los avances de la ejecución del servicio, validando los avances y verificando que los trabajos cumplan con lo indicado en los planos del proyecto.

4.3. PREVENCIONISTA DE RIESGOS:

Monitorea que las normas de seguridad establecidas en este procedimiento se cumplan.
Verifica el estado de los equipos y el uso adecuado de los EPPs, EPCs.
Verifica los permisos de trabajos correspondiente y que cuenten con el equipo adecuado para ello.
Comunica e instruye al personal de obra, respecto de la manera de ejecutar las tareas asignadas de acuerdo con los procedimientos e instructivos establecidos para el contrato.
Coordina con los capataces cualquier actividad fuera de este procedimiento y que necesite de correcciones en temas de seguridad.
Elabora el informe semanal de las actividades desarrolladas durante el período, el cual lo reportará al responsable del servicio para ser enviado a la oficina central u/o cualquier otra instancia que corresponda. Realiza planes de contingencia para posibles imprevistos, sean estos de carácter operativo o de origen natural.

4.4. MAESTRO DE OBRA:

Es el responsable de ejecutar los trabajos cumpliendo las normas de seguridad, planifica, distribuye al personal y equipos de acuerdo a las necesidades de cada frente de trabajo, dirige las actividades del servicio de acuerdo al presente procedimiento.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

5.1. DOCUMENTOS DEL PROYECTO:

- Los documentos que servirán de referencia son los siguientes:
- Planos del proyecto
- Especificaciones técnicas del proyecto
- Memoria descriptiva del proyecto
- Presupuesto del proyecto

5.2. NORMAS APLICABLES:

- Reglamento Nacional de Construcciones.
- ACI 302 Guide for Concrete Floor and Slab Construction.

5.3. NORMAS DE SEGURIDAD:

- Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Ley N° 30222 Ley que modifica a la Ley N° 29783.
- DS N° 005-2012 TR “Reglamento de la Ley N° 29789, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

- DS N° 006-2014 TR que modifica el Reglamento de la ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- NTP G.050 Seguridad en la Construcción.

6. EJECUCION DEL SERVICIO:

6.1. TRABAJOS PRELIMINARES:

6.1.1. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL:

La partida se refiere a la limpieza del terreno en el área comprendida en los límites del proyecto de tal manera que este quede en óptimas condiciones para iniciar la ejecución de los trabajos de construcción. Cabe precisar que esta partida incluye el retiro mediante medios manuales y opcionalmente mecánicos, de toda la basura, desmonte, y tierra acumulada no apta para recibir la estructura de la losa de 0.15m.

6.1.2. TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO:

Este trabajo consiste en materializar sobre el terreno la determinación precisa de los ejes y niveles, medidas y ubicación de todos los elementos que existen en los planos, así como definir sus linderos, establecer marcas y señales fijas de referencia.
Dichos trabajos serán suficientemente necesarios y precisos para la finalidad a alcanzar. En este sentido, sin ser limitantes y en función al tipo de partida que ejecuten, se considerara para la obtención de las dimensiones y niveles de los elementos que conforman la infraestructura, los siguientes:
• Estacado del eje.
• Nivelación del eje y bordes de la losa.
• Nivelación de secciones en general.

6.2. MOVIMIENTOS DE TIERRA:

6.2.1. EXCAVACION MANUAL AREA DE RESIDUOS PELIGROSOS:

Comprende las actividades para realizar cortes masivos en el terreno natural, hasta llegar a la línea horizontal que define la rasante del terreno, según lo indicado en los planos, dicha rasante deberá ser aprobada por el Ingeniero Supervisor antes de ejecutar la respectiva compactación del terreno.

6.2.2. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE:

Comprende la remoción, carguío y transporte de todo aquel material sobrante de los rellenos o material no apropiado para ellos a puntos de eliminación de desmonte, previa verificación de la disponibilidad de terreno por parte del Ingeniero Supervisor, ubicadas en el área fuera de la influencia de las obras hasta una distancia variable.

6.3. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE:

6.3.1. SOLADO DE 4" F'C=100KG/CM2 (Residuos Generales):

Se utilizará un concreto con una dosificaicon de 1:12, dicha dosificación es óptima para concretos con resistencias de 100kg/cm2 como indica en el proyecto. Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de la excavación, como producto de un correcto replanteo, el batido de estos materiales se hará utilizando mezcladora mecánica, debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante 1 minuto por carga.
Solo podrá emplearse agua potable o agua limpia, de buena calidad, libre de impurezas que puedan dañar el concreto; se humedecerá las zanjas antes de llenar los solados.

6.3.2. LOSA DE CONCRETO e=0.15m F'C=175KG/CM2 (Residuos Peligrosos):

En general, las presentes especificaciones están referidas a las construcciones de concreto como son en este caso la losa de e=0.15m con una resistencia a la compresión de 175kg/cm2. Los trabajos incluyen el suministro de equipo, materiales y mano de obra necesarios para la dosificación, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del concreto. La dosis óptima para cada tipo de concreto será establecida por medio de las pruebas. Los componentes del concreto se podrán utilizar y dosificar dentro de los siguientes límites especificados:

F´c	Cemento	(Bolsas)	Relación A/C Máxima	Relación A/C Optimo
100	150	(5.00)	0.75	0.65
140	200	(6.58)	0.70	0.60
175	300	(8.65)	0.65	0.55
210	320	(9.75)	0.58	0.50

6.3.2.1. MATERIALES:

A) CEMENTO PORTLAND TIPO MS:

El cemento Portland para todo el concreto y mortero, debe cumplir con los requisitos de Especificaciones ASTM C 1157 Tipo MS. Cada lote de cemento en bolsa, deberá ser almacenado para permitir el acceso necesario para su inspección o identificación y deberá estar adecuadamente protegido de la humedad. El cemento deberá estar libre de grumos o endurecimientos debido a un almacenaje prolongado. Si el cemento permaneciera almacenado por más de cuatro (04) semanas deberá ser

sometido a los ensayos correspondientes para verificar su calidad y comprobar su correcta resistencia. En todo caso, necesitará la autorización del Ingeniero Supervisor para su utilización. Una bolsa de cemento queda definida como la cantidad con tenida en un envase original intacto del fabricante que generalmente pesa 42.5 Kg.

B) AGREGADO FINO:

La arena para la mezcla del concreto y para sus usos como mortero, será arena limpia, de origen natural, con un tamaño máximo de partículas de 3/16" y cumplirá con lo indicado en la norma ASTM C-33. La arena será obtenida de depósitos naturales o procesada en el sitio del proyecto o una combinación de ambos.
De encontrarse que los agregados finos provenientes de las canteras ubicadas en la zona del Proyecto que no cumplan con las especificaciones descritas en este acápite podrán considerarse el acarreo de lugares y/o canteras de garantía reconocida.

C) AGREGADO GRUESO / GRAVA:

Los agregados gruesos serán de fragmentos de roca ígnea duros, resistentes, densos y durables, sin estar cubiertos de otros materiales o materia orgánica. El agregado grueso para la mezcla del concreto estará constituido por grava natural, grava partida, piedra chancada o una combinación de ellas con dimensión mínima de 3/16" y dimensión máxima de 3".

D) AGUA:

El agua que se empleará para mezcla y curado del concreto, estará limpia y libre de cantidades dañinas de sales, aceites, ácidos álcalis, materia orgánica o mineral y otras impurezas que puedan reducir la resistencia, durabilidad o calidad del concreto. El agua para la mezcla y el curado del concreto no debe tener un pH menor de 5.5 ni mayor de 8.5.

6.3.2.2. PROCEDIMIENTO:

A) MEZCLADO:

Para el mezclado se utilizará una mezcladora de concreto tambor, de manera que el concreto que se obtenga sea de una distribución homogénea de sus ingredientes.
Todos los agregados serán incluidos en la mezcla con una precisión de 3% del peso, haciendo la debida compensación para la humedad libre y absorbida que contienen los agregados.

Con el fin de reducir el manipuleo del concreto al mínimo, la producción de la mezcla deberá estar ubicada cerca como sea posible de la estructura donde se a vaciar el concreto. Cualquier mezcla que, por haberse mantenido durante mucho tiempo en la mezcladora, se haya convertido en muy densa para su colocación efectiva y consolidación, será eliminada.
El Ingeniero Supervisor deberá ajustar la secuencia de mezclado, y hacer los cambios que considere necesario para obtener concreto de la calidad especificada.

B) VACIADO:

El concreto se llevará directamente al lugar del vaciado, tan pronto como sea posible, utilizando métodos que garanticen que no habrá segregación, ni pérdida de ingredientes.

C) CHUSEADO:

Para el Chuseado se utilizará un Vibrador de concreto, mediante el cual se agitará el concreto a fin de eliminar las cangrejeras

D) CURADO:

El concreto recién colocado, deberá ser protegido de un secado prematuro y de temperaturas excesivamente calientes o frías, además, mantenerse con una pérdida mínima de humedad, a una temperatura relativamente constante durante el período de tiempo necesario para la hidratación del cemento y para el endurecimiento debido del concreto.
El curado inicial deberá seguir inmediatamente a las operaciones de acabado. El curado se continuará durante un tiempo mínimo de 7 días, teniéndose especial cuidado en las primeras 48 horas.
Los métodos para evitar la pérdida de humedad pueden ser:

- Utilización de membranas líquidas.
- En caso de superficies planas se puede formar pozos de agua.
- Regando continuamente.
- Cubriendo con una capa de arena o aserrín de 2.5 cm humedecidos previamente.

6.3.3. SARDINEL DE CONCRETO e= 0.15m F'C=175KG/CM2 (Residuos Peligrosos):

Los sardineles peraltados de concreto F'c=175kg/cm2 se ejecutarán en los lados laterales de la losa donde esta designado la colocación de residuos peligrosos. Así mismo en esta partida se indican las consideraciones a seguir para la construcción de los encofrados para el confinamiento de los sardineles con la losa de concreto e=0.15m.

6.3.4. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO:

Los encofrados tendrán la forma y dimensiones de los elementos estructurales indicados en los planos. Deberán estar suficientemente unidos para evitar la pérdida del concreto. El desencofrado se realizará en el tiempo requerido, el cual debe guardar relación con la resistencia adquirida por el concreto hasta ese momento sin que sufra alguna alteración, siempre con la aprobación del Ingeniero Supervisor.

6.4. ALBAÑILERIA:

6.4.1. MURO DE LADRILLO K.K. DE SOGA:

Este capítulo se refiere a los trabajos de albañilería que es el proceso constructivo determinado por el uso del ladrillo de arcilla hecho a máquina, las que por sus dimensiones modulares permiten la ejecución de muros portantes en aparejo de soga y los espesores que se indican en los planos del proyecto.

6.4.1.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES:

Los ladrillos serán de arcilla bien cocidos, de la mejor calidad comercial que se consiga en plaza.
El Ingeniero Supervisor rechazará aquellos que presenten fracturas, grietas, porosidad excesiva o que tengan material orgánico o materias extrañas como conchuelas u otras que hagan presumir la presencia de salitre en su composición; sus aristas deberán ser vivas, sus caras planas, deben tener un sonido metálico de percusión, igualdad de color y no ser frágiles**.**

El Cemento debe ser según lo que indique en los planos y especificaciones técnicas, conforme lo señala el Reglamento Nacional de Edificaciones; la arena áspera, silícea, limpia, de granos duros y resistentes, libre de álcalis y de materias dañinas, deberá tener una granulometría conforme a las especificaciones ASTM-114, el agua para la mezcla será dulce y limpia.

El Ladrillo en caso de usar unidades con arcilla se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Todo ladrillo de arcilla debe ser mojado antes de su empleo.
- Los ladrillos serán del tipo (IV), King-Kong de 18 huecos según las normas INTINTEC 331.017.

Los ladrillos de arcilla que se especifican deben satisfacer ampliamente las normas Técnicas de INTINTEC 331-017/78. Las superficies destinadas a recibir revoques serán suficientemente ásperas para asegurar una buena adherencia.

Para efectos de los ensayos que acrediten la resistencia a la comprensión, absorción, succión, etc. Deberá respetarse las normas INTINTEC correspondientes.

El asentado de los ladrillos en general, será hecho prolijamente y en particular se pondrá atención a la calidad del ladrillo, a la ejecución de las juntas, al plomo del muro y perfiles de "derrames" y a la dosificación, preparación y colocación del mortero.

Se distribuirá una capa de mortero, otra de ladrillo alternando las juntas verticales. No se hará en un día más de 1.50 m. de altura en muro para evitar asentamientos y desplomes.

6.5. CARPINTERIA METALICA:

6.5.1. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO (Incluye malla olímpica y postes de 3") H=3.20m:

Esta partida está comprendida la confección y la instalación de los tubos de fierro galvanizado de 3". Así mismo se refiere a los trabajos de colocación de malla olímpica del tipo N° 10 electro soldadas, que servirán como protección de la infraestructura con una altura de 3.20m.

6.5.2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO (Incluye malla olímpica y postes de 3") H=2.60m:

Esta partida está comprendida la confección y la instalación de los tubos de fierro galvanizado de 3". Así mismo se refiere a los trabajos de colocación de malla olímpica del tipo N° 10 electro soldadas, que servirán como protección de la infraestructura con una altura de 2.60m.

6.5.3. SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBERTURA (Incluye perfil de 3" y calamina):

Esta partida describe los elementos proyectados para la función de protección de la edificación en el plano horizontal y que van a estar directamente expuestos a la intemperie. Los materiales a emplearse son:
- Calamina de Aluzinc TR5 de 0.35mm de espesor (6.00x1.00m.)
- Perno autoroscante para estabilizar el aluzinc
- Perfil de 3" para apoyo de la calamina.

6.5.4. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON MALLA 2.50x4.00m DOBLE HOJA INCLUIDO ACCESORIOS:

Esta partida está comprendida la confección y la instalación de los tubos de fierro galvanizado de 3" y la malla olímpica de tipo N°10 electro soldadas, 2 hojas con una medida de 2.50x4.00m.

6.6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

6.6.1. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVA:

Con respecto a esta partida, se priorizará en la implementación de los equipos de protección personal y colectiva de todo el personal en campo (22 trabajadores) con la finalidad de salvaguardar la integridad de todo el personal.

6.6.2. SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD:

Con respecto a esta partida, en coordinación con el encargado de los trabajos de prevención de riesgos se realizará la constante señalización temporal en campo con la finalidad de evitar cualquier contra tiempo en campo.

6.6.3. SERVICIOS DE BIENESTAR E HIGIENE:

Con respecto a esta partida, en coordinación con el encargado de los trabajos de la habilitación de baños químicos para mantener la comodidad de todo el personal en campo.

6.7. SEÑALIZACION PERMANENTE:

6.7.1. CARTELES Y AVISOS INFORMATIVOS:

Con respecto a esta partida, en coordinación con el encargado de los trabajos de la habilitación y la correcta colocación de los carteles y avisos informativos que indican en el proyecto con la finalidad de mantener informado a todo personal hasta la culminación del servicio.

6.8. HABILITACION DE ACCESO:


6.8.1. HABILITACION DE ACCESO CON PIEDRA OVER Y ALCANTARILLAS TMC Ø 1200 mm

La propuesta planteada para la habilitación del acceso es la siguiente: se colocará alcantarillas TMC Ø 1200 mm previa colocación de piedra over de 10” en todo el cauce del rio que tiene una longitud de 38 metros según el levantamiento realizado, luego se procederá a realizar el mejoramiento del acceso **(ancho de acceso = 6.00 metros),** rellenando con capas de afirmado todo el acceso desde el km 0+00 al km 0+161.28 en la cual se ve reflejado en las siguientes imágenes del levantamiento topográfico que se realizaron con el equipo técnico **(Longitud total del acceso = 967.68 m2**)

INCOGEZYB

INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B SAC

RUC: 20541624644

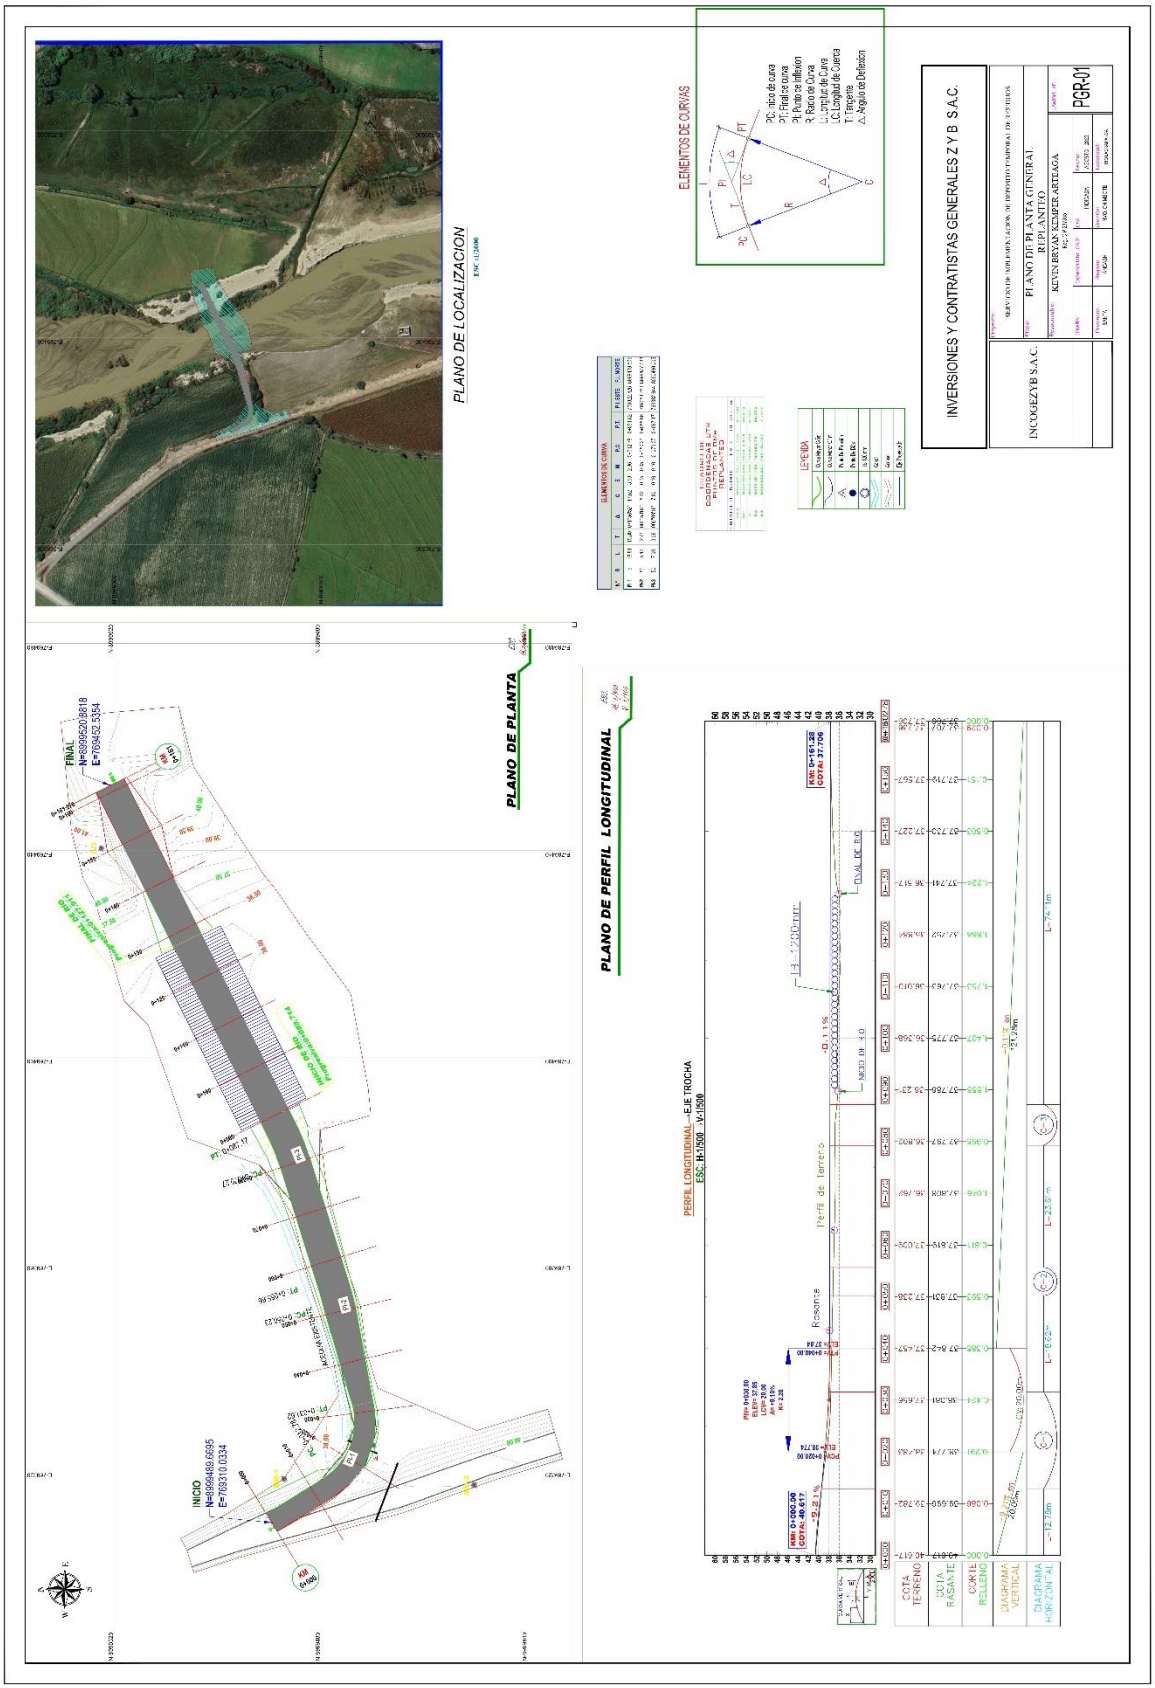



Urb. Los Cipreces Mz. J Lote. 9, Nuevo Chimbote - Santa - Ancash
Teléfono: 043 777768 – Celular: 999760033 - 969759806
Email: incogezyb@gmail.com

INCOGEZYB

INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B SAC

RUC: 20541624644

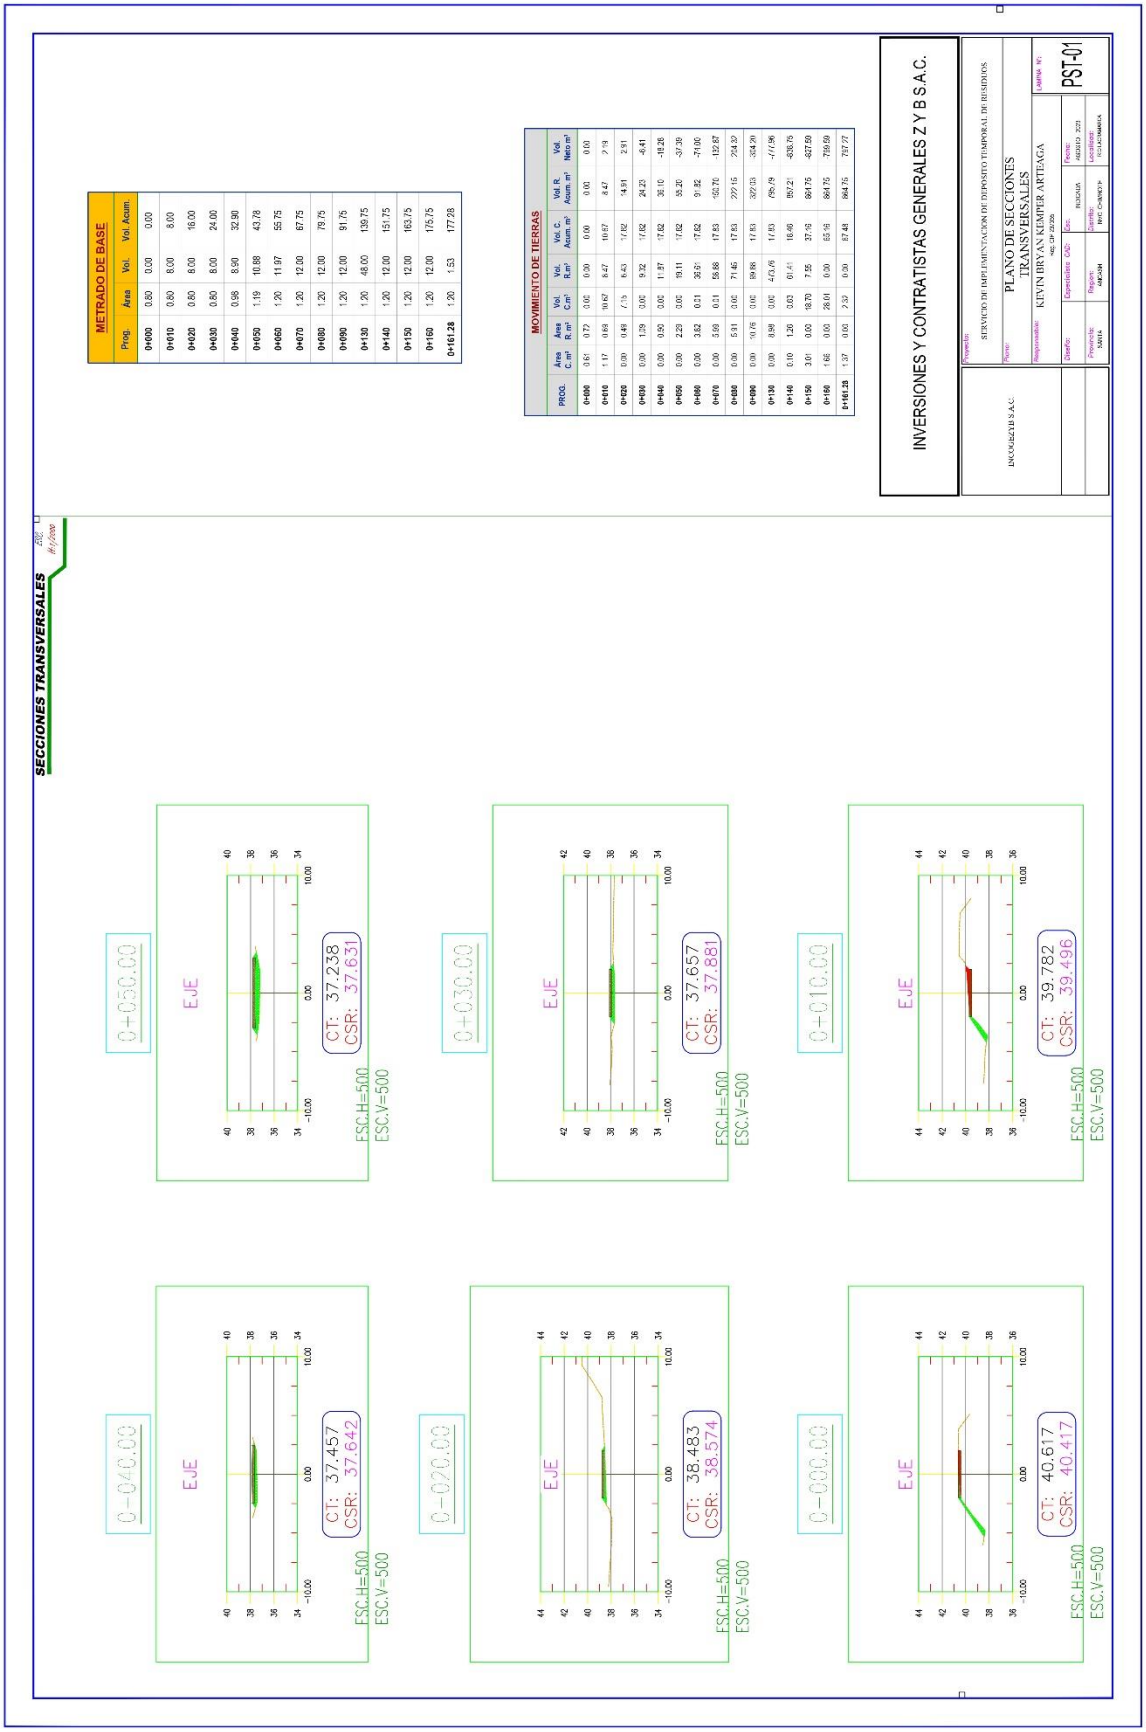


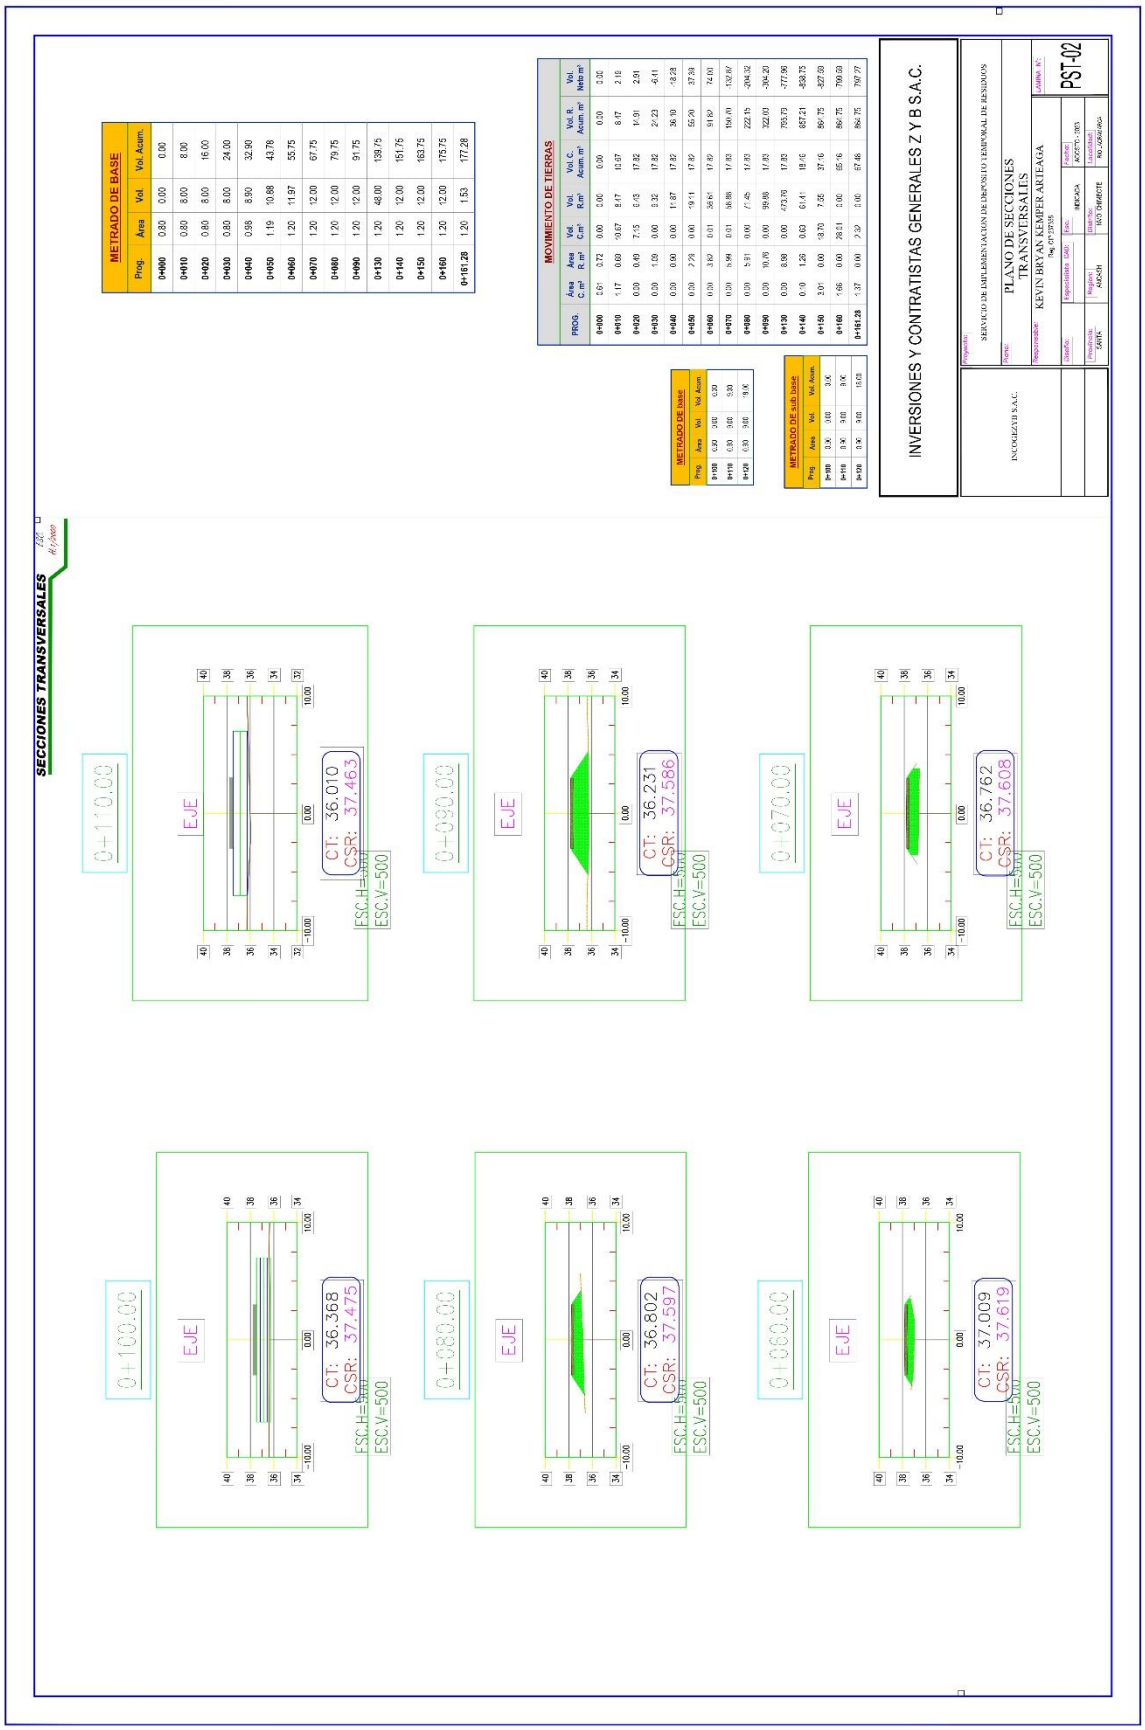
INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B S.A.C.
SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES
KEVIN BRYAN KEMPER ARTEAGA
PST-02
SECCIONES TRANSVERSALES
METRADO DE BASE
MOVIMIENTO DE TIERRAS
METRADO DE base
METRADO DE sub base
0+100.00
0+090.00
0+080.00
0+070.00
0+060.00
EJE
CT: 36.010
CSR: 37.463
CT: 36.231
CSR: 37.586
CT: 36.762
CSR: 37.608
CT: 36.368
CSR: 37.475
CT: 36.802
CSR: 37.597
CT: 37.009
CSR: 37.619
ESC.H=1:500
ESC.V=1:500

INCOGEZYB

INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B SAC

RUC: 20541624644

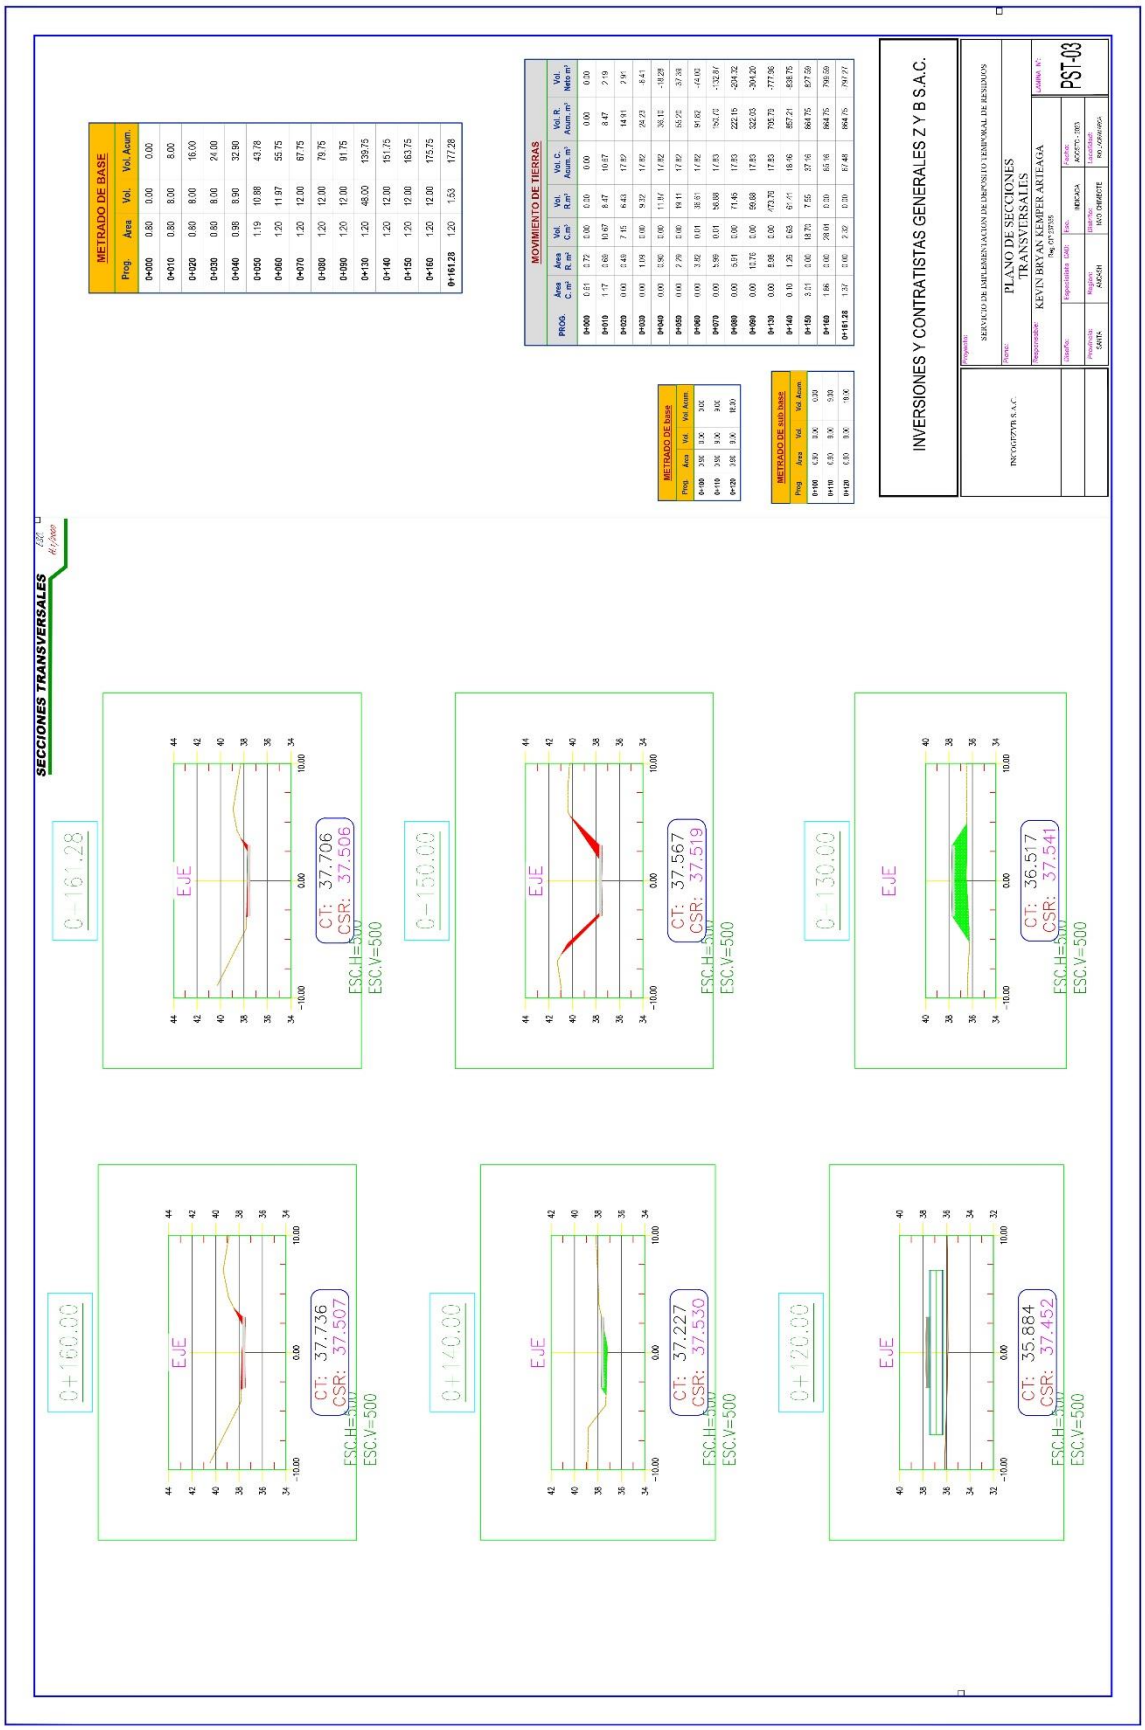

Urb. Los Cipreces Mz. J Lote. 9, Nuevo Chimbote - Santa - Ancash
Teléfono: 043 777768 – Celular: 999760033 - 969759806
Email: incogezyb@gmail.com

INCOGEZYB

INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B SAC

RUC: 20541624644

CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES (31 DIAS CALENDARIOS)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE DEPOSITO DE RESIDUOS**	**31 días**	**vie 01/09/23**	**vie 13/10/23**
2		**DEPOSITO TEMPORAL DE RESIDUOS**	**31 días**	**vie 01/09/23**	**vie 13/10/23**
3		**TRABAJOS PRELIMINARES**	**4 días**	**vie 01/09/23**	**mié 06/09/23**
4		LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	4 días	vie 01/09/23	mié 06/09/23
5		TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	3 días	vie 01/09/23	mar 05/09/23
6		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**5 días**	**vie 01/09/23**	**jue 07/09/23**
7		EXCAVACION MANUAL AREA DE RESIDUOS PELIGROSOS	5 días	vie 01/09/23	jue 07/09/23
8		NIVELACION Y APISONADO MANUAL	3 días	vie 01/09/23	mar 05/09/23
9		ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	2 días	vie 01/09/23	lun 04/09/23
10		**OBRAS DE CONCRETO SIMPLE**	**6 días**	**jue 21/09/23**	**jue 28/09/23**
11		SOLADO 4" F´C=100KG/CM2 (Residuos Generales)	1 día	jue 21/09/23	jue 21/09/23
12		LOSA DE CONCRETO e=0.15m F'C=175KG/CM2 (Residuos Peligrosos)	2 días	vie 22/09/23	lun 25/09/23
13		SARDINEL DE CONCRETO e=0.15m F'C=175KG/CM2 (Residuos Peligrosos)	3 días	jue 21/09/23	lun 25/09/23
14		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	3 días	mar 26/09/23	jue 28/09/23
15		**ALBAÑILERIA**	**3 días**	**jue 21/09/23**	**lun 25/09/23**
16		MURO DE LADRILLO KK DE SOGA	3 días	jue 21/09/23	lun 25/09/23
17		**CARPINTERIA METALICA**	**13 días**	**jue 21/09/23**	**lun 09/10/23**
18		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO (Incluye Malla Olimpica y Postes de 3"): h=3.20m	3 días	mar 26/09/23	jue 28/09/23
19		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO (Incluye Malla Olimpica y Postes de 3"): h=2.60m	3 días	vie 29/09/23	mar 03/10/23
20		SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBERTURA (Incluye perfil de 3" y Calamina)	4 días	jue 21/09/23	mar 26/09/23
21		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON MALLA: 2.30xl.50m Inc. Accesorios (Residuos Peligrosos)	3 días	vie 29/09/23	mar 03/10/23

Proyecto: DEPOSITO OHLA
Fecha: mar 22/08/23

Tarea	Resumen inactivo		Tareas externas
División	Tarea manual		Hito externo
Hito	solo duración		Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual		Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual		Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		


Página 1


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
22			SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON MALLA: 2.50x4.00m doble hoja Inc. Accesorios (Ingreso Principal)	4 días	mié 04/10/23	lun 09/10/23
23			**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**17 días**	**jue 21/09/23**	**vie 13/10/23**
24			EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVA	2 días	jue 21/09/23	vie 22/09/23
25			SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	15 días	jue 21/09/23	mié 11/10/23
26			SERVICIOS DE BIENESTAR E HIGIENE	17 días	jue 21/09/23	vie 13/10/23
27			**SEÑALIZACION PERMANENTE**	**3 días**	**jue 21/09/23**	**lun 25/09/23**
28			CARTELES Y AVISOS INFORMATVOS	3 días	jue 21/09/23	lun 25/09/23
29			**ACCESO**	**14 días**	**vie 01/09/23**	**mié 20/09/23**
30			**HABILITACION DE ACCESO**	**14 días**	**vie 01/09/23**	**mié 20/09/23**
31			HABILITACION DE ACCESO	14 días	vie 01/09/23	mié 20/09/23

Proyecto: DEPOSITO OHLA
Fecha: mar 22/08/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Página 2

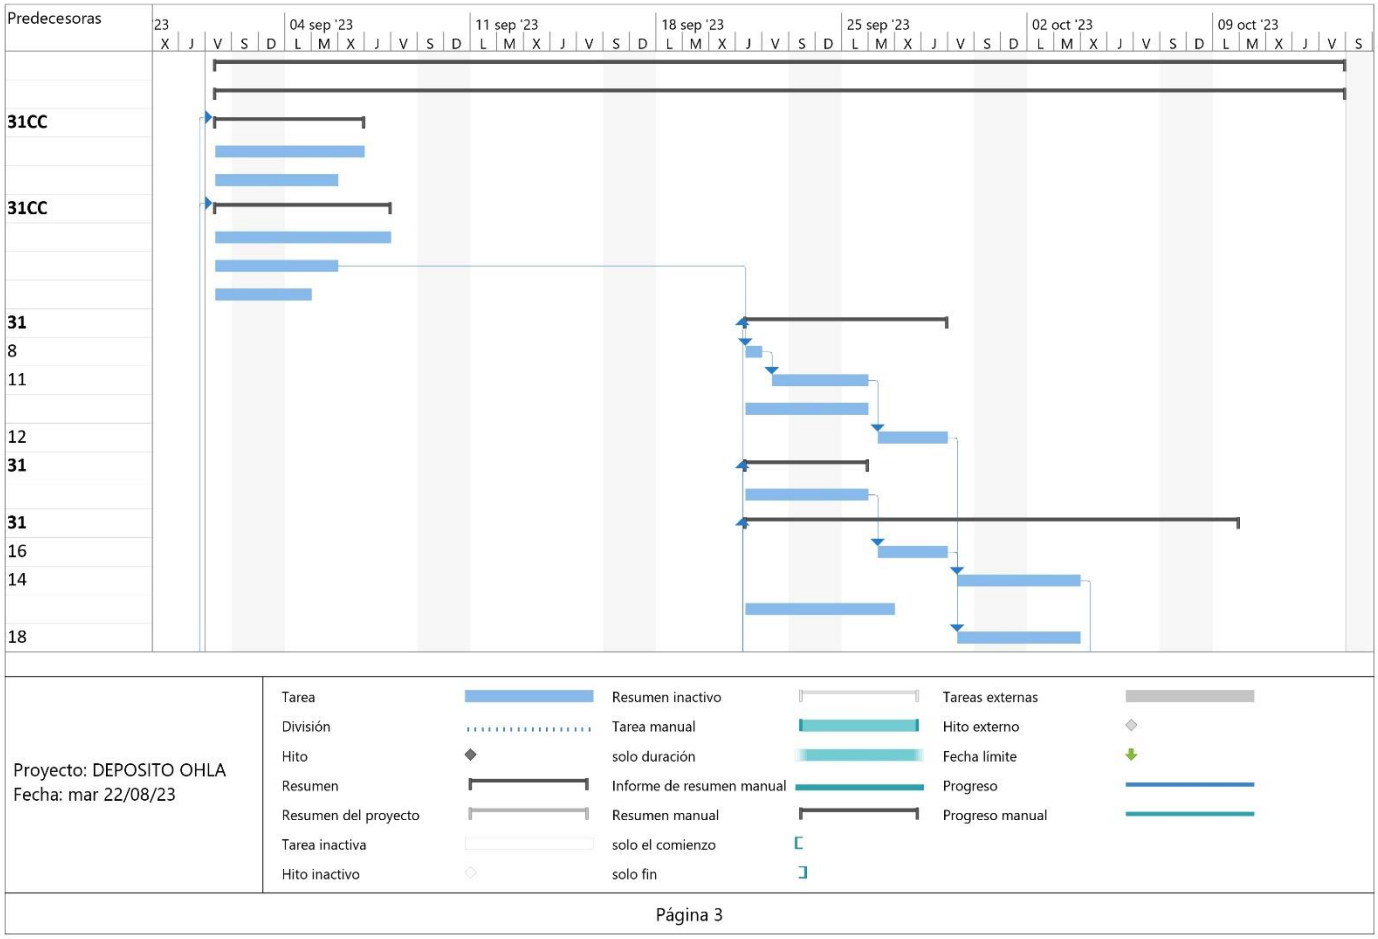
Predecesoras
23
04 sep '23
11 sep '23
18 sep '23
25 sep '23
02 oct '23
09 oct '23
31CC
31CC
31
8
11
12
31
31
16
14
18
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
Proyecto: DEPOSITO OHLA
Fecha: mar 22/08/23
Página 3

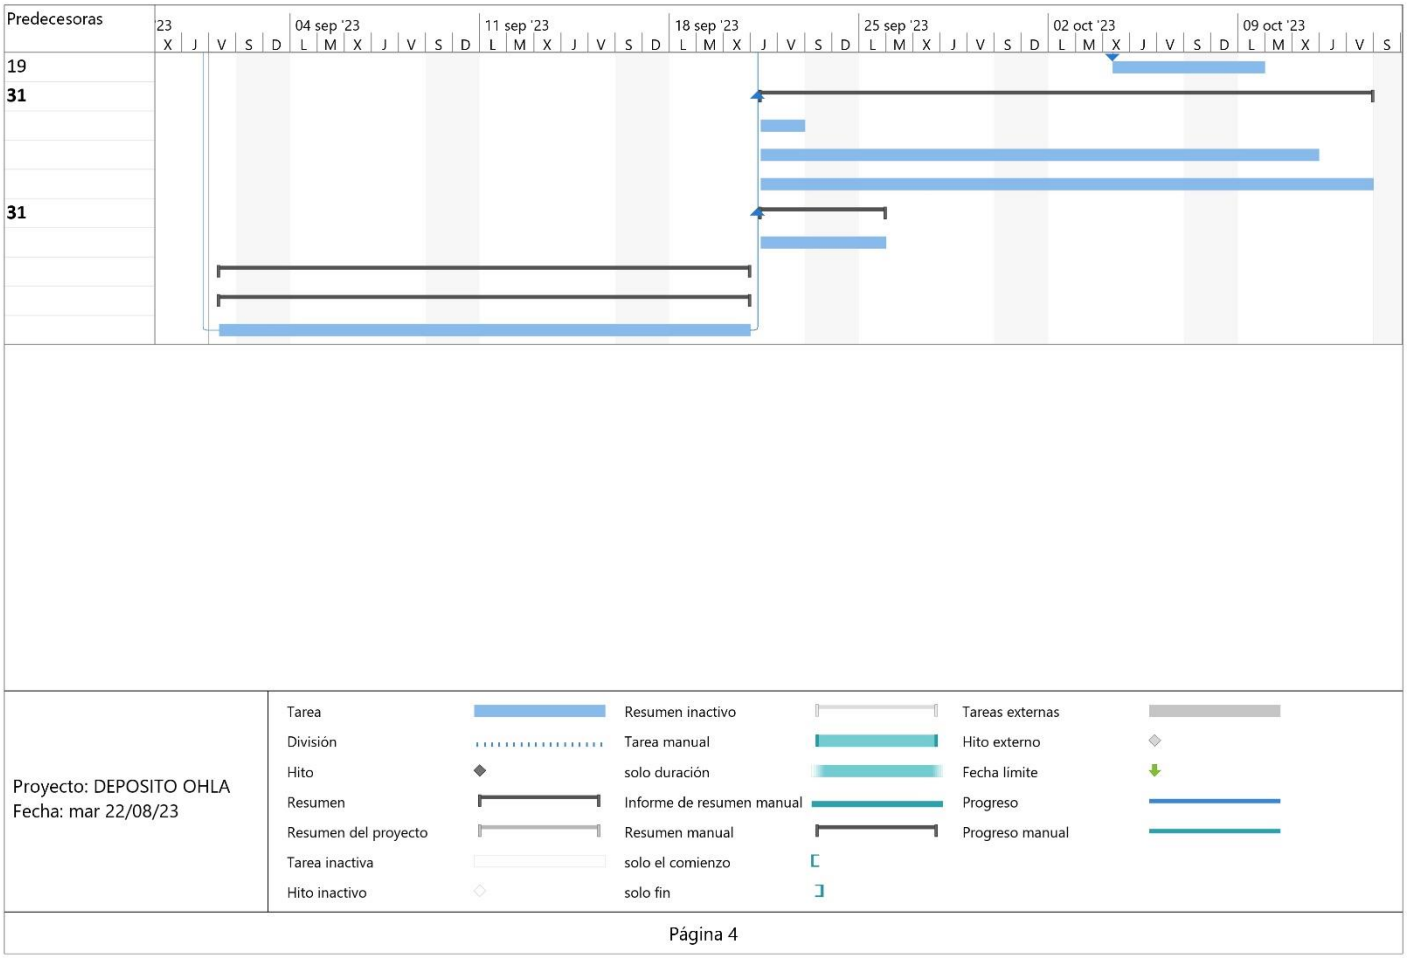
Predecesoras
23
04 sep '23
11 sep '23
18 sep '23
25 sep '23
02 oct '23
09 oct '23
19
31
31
Proyecto: DEPOSITO OHLA
Fecha: mar 22/08/23
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Página 4

INCOGEZYB

INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B SAC

RUC: 20541624644

PROFORMA DE LOS SEGUROS NECESARIOS

VALORA | CORREDORES DE SEGUROS

Paseo de la República Nº 5895 Piso 11 (edificio Leuro)- Miraflores
informes@valoraseguros.com
T: 01 7085729
www.valoraseguros.com

Estimado, INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B S.A.C.

De acuerdo con lo que nos solicitó y considerando la actividad que realiza su empresa, le enviamos nuestra mejor propuesta económica respaldada por SANITAS.

RUC	20541624644 - INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B S.A.C.
ACTIVIDAD	OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN
TASAS	SALUD 0.72 % / PENSIÓN 0.75 %
PRODUCTO	SCTR
VIGENCIA	01 MES
ASEGURADORA	SANITAS
TOTAL	S/. 391.15

Paso 1	Paso 2	Paso 3
Completar los datos de sus trabajadores en el formato adjunto (TRAMA)	Enviar la trama con los datos llenados a sebastian@valoraseguros.com	Confirmar el pago de la cotización (instrucciones indicadas en la parte inferior)

En Valora procesamos nuestros pagos con la empresa recaudadora KASHIO PERU S.A.C. para facilitar el pago. Puede pagar en:

Interbank BCP BBVA KASNET Scotiabank

Para realizar el pago por banca digital, seleccionar KASHIO PERU SAC, usando la opción Pago de Servicios, indicando su NÚMERO DE RUC como código de pago.

Para las instrucciones detalladas de pago puede ingresar aquí

INCOGEZYB

INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B SAC

RUC: 20541624644

DOCUMENTACION CONTRACTUAL (COMPROMISO DE CONSORCIO)

CONTRATO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO, QUE CELEBRAN DE UNA PARTE **INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B S.A.C.,** CON RUC N° 20541624644, CON DOMICILIO EN URBANIZACIÓN LOS CIPRECES MZ J LOTE 9 – NUEVO CHIMBOTE, SANTA ANCASH, REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL **CANO COLONIA JIM ROGELIO**, IDENTIFICADO CON DNI N° 32918801 SEGÚN INSCRITO EN LA PARTIDA N° 11057229 ASIENTO N° A00001, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA LOCALIDAD DE CHIMBOTE - SANTA - ANCASH, **GUPESA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.,** CON RUC N°20525625207, CON DOMICILIO EN MZ. S LOTE. 17 LOS CIPRECES NUEVO CHIMBOTE, SANTA ANCASH, REPRESENTA POR SU SUB GERENTE , **PEREZ MENDOZA DENNIS JOEL ,** IDENTIFICADO CON DNI N° 43416394, SEGÚN INSCRITO EN LA PARTIDA N°11081735 ASIENTO N° A0001, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA LOCALIDAD DE CHIMBOTE , SANTA , ANCASH, EN ADELANTE LOS CONSORCIADOS

PRIMERO. - ANTECEDENTES:

LOS CONSORCIADOS SON PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PRIVADO, CONSTITUIDAS BAJO EL REGIMEN DE EMPRESA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, DEDICADAS A LA EJECUCION, SERVICIOS Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES Y AFINES.

SEGUNDO. - PROMESA DE CONSORCIO:

LAS SOCIEDADES INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B S.A.C. Y GUPESA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C, CONVINIERON EN CONSORCIARSE A FIN DE PRESENTAR SU PROPUESTA PARA EJECUTAR EL " **SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN DEPÓSITO TEMPORAL DE RESIDUOS PARA LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA**" EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE – SANTA ANCASH, SOLICITADO POR OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ – OHLA, HABIENDO SUSCRITO PARA TALES EFECTOS UN COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE CONSORCIO CONDICIONADO A LA OBTENCIÓN DE LA BUENA PRO.

TERCERA. - DENOMINACION, DURACION Y DOMICILIO:

EL CONSORCIO QUE POR ESTE ACTO SE CONSTITUYE SE DENOMINA: "CONSORCIO NUEVO CHIMBOTE" EL MISMO QUE NO GENERARÁ UNA PERSONA JURÍDICA NUEVA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 438 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SU DURACIÓN QUEDA ESTABLECIDA POR EL PLAZO QUE REQUIERA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA LA LIQUIDACIÓN FINAL DE LOS TRABAJOS DEL SERVICIO, PAGANDO TODAS LAS OBLIGACIONES.

LAS PARTES FIJAN COMO SU DOMICILIO LEGAL Y PROCESAL DEL CONSORCIO NUEVO CHIMBOTE, EN LA URBANIZACIÓN LOS CIPRECES MZ. J LOTE 9 EN LA CIUDAD DE NUEVO CHIMBOTE – SANTA – ANCASH

CUARTA. - CONTABILIDAD Y TRIBUTACION

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA CONTABILIDAD REFERIDA A LA EJECUCION DE LA OBRA, SERA LLEVADA POR LA EMPRESA, INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B S.A.C, ASI MISMO ESTA EMPRESA EMITIRA LA FACTURACION CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ADELANTOS, VALORIZACIONES, LIQUIDACIONES Y OTROS CONCERNIENTES AL SERVICIO, EN TAL SENTIDO OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ – OHLA, EMITIRA LOS CHEQUES CORRESPONDIENTES A NOMBRE DE INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B S.A.C

QUINTA. - PARTICIPACION:

LOS OTORGANTES DEL PRESENTA INSTRUMENTO, CONVIENE DE MUTUO ACUERDO QUE LA PROPORCION EN AL CUAL PARTICIPAN TANTO EN DERECHOS, OBLIGACIONES, UTILIDADES, EN EL BENEFICIO DE LOS RESULTADOS DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONSORCIO SERÁ EL SIGUIENTE:

- **INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B S.A.C : 20%**
- **GUPESA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C : 80 %**

SEXTA. – OBLIGACIONES Y DERECHOS:

LAS OBLIGACIONES QUE CADA UNA DE LAS EMPRESAS ASUMIRÁN AL INTERIOR DEL CONSORCIO SON LAS SIGUIENTES:

1. CUMPLIR EL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO HASTA CULMINAR CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN LAS BASES Y EL CONTRATO DEL SERVICIO.
2. EL CONSORCIADO **INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B S.A.C** SE OBLIGA SU PARTICIPACIÓN:
   - EJECUCIÓN DE LA OBRA
   - ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA
   - FINANCIAMIENTO Y GARANTIAS
3. EL CONSORCIADO **GUPESA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C** SE OBLIGA SU PARTICIPACIÓN A:
   - EJECUCIÓN DE LA OBRA
   - LOGISTICA
4. EL CONSORCIO NEUVO CHIMBOTE SE OBLIGARÁ EN FORMA INEXCUSABLE DE RESPONDER POR LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO.

SÉPTIMA. – AUTONOMIA:

LAS SOCIEDADES OTORGANTES DEL PRESENTE CONSORCIO, MANTENDRÁ SU PROPIA AUTONOMÍA, CORRESPONDIENTE A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LE ENCARGARAN Y COMPROMENTEN A CUMPLIR; EFECTUANDO LOS CONSORCIADOS LAS COORDINACIONES QUE CORRESPONDAN.

OCTAVA.- ORGANIZACIÓN Y FACULTADES:

SE DESIGNA COMO REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO NUEVO CHIMBOTE A JIM ROGELIO CANO COLONIA, IDENTIFICADO CON DNI N°

32918801, QUIEN QUEDA FACULTANDO A SUSCRIBIR EL CONTRATO RESPECTIVO CON OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ – OHLA, EL REPRESENTANTE LEGAL COMÚN A SOLA FIRMA TENDRÁ LAS SIGUIENTE FACULTADES:

1. ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO PARA TODOS LOS ACTOS REFERIDOS A PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, DESCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO, CON PODERES SUFICIENTES, PARA EJECUTAR LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN EN CALIDAD DE POSTOR Y DE CONTRATISTA HASTA LA CONFORMIDAD O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN CORRESPONDA.
2. ORGANIZAR LA GESTIÓN DEL CONSORCIO AUTORIZANDO Y VIGILANDO LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISANDO LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.
3. ESTÁ FACULTADO PARA COBRAR HACER EFECTIVO TODOS LOS PAGOS Y COBROS A FAVOR DEL CONSORCIO, PARA COBRAR SUMAS DE DINERO, EN EFECTIVO O EN CHEQUES Y EN ESTE ÚLTIMO CASO PODRÁ ENDOSAR LOS CHEQUES O HACERLOS EFECTIVO EN LOS BANCOS QUE CORRESPONDAN, O EN CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA, TANTO LOCALES COMO A NIVEL NACIONAL.
4. ORDENAR PAGOS Y COBROS
5. ORGANIZAR Y DIRIGIR EL ÁREA TÉCNICA EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE SERVICIO
6. EJERCERÁ SUS FACULTADES EN CUALQUIER ACTO NO PREVISTO, SIENDO ESTOS ABSOLUTAMENTE VÁLIDOS, POR CUANTO SE TRATA DE FACULTADES ENUNCIATIVAS Y NO LIMITADAS, PUDIENDO DESEMPEÑAR LA FUNCIÓN DE LA MISMA SIN SER OBJETADO DE INSUFIIENTE.
7. SE DESAJ CONSTANCIA EXPRESA QUE POR SU NATURALEZA TEMPORAL Y SU ESENCIA JURIDICA NO SE REQUIERE LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL.
8. DELEGAR FACULTADES A QUIEN CONSIDERE CONVENIENTE.

NOVENA. – CESIÓN Y PÉRDIDA DE LAS PARTICIPACIONES:

LOS CONSORCIADOS ESTABLECEN DE MUTUO ACUERDO QUE LAS PATICIPACIONES QUE POSEEN EN ESTE CONSORCIO Y QUE SE SEÑALAN EN LA CLÁUSULA QUINTA NO PODRÁN SER CEDIDAS NI TRASPASADAS A TERCEROS.

ESTANDO LAS PARTES CONFORMES CON LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE DOCUMENTO, LO SUSCRIBEN EN SEÑAL DE CONFORMIDAD Y PARA LO CUAL CUMPLEN CON LEGALIZAR SUS FIRMAS ANTE EL NOTARIO PÚBLICO, A LOS 31 DÍAS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.

CONSORCIADO 1
CANO COLONIA JIM ROGELIO
DNI N° 32918801


CONSORCIADO 2
PEREZ MENDOZA DENNIS JOEL
DNI N° 43416394

INCOGEZYB

INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B SAC

RUC: 20541624644

DNI REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO NUEVO CHIMBOTE

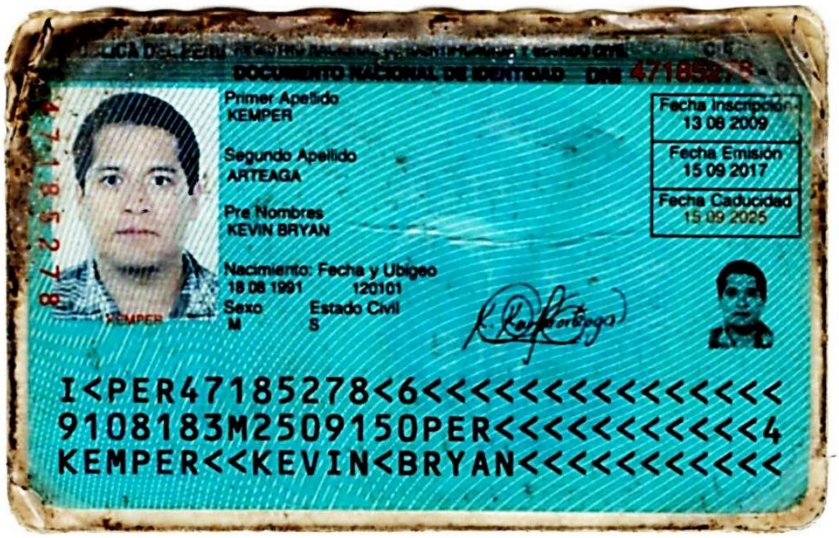



INCOGEZYB

INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B SAC

RUC: 20541624644

VIGENCIA DE PODER

INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B S.A.C.

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL Nº VII - SEDE HUARAZ
Oficina Registral de CHIMBOTE

Código de Verificación:
67191791
Solicitud N° 2023 - 564662
28/01/2023 13:01:13

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, **CERTIFICA**:

Que, en la partida electrónica N° 11057229 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de CHIMBOTE, consta registrado y vigente el **nombramiento** a favor de CANO COLONIA, JIM ROGELIO, identificado con DNI. N° 92918801 , cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B S.A.C.
LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS
ASIENTO: A00001
CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:
°: RÉGIMEN DE LA GERENCIA: La Junta General de socios puede designar uno o más Gerentes y/o uno o más Sub Gerentes. Sus facultades, remoción y responsabilidades se sujetan a lo dispuesto por los artículos 185°, 186°, 187°, 188° y 190° de la Ley General de Sociedades. **Facultades: El Gerente General está facultado para la ejecución de todo acto y/o contrato correspondientes al objeto de la sociedad**, pudiendo realizar adicionalmente y firmar los siguientes actos y contratos: [...].
B) EN EL ORDEN CONTRACTUAL:
1. Suscribir contratos de suministro.
2. Suscribir contratos de prestación de servicios, en cualquiera de sus modalidades ya sean de locación de servicios, obra, mandato, depósito o secuestro. Intervenir en licitaciones, apertura de sobres y concursos de precios nacionales e internacionales y en cualquier acto, como postor representando a la empresa, aceptando y firmando el contrato de la buena pro y todo tipo de documentación inherente a tales actos, presupuestos, fianzas, adelantos, garantías, contratos de ejecución de obras y otros.
3. Suscribir convenios arbitrales, de cualquier naturaleza administrativa judicial.
4. Suscribir contratos de seguros de cualquier naturaleza recibir las indemnizaciones derivadas de tales contratos y transigir los siniestros que pudiera sufrir la compañía.
5. Suscribir contratos nominados o innominados, civiles o mercantiles y realizar cualquier clase de trámites y gestiones bancarias y financieras, sin restricción alguna, necesarios para la marcha y desarrollo del objeto de la sociedad.
C) EN EL ORDEN BANCARIO Y FINANCIERO:
1. Celebrar, firmar contratos privados y/o escrituras públicas en moneda nacional o extranjera y ejecutar los siguientes actos:
2. Ordenar y recibir pagos en efectivo y/o con otros medios de pago inclusive títulos valores; y otorgar los respectivos recibos y cancelaciones.
3. Girar cheques ya sea sobre saldos deudores (en sobregiros) o acreedores, cobrar cheques en efectivo, por caja y/o endosar cheques para su abono en cuenta de la sociedad o a favor de terceros.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

Urb. Los Cipreces Mz. J Lote. 9, Nuevo Chimbote - Santa - Ancash
Teléfono: 043 777768 – Celular: 999760033 - 969759806
Email: incogezyb@gmail.com

INCOGEZYB

INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B SAC

RUC: 20541624644

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL Nº VII - SEDE HUARAZ
Oficina Registral de CHIMBOTE

Código de Verificación:
67191791
Solicitud N° 2023 - 564662
28/01/2023 13:01:13

4. Girar, emitir, aceptar, endosar, cobrar, avalar, afianzar, renovar, incluir cláusulas de prórroga y/o descantar letras de cambio, pagarés, facturas conformadas, warrants, títulos de crédito hipotecario y cualquier otro título valor.
5. Endosar certificados de depósito, certificados en monedas extranjeras o nacional, conocimientos de embarque, pólizas de seguros y/o warrants, así como cualquier otro título valor o documento comercial o de crédito transferible, depositar y retirar valores mobiliarios en custodia; asimismo gravarlos y enajenarlos.
6. Realizar cualquier operación bancaria, inclusive la apertura, retiro y/o cierre de cuentas corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de custodia y/o depósitos, depositar o retirar fondos, girar contra las cuentas, girar sobregiros, solicitar y abrir cartas de crédito, solicitar cartas de fianzas bancarias, celebrar contratos de arrendamiento financiero o "leasing", "lease back", factoring y/o underwriting. mutuos dinerarios en todas sus modalidades, descuentos, anticipos en forma individual y/o mediante líneas de crédito. Observar estados de cuenta corriente, así como solicitar información sobre operaciones realizadas en cuentas y/o depósitos de la sociedad.
7. Efectuar cobros de giros y transferencias, efectuar cargos y abonos en cuentas, efectuar pagos de transferencias y otorgar cancelaciones y recibos.
8. Celebrar contratos de compra venta, promesa de compra venta y/o opciones, pudiendo vender y/o comprar bienes inmuebles y/o muebles, incluyendo acciones, bonos y demás valores mobiliarios, así como realizar operaciones de reporte respecto de estos últimos, permuta, forward, swap.
9. Celebrar contratos de préstamos, mutuos, arrendamiento, dación en pago, fideicomiso, fianza o carta fianza, comodato, uso, usufructo, opción, cesión de derechos y de posición contractual; tanto en manera activa como pasiva, para la adquisición, disposición y gravamen de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluyendo el alquiler y posterior manejo de cajas de seguridad; así como cualquier tipo de contrato bancario; así como acordar la validez de las transferencias electromecánicas de fondos, por facsímil u otros medios similares, entre cuentas propias o a favor de terceros, con cualquier entidad bancaria o financiera.
10. Prestar aval y otorgar fianza a nombre de la sociedad, a favor de la sociedad, del mismo representante y/o de terceros; así como constituir garantía mobiliaria o hipoteca o gravar de cualquier forma los bienes muebles o inmuebles de la sociedad a favor del mismo representante y/o terceros, pudiendo afectar cuentas, depósitos, títulos valores o valores mobiliarios en garantía, inclusive en fideicomiso en garantía.
11. Celebrar contratos de créditos en general, ya sea crédito en cuenta corriente, crédito documentario, préstamos, mutuos, tarjetas de crédito, advance account, factoring y otros que constituyan créditos directos o indirectos bajo cualquier otra modalidad; así como ceder derechos y créditos.
12. Constituir garantís reales sobre bines de propiedad de la sociedad, bajo la modalidad de garantía, hipoteca y otras que permita la ley, con facultad de solicitar ellas la emisión de títulos valores con anotación de cuentas como warrants o títulos de crédito hipotecario negociables.

D) FACULTADES ESPECIALES:

Otorgar poder para pleitos, otorgar poderes, laboral, sustituir y delegar parcialmente, sustituir y delegar totalmente y revocarlos cuando crea conveniente a los intereses de la empresa, para la representación en juicio o fuera de él con las atribuciones generales del mandato y las especiales contenidas en el Art. 74 y 75 del Código Procesal Civil, que fueren necesarias, en favor de terceras personas, cuantas veces lo crea conveniente.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE ..A PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

Urb. Los Cipreces Mz. J Lote. 9, Nuevo Chimbote - Santa - Ancash
Teléfono: 043 777768 – Celular: 999760033 - 969759806
Email: incogezyb@gmail.com

INCOGEZYB

INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B SAC

RUC: 20541624644

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL Nº VII - SEDE HUARAZ
Oficina Registral de CHIMBOTE

Código de Verificación:
67191791
Solicitud N° 2023 - 564662
28/01/2023 13:01:13

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:
CONSTITUIDA POR ESCRITURA PÚBLICA DEL 09/01/2012 OTORGADA ANTE NOTARIO EDUARDO PASTOR LA ROSA EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE.

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

III. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 3

Derechos Pagados: 2023-99999-205210 S/ 30.00
Tasa Registral del Servicio S/ 30.00

Verificado y expedido por AGUILAR MEDINA, SANDRA LIZETH, Abogado Certificador de la Oficina Registral de Chimbote, a las 09:00:04 horas del 30 de Enero del 2023.

Sandra Lizeth Aguilar Medina
ABOGADO CERTIFICADOR
Zona Registral Nº VII Sede Huaraz

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE ..A PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

Urb. Los Cipreces Mz. J Lote. 9, Nuevo Chimbote - Santa - Ancash
Teléfono: 043 777768 – Celular: 999760033 - 969759806
Email: incogezyb@gmail.com

INCOGEZYB

INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B SAC

RUC: 20541624644

VIGENCIA DE PODER

GUPESA

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL Nº VII - SEDE HUARAZ
Oficina Registral de CHIMBOTE

Código de Verificación:
95405320
Solicitud N° 2022 - 7785076
26/12/2022 21:58:26

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, **CERTIFICA**:

Que, en la partida electrónica N° 11081735 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de CHIMBOTE, consta registrado y vigente el **nombramiento** a favor de PEREZ MENDOZA, DENNIS JOEL, identificado con DNI. N° 43416394 , cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GUPESA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.
LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS
ASIENTO: A00001
CARGO: SUB-GERENTE

FACULTADES:
RÉGIMEN DE LA GERENCIA: El Gerente General y el Sub Gerente de forma indistinta y a sola firma, tendrán las siguientes facultades:

1) LA EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.
2) EL NOMBRAMIENTO Y LA CONTRATACIÓN DE EMPLEADOS Y OBREROS, FIJÁNDOLES SUS REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES.
3) SUPERVISAR Y CONTROLAR LA CONTABILIDAD FIRMANDO LOS BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y DEMÁS DOCUMENTOS CONTABLES Y FINANCIEROS; DIRIGIR LA CORRESPONDENCIA.
4) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES POLÍTICA, ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES, MUNICIPALES, POLICIALES, MILITARES, DE SEGURIDAD SOCIAL, ADUANAS, EN GENERAL DE CUALQUIER NATURALEZA, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA Y EN TODO PROCESO JUDICIAL, ARBITRAL, ADMINISTRATIVO, POLICIAL, MILITAR O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA CON LAS FACULTADES GENERALES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y CON LAS FACULTADES ESPECIALES CONTENIDAS EN EL ART. 74º Y 75º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y LO DISPUESTO EN LA LEY Nº 26539 Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES SOBRE REPRESENTACIÓN DE UNA SOCIEDAD, PARA LOS EFECTOS DE RECONOCIMIENTO, CELEBRACIÓN DE CONCILIACIONES, ALLANAMIENTO A LA DEMANDA DECLARACIÓN DE PARTE Y DEMÁS ACTOS PROCESALES ANTE LOS FUEROS ADMINISTRATIVOS Y PRIVADOS DE TRABAJO.

5) **EN LO FINANCIERO TIENE LAS SIGUIENTES FACULTADES.**
CONTRATOS: PARA CELEBRAR CONTRATOS EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA DE:
A. CRÉDITOS EN GENERAL.
B. CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE.
C. CRÉDITOS DOCUMENTARIOS.
D. PRÉSTAMOS O MUTUOS.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE „A PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

Urb. Los Cipreces Mz. J Lote. 9, Nuevo Chimbote - Santa - Ancash
Teléfono: 043 777768 – Celular: 999760033 - 969759806
Email: incogezyb@gmail.com

INCOGEZYB

INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B SAC

RUC: 20541624644

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL Nº VII - SEDE HUARAZ
Oficina Registral de CHIMBOTE

Código de Verificación:
95405320
Solicitud N° 2022 - 7785076
26/12/2022 21:58:26

E. ADVANCE ACCOUNTS.
F. LEASING (ARRENDAMIENTO FINANCIERO), LEASE BACK.
G. SOLICITAR CARTAS FIANZAS PROPIAS.
H. SOLICITAR CARTAS FIANZAS A FAVOR DE TERCEROS.
I. SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS Y AVALES.
J. ABRIR CARTAS DE CRÉDITO.
K. ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CUENTAS A PLAZOS, ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CUENTAS DE AHORROS.
L. DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES EN CUSTODIA.
M. COMPRAR MUEBLES, VENDER MUEBLES, COMPRAR INMUEBLES, VENDER INMUEBLES, VENDER LOTES DE TERRENO QUE RESULTEN DE LAS HABILITACIONES URBANAS QUE EJECUTE LA EMPRESA, COMPRAR Y VENDER VEHÍCULOS, GRAVAR CON HIPOTECA O PRENDA LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS, Y EN GENERAL CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS VINCULADOS AL OBJETO SOCIAL.
N. ALQUILAR Y OPERAR CAJAS DE SEGURIDAD.
O. HIPOTECAR, PRENDAR.
P. AFECTAR CUENTAS O DEPÓSITOS EN GARANTÍA, AFECTAR TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA.
Q. PRESTAR AVALES.
R. OTORGAR FIANZA.
S. ENDOSAR WARRANTS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS, PÓLIZAS DE SEGUROS.
T. COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.
U. DAR Y TOMAR ARRIENDO DE MUEBLES, DAR Y TOMAR ARRIENDO DE INMUEBLES.
V. OTORGAR FIANZAS A FAVOR DE SI MISMO.
W. CEDER CRÉDITOS.
X. CHEQUES: PARA COBRAR CHEQUES, GIRAR CHEQUES SOBRE SALDOS DEUDORES, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA DE LA EMPRESA, GIRAR SOBRE SALDOS ACREEDORES, ENDOSAR A TERCEROS.
Y. LETRAS Y PAGARÉS: PARA GIRAR LETRAS, ACEPTAR LETRAS, ENDOSAR LETRAS, AVALAR LETRAS, DESCONTAR LETRAS, RENOVAR LETRAS, PROTESTAR LETRAS, EMITIR PAGARÉS, ENDOSAR PAGARÉS, AVALAR PAGARÉS, DESCONTAR PAGARÉS, RENOVAR PAGARÉS, PROTESTAR PAGARÉS.
Z. COBRANZAS Y PAGOS: PARA COBRAR GIROS Y TRANSFERENCIAS, REALIZAR CARGOS, ABONOS EN CUENTAS Y PAGOS DE TRANSFERENCIAS.

6) OTORGAR PODERES Y RENOVARLOS CUANDO CREA CONVENIENTE A LOS INTERESES DE LA EMPRESA, PARA LA REPRESENTACIÓN EN JUICIO O FUERA DE ÉL CON LAS ATRIBUCIONES GENERALES DEL MANDATO Y LAS ESPECIALES CONTENIDAS EN EL ART. 74º Y 75º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, QUE FUERAN NECESARIAS, A FAVOR DE TERCERAS PERSONAS CUANTAS VECES LO CREA CONVENIENTE.
7) SUSTITUIR PARCIAL Y/O TOTALMENTE EL PODER QUE LE CONFIERE CUANTAS VECES LO ESTIME CONVENIENTE A LOS INTERESES DE LA EMPRESA.
8) DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE SU REPRESENTACIÓN ANTE AUTORIDADES

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE ..A PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

Urb. Los Cipreces Mz. J Lote. 9, Nuevo Chimbote - Santa - Ancash
Teléfono: 043 777768 – Celular: 999760033 - 969759806
Email: incogezyb@gmail.com

INCOGEZYB

INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B SAC

RUC: 20541624644

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL Nº VII - SEDE HUARAZ
Oficina Registral de CHIMBOTE

Código de Verificación:
95405320
Solicitud N° 2022 - 7785076
26/12/2022 21:58:26

JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS Y ASUMIR SU REPRESENTACIÓN CUANDO LO CREA CONVENIENTE A LOS INTERESES DE LA EMPRESA.

9) NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA EMPRESA EN CUALQUIER CUESTIÓN DE ORDEN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA Y PARA EL EFECTO OTORGAR, AMPLIAR, DELEGAR, SUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE Y REVOCAR LAS FACULTADES OTORGADAS. EL NOMBRAMIENTO DE APODERADO PODRÁ EFECTUARSE MEDIANTE CARTA PODER, PODER FUERA DE REGISTRO Y POR ESCRITURA PÚBLICA, CON LAS FACULTADES PARA SU USO DENTRO O FUERA DEL PAÍS CON LAS ATRIBUCIONES GENERALES DEL MANDATO Y LAS ESPECIALES CONTENIDAS EN ART. 74º Y 75º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL QUE FUERAN NECESARIAS A FAVOR DE TERCERAS PERSONAS CUANTAS VECES LO CREA CONVENIENTE.
10) INTERVENIR EN LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS DE PRECIOS, FIRMANDO Y PRESENTANDO LOS DOCUMENTOS NECESARIOS Y EL CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO.
11) PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, DESDE LA ADQUISICIÓN DE BASES PASANDO POR LA PRESENTACIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES, PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, APELACIONES, QUEJAS, FIRMA DE CONTRATO RESPECTIVO Y EJECUCIÓN DEL MISMO. EL GERENTE GENERAL PODRÁ NOMBRAR A UN REPRESENTANTE CON LAS FACULTADES ESPECÍFICAS DE PRESENTACIÓN DE LOS SOBRES CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.
12) CONTRATAR CONSIGO MISMO O CON SU SOCIEDAD CONYUGAL EN CASO DE SER CASADO; Y EN GENERAL CELEBRAR CUALQUIER CONTRATO, ACTO O GESTIÓN CIVIL O COMERCIAL QUE SEA NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES EMPRESARIALES, AUNQUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE INCLUIDOS EN ESTA RELACIÓN, PUES LA MISMA NO ES TAXATIVA SINO MERAMENTE ILUSTRATIVA.

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:
CONSTITUIDA POR ESCRITURA PÚBLICA DEL 16/01/2015, MODIFICADA POR LA DEL 22/01/2015, AMBAS OTORGADAS ANTE NOTARIO GUSTAVO ADOLFO MAGAN MAREOVICH EN LA CIUDAD DE NUEVO CHIMBOTE.

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

III. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE ..A PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

Urb. Los Cipreces Mz. J Lote. 9, Nuevo Chimbote - Santa - Ancash
Teléfono: 043 777768 – Celular: 999760033 - 969759806
Email: incogezyb@gmail.com

INCOGEZYB

INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B SAC

RUC: 20541624644

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL Nº VII - SEDE HUARAZ
Oficina Registral de CHIMBOTE

Código de Verificación:
95405320
Solicitud N° 2022 - 7785076
26/12/2022 21:58:26

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 4

Derechos Pagados: 2022-99999-2776549 S/ 28.00
Tasa Registral del Servicio S/ 28.00

Verificado y expedido por BUENO BEDON, DIANA CAROLINA, Abogado Certificador de la Oficina Registral de Chimbote, a las 10:35:16 horas del 27 de Diciembre del 2022.

Diana Carolina Bueno Bedon
ABOGADO CERTIFICADOR
Zona Registral N° VII - Sede Huaraz

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL. FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE ..A PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

Urb. Los Cipreces Mz. J Lote. 9, Nuevo Chimbote - Santa - Ancash
Teléfono: 043 777768 – Celular: 999760033 - 969759806
Email: incogezyb@gmail.com

INCOGEZYB

INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B SAC

RUC: 20541624644

CUADRO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR (GUPESA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C)

EXPERIENCIA: GUPESA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	MESES
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO AL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL BELLAMAR SECTOR IV, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, SANTA, ANCASH, CODIGO UNICO N° 2062213.	3
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°029-2022-MPH/GM	3
CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL(LA) IE 269 - CARAZ , IE 86483 CONSTANTINO PEDRO JARAMILLO - CARAZ, IE 692 - PAMPAROMAS, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA HUAYLAS, DEPARTAMENTO ANCASH, CON CUI 2464935	2
EJECUCION DE LA OBRA "REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL (LA) IE 89009 8 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH"	3
EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL PARQUE PAUL HARRIS EN EL MZ. E DEL P.J. EL ACERO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"	2
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS JOSE OLAYA, EN EL P.H.U. JAVIER HERAUD DEL DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH¿, CON C.U.I. N° 2523024	3
MEJORAMIENTO DE ORNATO PÚBLICO DEL PARQUE SANTA ROSA, CALLE MÁNCORA Y PASAJE MIRAMAR DEL DISTRITO DE CULEBRAS, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH	2
Contrato de Obra " Creacion de la Plazoleta del C.P de cachubamba ,distrito de Bolognesi ,provincia de Pallasca-Ancash"	4
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CREACIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE MZ 103 LOTE 1, H.U.P. NICOLAS GARATEA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTEPROVINCIA DE SANTA ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CÓDIGO ÚNICO 2446718	5
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO EN EL (LA) U.P. BELLAMAR SECTOR IV PRIMERA ETAPA MZ. E1 LTE 2, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	5
CREACION DEL PARQUE CENTRAL EN LA U.P.I.S. LOS JARDINES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE	3
CONSTRUCCIÓN DE COBERTORES EN EL (LA) I.E. 88025 COISHCO, DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA DE SANTA,	2
REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO EN EL (LA) EL AMAUTA, URB. LADERAS DEL NORTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	2
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H SOLIVIN DEL C.P SAN JACINTO DEL DISTRITO DE NEPEÑA PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH, I ETAPA	4
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88218 TANGAY MEDIO , DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE , PROVINCIA DEL SANTA -ANCASH- SALDO DE OBRA	5
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CENTRO POBLADO LA CALETA LOS CHIMUS DISTRITO DE SAMANCO SANTA ANCASH	4
Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COLISEO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS - PALLASCA - ANCASH - I ETAPA	9
MEJORAMIENTO DE LA LOSA MULTIUSO EL POZO E N EL BARRIO SAN MARTIN DEL C.P SAN JACINTO, DISTRITO DE NEPEÑA -SANTA - ANCASH, I ETAPA	5
TOTAL DE MESES	**66**

INCOGEZYB

INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B SAC

RUC: 20541624644

ACTAS DE RECEPCION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
CHIMBOTE

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA	*: "REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL (la) U.P BELLAMAR SECTOR IV PRIMERA ETAPA MZ E1 LOTE 2 DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH"*
MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA	*: CONTRATA — A SUMA ALZADA*
PROCESO DE SELECCION	*: AS N° 005-2020-MPS.1*
MONTO REFERENCIAL	*: S/ 795,410.92 Soles*
MONTO CONTRACTUAL	*: S/ 715,869.83 Soles*
EMPRESA EJECUTORA	*: CONSORCIO DEPORTIVO BELLAMAR*
CONTRATO DE OBRA	*: N° 057-2020.GM-MPS.*
RESIDENTE DE OBRA	*: ING. CIRILO LINO OLASCUAGA CRUZADO - Reg. CIP N° 84640*
SUPERVISION	*: ING. CESAR CLODOMIRO VILLEGAS PUENTE - Reg. CIP N° 16390*
FECHA DE CONTRATO	*:30/10/2020*
REDUCCION DE PRESTACION DE OBRA N°01 CON IGV	*: S/ 2,748.46*
REDUCCION DE PRESTACION DE OBRA N°02 CON IGV	*: S/ 3,928.99*
INTERESES CON MORA CON IGV	*: -*
MAYORES GASTOS GENERALES PRORROGA PLAZO CON IGV	*: -*
ADELANTO DIRECTO 10% CON IGV Y FECHA DE PAGO	*:NO SOLICITADO*
ADELANTO DIRECTO 10% SIN IGV Y FECHA DE PAGO	*:NO SOLICITADO*
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO	*: 14/11/2020*
ADELANTO DE MATERIALES CON IGV FECHA DE PAGO	*:NO SOLICITADO*
FECHA DE INICIO DE OBRA	*: 15/11/2020*
PLAZO DE EJECUCION	*:75 DIAS CALENDARIOS*
FECHA DE TERMINO DE OBRA PROGRAMADA	*:28/01/2021*
APROVACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION	*: RGM N°061-2020-GM-MPS DEL 10 DE FEBRERO 2020*
APROBACION EXPEDIENTE TECNICO	*: RGM N°009-2020-GM-MPS DEL 9 DE ENERO 2020*
APROBACION EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZACO	*: RGI N°107-2020-GI-MPS DEL 24 DE JULIO DEL 2020*
AMPLIACION DE PLAZO	*: -*
FECHA TERMINO DE OBRA REAL	*: 09/04/2021*
CONDICION DE LA OBRA	***:CULMINADA***

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
Ing. Jesus Rodriguez Fuentes
GERENTE

MUNICIPALIDAD PROV. DEL SANTA GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
Ing. Santos A. Apolinar Rojas
SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TECNICOS

*En el U.P Bellamar, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, Región Ancash, a los 28 días del mes de mayo del 2021, siendo las 3:30 p.m., nos constituimos en el lugar de intervención de la obra en el campo deportivo, para iniciar el recorrido y verificar el levantamiento de observaciones del Acta de Observaciones de fecha 11 de Mayo del 2021 de la Obra: **"REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL (LA) U.P BELLAMAR SECTOR IV PRIMERA ETAPA MZ E1 LOTE 2 DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH";** en merito a la Resolución Gerencial N° 154-2021-GM-MPS, de fecha 21 de abril del 2021, a través del cual se conformó el Comité de Recepción de Obra, integrado por los siguientes miembros: **Presidente,** ING. JESUS RAFAEL RODRIGUEZ FUENTES con Reg. CIP N° 60044; **Primer Miembro,** ING. SANTOS ALONSO APOLINAR ROJAS con Reg. CIP N° 86357; **Asesor Técnico,** ING. CESAR CLODOMIRO VILLEGAS PUENTE con - Reg. CIP N° 16390; y de parte de la Empresa CONSORCIO DEPORTIVOBELLAMAR **el Representante Legal** Sr. JERSON A. GASTAÑADUI TRUJILLO con DNI N° 45752491 y el **Residente de Obra** ING. CIRILO LINO OLASEUAGA CRUZADO con Reg. CIP N° 84640.*

*Luego de realizar el recorrido por la obra: **"REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL (LA) U.P BELLAMAR SECTOR IV PRIMERA ETAPA MZ E1 LOTE 2 DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH"** y verificar cada una de las observaciones planteadas en el pliego anterior se pudo evidenciar lo siguiente:*

CONSORCIO DEPORTIVO BELLAMAR
Jerson Antony Gastañadui Trujillo
REPRESENTANTE COMUN

Cirilo Lino Olascuaga Cruzado
INGENIERO CIVIL CIP: 84640
RESIDENTE DE OBRA

Ing. César C. Villegas Puente
CIP. N° 16390
SUPERVISOR DE OBRA

JR. ENRIQUE PALACIOS N° 341 – 343 ☎ 321331 – 346946
CHIMBOTE - PERU

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
CHIMBOTE

OBSERVACIONES REALIZADAS:

01.	**Gradería tipo 1:** Corregir la unión del adoquinado con sardinel.	LEVANTADO
02.	**Gradería tipo 3 norte:** Se observa al lado de la gradería corrección de adoquinado con respecto al nivel del sardinel.	LEVANTADO
03.	**Gradería tipo 3 norte:** Corregir el último paso (el ancho)	LEVANTADO
04.	**Gradería tipo 3 norte:** En la primera grada se observa una fisura en el concreto	LEVANTADO
05.	**Gradería tipo 4:** Corregir fisura en primera grada, segunda grada y al lado de la junta central	LEVANTADO
06.	**Estrado entre tribunas tipo 4:** Sellar fisura	LEVANTADO
07.	**Gradería tipo 4**: Corregir fisuras del lado izquierdo del estrado	LEVANTADO
08.	**Gradería tipo 3:** Corregir el ancho del último paso y la dimensión longitudinal como corresponde en el plano del expediente técnico (14.04 m) siendo 13.91 m la medida encontrada en la obra.	LEVANTADO
09.	**SS.HH. Varones:** Corregir pintura	LEVANTADO
10.	**Gradería tipo 2:** Corregir ultima gradería, limpiar rebaba en gradería, corregir fisuras y sellar porosidades.	LEVANTADO
11.	**Piso de adoquín:** Corregir los niveles de los adoquines con los sardineles.	LEVANTADO
12.	**SS.HH. Damas**: Se observa que falta banca y tapas de inodoros.	LEVANTADO
13.	**SS.HH. Damas (deposito):** Asegurar la chapa y corregir tarrajeo.	LEVANTADO
14.	**SS.HH. Varones:** Faltan banca	LEVANTADO
15.	**SS.HH. Varones:** Tubo del urinario debe empotrarse en pared (tal como indica en plano) y falta tapa de inodoro.	LEVANTADO

MUNICIPALIDAD PROV. DEL SANTA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Santos A. Apolinar Rojas
SUB GERENTE DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TECNICOS

Teniendo en cuenta que con fecha 11 de mayo del 2021, se suscribió el Acta de Observaciones, conteniendo 15 ítems, las mismas que fueron levantadas y/o subsanadas de acuerdo a los plazos de Ley.

Luego de realizar la verificación se procedió a la Recepción de la Obra antes mencionada, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF.

De acuerdo al Art. 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, se estipula que, en el caso de obras, el plazo de responsabilidad del Contratista no puede ser inferior a (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total.

*El comité luego de verificar los trabajos efectuados por la Empresa CONSORCIO DEPORTIVO BELLAMAR y Al término de la diligencia da por **RECEPCIONADA LA OBRA** y en señal de conformidad se suscribe la presente Acta de Observaciones, firmando ambas partes:*

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Jesús Rodríguez Fuentes
GERENTE

CONSORCIO DEPORTIVO BELLAMAR
Jerson Antony Gastañaduí Trujillo
REPRESENTANTE COMUN

Cirilo Lino Olascuaga Cruzado
INGENIERO CIVIL CIP: 84640
RESIDENTE DE OBRA

Ing. César C. Villegas Puente
CIP. Nº 16390
SUPERVISOR DE OBRA

JR. ENRIQUE PALACIOS N° 341 – 343 ☎ 321331 – 346946
CHIMBOTE - PERU

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
CHIMBOTE

Por parte de la ***MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA:***

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Jesús Rodríguez Fuentes
GERENTE

ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESIDENTE

MUNICIPALIDAD PROV. DEL SANTA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Santos A. Apolinar Rojas
SUB GERENTE DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TECNICOS

ING. SANTOS A. APOLINAR ROJAS
SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS
PRIMER MIEMBRO

Ing. César C. Villegas Puente
CIP. N° 16390
SUPERVISOR DE OBRA

ING. CESAR C. VILLEGAS PUENTE
SUPERVISOR DE OBRA
ASESOR TECNICO

Por la EMPRESA ***CONSORCIO DEPORTIVO BELLAMAR***

CONSORCIO DEPORTIVO BELLAMAR
Jerson Antony Gastañadui Trujillo
REPRESENTANTE COMUN

SR. JERSON A. GASTAÑADUI TRUJILLO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DEPORTIVO BELLAMAR

Cirilo Lino Olascuaga Cruzado
INGENIERO CIVIL CIP: 84640
RESIDENTE DE OBRA

ING. CIRILO L. OLASCUAGA CRUZADO
RESIDENTE DE OBRA

JR. ENRIQUE PALACIOS N° 341 – 343 ☎ 321331 – 346946
CHIMBOTE - PERU

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS

"Generando Bienestar y Desarrollo"

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

Obra	:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COLISEO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PALLASCA – ANCASH – I ETAPA"
Monto Contractual	:	S/. 4,757,637.27 Soles.
Modalidad	:	Contrata – A suma alzada.
Ejecuta	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS.
Contratista	:	"CONSORCIO COLISEO PAMPAS"
Supervisión	:	Ing. VALDEMAR CESAR VERA VASQUEZ
Jefe Superv. Obra	:	Ing. MANUEL FREDEGUNDO SALCEDO CAMPOS
Residente de obra	:	ing. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
Plazo Ejec. Prog.	:	240 días calendarios.
Inicio de obra	:	13 de Noviembre del 2017.
Fin de obra prog.	:	10 de Julio del 2018.
Fin de obra real	:	07 de Noviembre del 2018.
Plazo de ejec. Real	:	360 días calendario.

En el Centro Poblado de Pampas, Distrito de Pampas, Provincia de Pallasca, Región Ancash; Siendo las 09:10 horas del día 27 de Noviembre del 2018, se constituyeron en el lugar donde se ejecutó la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COLISEO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PALLASCA – ANCASH – I ETAPA"; de una parte por La Municipalidad Distrital de Pampas, el Comité de Recepción de Obra designado mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 218-2018-MDP/A, de fecha 12.11.2018, integrada por:

- Ing. Edinson Geovanni Sánchez Villafana (Gerente de Infraestructura) : Presidente
- Srta. Thalia Yeni Llauri León (Administradora de MDP) : Primer Miembro
- Ing. Manuel Fredegundo Salcedo Campos (Jefe Supervisión de Obra): Segundo Miembro

Y de la otra parte el ejecutor de la obra "CONSORCIO COLISEO PAMPAS", representado por:

- Sr. Frabcis Jesus Gutierrez Mejia : Representante Legal
- Ing. Roberto Carlos Flores Villanueva : Residente de Obra

El Comité de Recepción en uso de sus atribuciones estipuladas en el Art. N° 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N° 350-2015-EF), procede a la verificación de las metas físicas ejecutadas de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico de la Obra para cada caserío; y que a continuación se detallan:

a) Expediente Técnico Principal:

- 02 tribunas laterales para 320 espectadores cada una con sus respectivos SS.HH. y Camerinos bajo las mismas.
- 01 tribuna de fondo con capacidad para 446 espectadores.
- 01 bloque de administración destinado para una Oficina de Asistencia Social y para la Jefatura / Secretaria con su respectivo SS.HH.
- 01 Sala de Exposición con su respectivo SS.HH.
- 01 Hall/Foyer como acceso principal.
- Cerco perimétrico de albañilería para las tribunas laterales.
- Cerco perimétrico de albañilería para la tribuna de fondo.
- Pasillos, corredores y escaleras.
- Techo con estructura metálica y cobertura liviana de calaminón.

Plaza de Armas 2do Piso - Pampas - RPM: *350153 - Cel: 943-147358 - Pallasca - Ancash

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS

"Generando Bienestar y Desarrollo"

- 01 losa deportiva multiusos de 17.40 x 32.00 m2 con su respectivo equipamiento (arcos, mallas, etc.).

b) Expediente Técnico Adicional de Obra N° 01:

- Cerco Perimétrico
  - 291.22m2 de muros de ladrillo king kong de arcilla de soga, con tarrajeo interior y pintura al látex.
  - 172.17m2 de tarrajeo frotachado exterior en muros y pintura al látex.
  - 66.12m2 de suministro e instalación de malla galvanizada N° 10 con parantes de 2" (inc. acabado s/diseño)
  - Suministro e instalación de 01 portón metálico 4.00 x 3.50m, contraplacado c/plancha acanalada 1/16", tubo galvanizado 2" (inc. pórtico de ingreso y acabados s/diseño)
  - Suministro e instalación de 01 puerta metálica de plancha acanalada de F°G° 1.20x2.30 (inc. acabado s/diseño)
  - 32.66m de pasamanos metálico d=1 1/2" h=0.90m.
  - 13.13m2 de muro cortina de vidrio templado de 10mm - serial / directo .
- S.H, Administración, Salas De Exposición Y Cocina
  - 103.14ml de contrazocalo de porcelanato h=0.10m.
  - 26.33m de baranda metálica d=1 1/2" h=0.90m.

CONSORCIO COLISEO PAMPAS
Ing. Roberto Carlos Flores Villanueva
RESIDENTE DE OBRAS
C.I.P. N° 80649

Siendo las 12:25 pm, del 27 de Noviembre del 2018, luego de haber realizado el recorrido y terminada la verificación de la obra in situ, descrito en los literales a y b; se ha comprobado que EL CONTRATISTA, ha cumplido con la ejecución de la obra en concordancia con las Especificaciones Técnicas y las Partidas del Expediente Técnico Principal y del Expediente Tecnico de Adiiconal de oBra N° 01 aprobados, y no encontrando observaciones que efectuar, salvo vicios ocultos, EL COMITÉ DE RECEPCIÓN concluye que es procedente dar por RECEPCIONADA LA OBRA; procediendose a firmar la presente Acta de Recepción en señal de conformidad entre las partes.

CONSORCIO COLISEO PAMPAS
Francis Jesús Gutiérrez Mejía
REPRESENTANTE COMÚN

Por parte de la Municipalidad Distrital de Pampas;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS
Ing. Edinson G. Sanchez Villafana
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Edinson Geovani Sánchez Villafana
Gerente de Infraestructura

Thalia Y. Llauri León
ADMINISTRADORA MDP

Srta. Thalia Yeni Llauri León
Administradora - MDP

Manuel F. Salcedo Campos
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 40899

Ing. Manuel Fredegundo Salcedo Campos
Jefe Supervisor de Obra
C.I.P. N° 40899

Plaza de Armas 2do Piso - Pampas - RPM: *350153 - Cel: 943-147358 - Pallasca - Ancash

INCOGEZYB

INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B SAC

RUC: 20541624644

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS

"Generando Bienestar y Desarrollo"

Por parte del Contratista "CONSORCIO COLISEO PAMPAS";

CONSORCIO COLISEO PAMPAS
Francis Jesús Gutiérrez Mejia
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Francis Jesús Gutiérrez Mejia
Representante Legal
CONSORCIO COLISEO PAMPAS

CONSORCIO COLISEO PAMPAS
Ing. Roberto Carlos Flores Villanueva
RESIDENTE DE OBRAS
C.I.P. Nº 80649

Ing. Roberto Carlos Flores Villanueva
Residente de Obra
C.I.P. Nº 80649

Thalia Y. Llauri León
ADMINISTRADORA MDP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS
Ing. Edinson G. Sanchez Villafana
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

Manuel F. Saiccedo Campos
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 40899

Plaza de Armas 2do Piso - Pampas - RPM: *350153 - Cel: 943-147358 - Pallasca - Ancash

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA	: **"MEJORAMIENTO DE LA LOSA MULTIUSO EL POZO EN EL BARRIO SAN MARTIN DEL C. P. SAN JACINTO, DISTRITO DE NEPEÑA - SANTA - ANCASH, I ETAPA"**
PROCESO DE SELECCIÓN	: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 04-2016-MDN
ENTIDAD CONTRATANTE	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA
EJECUTOR	: CONSORCIO SAN MARTÍN
MONTO CONTRATADO	: S/.699,540.25 (inc. IGV)
INICIO CONTRACTUAL	: 15 DE NOVIEMBRE DE 2016
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 120 DÍAS CALENDARIO
FINAL CONTRACTUAL	: 14 DE MARZO DE 2017
MONTO ADICIONAL DE OBRA	: S/. 83,675.06 (inc. IGV)
MONTO DEDUCTIVO DE OBRA	: S/. 2,405.65 (inc. IGV)
PLAZO AMPLIADO	: 25 DÍAS CALENDARIO
FINAL AMPLIADO	: 08 DE ABRIL DE 2017
FINAL REAL DE OBRA	: 08 DE ABRIL DE 2017

Siendo las 10:00 a.m. del día 05 de mayo del año 2017, se reunieron en el lugar de la obra **"MEJORAMIENTO DE LA LOSA MULTIUSO EL POZO EN EL BARRIO SAN MARTIN DEL C. P. SAN JACINTO, DISTRITO DE NEPEÑA - SANTA – ANCASH, I ETAPA"**, ejecutada en el C.P San Jacinto, el Comité de Recepción de Obra designado con Resolución Gerencial N°148-2017-MDN integrado por el Ing. Elmer Adan Peña Armas en calidad de Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y el Ing. Pool Gabriel Chanava Moreno en calidad de Sub Gerente de Infraestructura y Liquidación de Obras; como Asesor Técnico del Comité de Recepción el Ing. Luis Alfredo Colona Veramatus Supervisor de Obra; y de otra parte por la Empresa ejecutora CONSORCIO SAN MARTÍN, el Representante Legal el Sr. Francis Jesús Gutiérrez Mejía y el Ing. Ricardo Elías Villafana Espichan con Reg. CIP N°54066, en calidad de Residente de Obra; con el propósito de efectuar la Recepción de Obra de conformidad con el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N°350-2015-EF.

El Comité de Recepción de Obra, efectuó el recorrido respectivo por la obra para su verificación no encontrándose observaciones; en consecuencia, siendo las 10:50 a.m. se suscribe el presente ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA en señal de conformidad.

CONSORCIO SAN MARTIN
RICARDO ELIAS VILLAFANA ESPICHAN
Residente de Obra
Reg. CIP N° 54066

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA
Ing. Elmer Adan Peña Armas
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Ing. Elmer Adan Peña Armas
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Ing. Pool Gabriel Chanava Moreno.
Sub Gerente de Infraestructura
y Liquidación de Obras

CONSORCIO SAN MARTIN
FRANCIS JESUS GUTIERREZ MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ALFREDO COLONA VERAMATUS
INGENIERO CIVIL
Reg Del Colegio N° 70600

Luis Alfredo Colona Veramatus
Supervisor de Obra

INCOGEZYB

INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B SAC

RUC: 20541624644

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA

CONSORCIO SAN MARTÍN

CONSORCIO SAN MARTIN
FRANCIS JESUS GUTIERREZ MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL

Sr. Francis Jesús Gutiérrez Mejía
Representante Legal

CONSORCIO SAN MARTIN
RICARDO ELIAS VILLAFANA ESPICHAN
Residente de Obra
Reg. CIP N° 94066

Ing. Ricardo Elías Villafana Espichan
Residente de Obra

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA
Ing. Elmer Adan Peña Armas
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

LUIS ALFREDO CORONEL PERAMATUS
INGENIERO CIVIL
Reg Del Colegio N° 70600

Urb. Los Cipreces Mz. J Lote. 9, Nuevo Chimbote - Santa - Ancash
Teléfono: 043 777768 – Celular: 999760033 - 969759806
Email: incogezyb@gmail.com

INCOGEZYB

INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B SAC

RUC: 20541624644

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
SUB REGION PACIFICO
AV. CHIMBOTE Nº 130 I ETAPA URB. BUENOS AIRES – NUEVO CHIMBOTE
RUC. Nº 20320162352

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 88218 – TANGAY MEDIO, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA – ÁNCASH - SALDO DE OBRA"

DISTRITO	:	NUEVO CHIMBOTE
PROVINCIA	:	SANTA
REGION	:	ANCASH
PROCESO	:	AS N°AS-SM-1-2017-SC-SRP/GRA-1
ENTIDAD PÚBLICA	:	SRP (REGION ANCASH)
FINANCIAMIENTO	:	CANON SOBRE CANON
VALOR REFERENCIAL	:	S/.2'199,458.37 inc. IGV,
MONTO CONTRATADO	:	S/.2'199,458.37 inc. IGV,
MODALIDAD DE EJECUCION	:	POR CONTRATA
SISTEMA DE CONTRATACION	:	A SUMA ALZADA
CONTRATO	:	N° 005-2018
CONTRATISTA	:	CONSORCIO TANGAY MEDIO S.A.C
REPRESENTANTE LEGAL	:	SRA. SEGUNDINA HILDA SALVATIERRA ALARCÓN
RESIDENTE DE OBRA	:	ING. RENATO SANTIAGO MOLINARI LECTOR.
INSPECTOR DE OBRA	:	ING. AUGUSTO ROSARIO HUAMÁN LÓPEZ.
PLAZO DE EJECUCION	:	120 DIAS CALENDARIOS
ENTREGA DE TERRENO	:	17 DE SETIEMBRE DEL 2018
FECHA DE INICIO DE PLAZO	:	28 DE SETIEMBRE DEL 2018
TERMINO ORGINAL PROGRAMADA	:	24 DE ENERO DEL 2019
PPTO. ADICIONAL DE OBRA N° 01	:	S/. 435,257.69
RESOL. ADICIONAL DE OBRA N° 01	:	RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 234 – 2018-REGIONANCASH/SRP/ G
PPTO. DEDUCTIVO DE OBRA N° 01	:	S/ 106,200.00
RESOL. AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01	:	RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 064 – 2019-REGIONANCASH / SRP / G
PLAZO DE AMPLIACIÓN N° 01	:	90 D.C.
INICIO DE AMPLIACIÓN N° 01	:	25 DE ABRIL DEL 2019
TERMINO REPROGRAMADO N° 01	:	23 DE JULIO DEL 2019
RESOL AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02	:	RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 074 – 2019-REGIONANCASH / SRP / G
PLAZO DE AMPLIACIÓN N° 02	:	15 D.C.
INICIO DE AMPLIACIÓN N° 02	:	24 DE JULIO DEL 2019
TERMINO REPROGRAMADO N° 02	:	07 DE AGOSTO DEL 2019
RESOL AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03	:	RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 083 – 2019-REGIÓN ANCASH / SRP / G
PLAZO DE AMPLIACIÓN N° 03	:	10 D.C.
INICIO DE AMPLIACIÓN N° 03	:	08 DE AGOSTO DEL 2019
TERMINO REPROGRAMADO N° 03	:	17 DE AGOSTO DEL 2019
RESOL AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04	:	RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 102 – 2019-REGIONANCASH / SRP / G
PLAZO DE AMPLIACIÓN N° 04	:	60 D.C.
INICIO DE AMPLIACIÓN N° 04	:	18 DE AGOSTO DEL 2019

Ing. Renato S. Molinari Lector
ING. CIVIL - CIP N° 74247 - C.M.N.

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH SUB REGIÓN PACIFICO
Ing. Ana Patricia Ríos Holguín
CIP Nº 113324
JEFE DE OBRAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH SUB REGIÓN PACIFICO
Ing. Jhon Raúl Fuentes Villavicencio
CIP N° 119573
JEFE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH SUB REGIÓN PACIFICO
ING. RAUL C. MONTAÑEZ GUTIERREZ
CIP. 58390
Jefe de Estudios y Proyectos

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH SUB REGIÓN PACIFICO
Ing. Augusto R. Huamán López
CIP N° 91826
INSPECTOR DE OBRAS ELECTRICAS

CONSORCIO TANGAY MEDIO
Segundina Hilda Salvatierra Alarcón
Representante Comun

Urb. Los Cipreces Mz. J Lote. 9, Nuevo Chimbote - Santa - Ancash
Teléfono: 043 777768 – Celular: 999760033 - 969759806
Email: incogezyb@gmail.com

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
SUB REGION PACIFICO
AV. CHIMBOTE Nº 130 I ETAPA URB. BUENOS AIRES – NUEVO CHIMBOTE
RUC. Nº 20320162352

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

TERMINO REPROGRAMADO N° 04 : 16 DE OCTUBRE DEL 2019
TERMINO REPROGRAMADOS DE OBRA : 16 DE OCTUBRE DEL 2019
FECHA DE CULMINACIÓN DE OBRA : 16 DE OCTUBRE DEL 2019

En la INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 88218 – TANGAY MEDIO, del Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash, siendo las 9.45 a.m. del 07 de Enero del 2020 se reunieron en representación del Comité de Recepción de Obra de la Sub Región Pacifico del Gobierno Regional de Ancash, designado con Resolución Gerencial Sub Regional N° 151–2019 Región Ancash/SRP/G, integrado por:

ING. RAÚL CALIXTO MONTAÑEZ GUTIÉRREZ - Presidente,
ING. KAREN RUBY DOMINGUEZ VILLAVICENCIO - Miembro
ING. ANA PATRICIA RÍOS HOLGUÍN - Miembro
ING. AUGUSTO ROSARIO HUAMÁN LÓPEZ- ASESOR TÉCNICO - INSPECTOR DE OBRA

Y por el Contratista:
REPRESENTANTE LEGAL SRA. SEGUNDINA HILDA SALVATIERRA ALARCÓN (EJECUTOR DE OBRA).
ING. RENATO SANTIAGO MOLINARI LECTOR-RESIDENTE DE OBRA.

Mediante asiento N 202, de cuaderno de Obra, del Residente de Obra de fecha 24 de Diciembre del 2019, el Residente manifiesta que de conformidad al Art. 178 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, se ha cumplido con subsanar las observaciones anotadas en el Acta de Observaciones de fecha 28 de Noviembre del 2019.
El Comité de Recepción de Obra, efectuó la inspección y verificación del pliego de observaciones formulados mediante Acta de Observaciones de fecha 28 de Noviembre del 2019, de la verificación del expediente técnico Contractual y del Adicional de obra con deductivo N° 01, constatando el levantamiento de observaciones.
La Comisión en uso de sus funciones ha verificado la Subsanación de las observaciones, determinando la Recepción de Obra, la obra se ejecutó de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico, sus modificaciones y Adicionales de obra y deductivos de obra.
El Comité de Recepción de obra, no se responsabiliza por los defectos o vicios ocultos de construcción, ni tampoco de las deficiencias que con posterioridad al presente acto se detectaran. La Recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, debiendo el contratista repararlas a su costo y de acuerdo a la garantía de obra de siete (7) años, de acuerdo a la ley de Contrataciones del estado.

Siendo la 2:00p.m., del mismo día se procede a firmar la presente Acta, en señal de conformidad en 07 ejemplares en original.

POR LA SUB REGIÓN PACIFICO:

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
SUB REGIÓN PACIFICO
ING. RAUL C. MONTAÑEZ GUTIERREZ
CIP. 55890
Jefe de Estudios y Proyectos

ING. RAÚL CALIXTO MONTAÑEZ GUTIÉRREZ
Presidente de la Comisión

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
SUB REGIÓN PACÍFICO
Ing. Karen Ruby Dominguez Villavicencio
CIP. Nº 112575
JEFE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

Ing. KAREN RUBY DOMÍNGUEZ VILLAVICENCIO
Miembro de la Comisión

INCOGEZYB

INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B SAC

RUC: 20541624644

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
SUB REGION PACIFICO
AV. CHIMBOTE Nº 130 I ETAPA URB. BUENOS AIRES – NUEVO CHIMBOTE
RUC. Nº 20320162352

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
SUB REGION PACIFICO
Ing. Ana Patricia Rios Holguin
CIP Nº 113324
JEFE DE OBRAS

ING. ANA PATRICIA RÍOS HOLGUÍN
Miembro de la Comisión

Ing. AUGUSTO ROSARIO HUAMÁN LÓPEZ
INSPECTOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA **CONSORCIO TANGAY MEDIO S.A.C:**

CONSORCIO TANGAY MEDIO
Segundina Hilda Salvatierra Alarcon
Representante Comun

SRA. SEGUNDINA H. SALVATIERRA ALARCÓN
Representante legal

Renato S. Molinari Lector
ING. CIVIL - CONSULTOR
C.I.P. N° 74347 - C3436

Ing. RENATO SANTIAGO MOLINARI LECTOR.
Residente de obra

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
SUB REGION PACIFICO
Ing. Karen Ruby Martinez Vda. de Quincho
JEFE DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
SUB REGION PACIFICO
ING. RAUL C. MONTAÑEZ GUTIERREZ
CIP. 55850
Jefe de Estudios y Proyectos

3

27

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA
Ing. Juan Daniel Burga Ramírez
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

OBRA	:	**"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. SOLIVÍN DEL C.P. SAN JACINTO DEL DISTRITO DE NEPEÑA – PROVINCIA DE SANTA – DEPARTAMENTO ANCASH, I ETAPA.".**
PROCESO DE SELECCIÓN	:	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°12-2018-MDN.
ENTIDAD CONTRATANTE	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA.
EJECUTOR	:	CONSORCIO SOLIVIN. IVERMART S.A.C. GUPESA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.
MONTO CONTRATADO	:	S/. 808,968.73
ENTREGA DE TERRENO	:	16 DE OCTUBRE DEL 2018.
INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL	:	17 DE OCTUBRE DEL 2018.
TÉRMINO DE PLAZO CONTRACTUAL	:	13 DE FEBRERO DEL 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	120 DÍAS CALENDARIO.
TÉRMINO REAL DE OBRA	:	26 DE FEBRERO DEL 2019

Jorge Divan Carpio Saldarriaga
Reg. C.I.P. N° 140952
ING. CIVIL
SUPERVISOR DE OBRA

Siendo las 12:00 pm del Jueves 28 de Febrero del 2019, se reunieron en el lugar de la obra **"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. SOLIVÍN DEL C.P. SAN JACINTO DEL DISTRITO DE NEPEÑA – PROVINCIA DE SANTA – DEPARTAMENTO ANCASH, I ETAPA."**, ejecutada en el C.P. San Jacinto, por parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA el Comité de Recepción de Obra designado con Resolución Gerencial N°008-2019-MDN, integrado por el Ing. JUAN DANIEL BURGA RAMÍREZ en calidad de Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y el Ing. Giancarlos Gilbert Ardiles Quiñones en calidad de Sub Gerente de Infraestructura y Liquidación de Obras y como Asesor Técnico del Comité de Recepción el Ing. JORGE DIVAN CARPIO SALDARRIAGA con CIP 140952 en calidad de Supervisor de la Obra y de otra parte la empresa ejecutora CONSORCIO SOLIVIN representada por el Sr. DAVID RODAS SOTOMAYOR en calidad de Representante Legal y el Ing. LUIS ALBERTO NECIOSUP AZAN con CIP 90109 en calidad de Residente de la Obra, con el propósito de efectuar la recepción de la obra de conformidad con el articulo N°208 del reglamento de la ley de contrataciones del estado aprobado mediante D.S. N°344-2018-EF.

Ing. Luis Alberto Neciosup Azan
P. 90109
ING. RESIDENTE

CONSORCIO SOLIVIN
DAVID RODAS SOTOMAYOR
REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA
Ing. Giancarlos Gilbert Ardiles Quiñones
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

26

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA

El Comité de Recepción de Obra, efectuó el recorrido respectivo por la obra para su verificación no encontrándose observaciones; en consecuencia, siendo la 13:00 p.m. se suscribe la presente ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA en señal de conformidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA
Ing. Juan Daniel Burga Ramírez
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ING. JUAN DANIEL BURGA RAMÍREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA
Ing. Giancarlos Gilbert Ardiles Quiñones
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y LIQUIDACIONES DE OBRAS

ING. GIANCARLOS GILBERT ARDILES QUIÑONES
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

Jorge Divan Carpio Saldarriaga
Reg. C.I.P. N° 140952
ING. CIVIL
SUPERVISOR DE OBRA

ING. JORGE DIVAN CARPIO SALDARRIAGA
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO LA SOLIVIN:

CONSORCIO SOLIVIN
DAVID RODAS SOTOMAYOR
REPRESENTANTE LEGAL

SR. DAVID RODAS SOTOMAYOR
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO SOLIVIN
Ing. Luis Alberto Neciosup Azan
C.I.P. 90109
INGENIERO RESIDENTE

ING. LUIS ALBERTO NECIOSUP AZAN
RESIDENTE DE OBRA

Plaza de Armas s/n. Nepeña . Telf.: 043-296044

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BOLOGNESI
PROVINCIA PALLASCA-REGION ANCASH

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

"CREACION DE LA PLAZOLETA DEL C.P. DE CACHUBAMBA, DEL DISTRITO DE BOLOGNESI, PROVINCIA DE PALLASCA – DEPARTAMENTO ANCASH"

Entidad Contratante	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BOLOGNESI
Modalidad de Ejecución	: ADMINISTRACION INDIRECTA
Valor Referencial	: S/. 484,275.56 Incluido IGV
Adicional de obra	: NO CORRESPONDE
Presupuesto final	: S/. 484,275.56 (Incluido IGV)
Plazo de Ejecución de Obra	: 75 días calendarios
Ampliación de plazo	: NO CORRESPONDE
Fecha de Entrega de Terreno	: 14 de Enero del 2022
Fecha de Inicio de Plazo	: 15 de Enero del 2022
Adelanto directo	: NO CORRESPONDE
Fecha culminación real de obra	: 26 de Marzo de 2022
Residente de Obra	: ING. LUIS ALFREDO COLONA VERAMATUS CIP N° 70600
Supervisor de Obra	: ING. JUAN CARLOS MELGAREJO IPARRAGUIRRE CIP Nº 139721

En la localidad de CACHUBAMBA, del Distrito de Bolognesi de la Provincia de Pallasca, Región Ancash, a los 06 días del mes de junio del 2022, se reunieron por un lado los miembros del comité de verificación y recepción de la obra en mención, designado por la Municipalidad Distrital de Bolognesi mediante Resolución de Alcaldía N° 013 – ALC-MDB-2022, de fecha 02 de junio del 2022, integrada por los siguientes profesionales:

POR LA ENTIDAD:

Presidente	: ING. GONZALO SANCHEZ CAMPOS
Miembro	: ING. HERNAN DAVID BARON POLO
Miembro	: SR. GRHOBERTD JAVIER FALVY LOLI
Supervisor	: ING. JUAN CARLOS MELGAREJO IPARRAGUIRRE

POR EL CONSORCIO SAN ANTONIO

Residente	: LUIS ALFREDO COLONA VERAMATUS

En la verificación que realiza el Comité de Verificacion y Recepción de la obra, es con el objeto de corroborar el fiel cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto, para tal

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BOLOGNESI
PROVINCIA PALLASCA-REGION ANCASH

propósito sujetara su actuación a la normativa de Contrataciones del Estado y su Reglamento, resolución de contraloría N° 195-88-CG y el contrato de Obra, Expediente técnico y documentos que lo conforman.

1. **COMPONENTES EJECUTADO:**

1.1. ESTRUCTURAS

- **1.1.1.** OBRAS PROVISIONALES
- **1.1.2.** OBRAS PRELIMINARES
- **1.1.3.** MOVIMIENTO DE TIERRAS
- **1.1.4.** VEREDAS, PISOS Y ADOQUIN
- **1.1.5.** SARDINELES
- **1.1.6.** BANCAS DE CONCRETO
- **1.1.7.** GLORIETA CENTRAL

1.2. ARQUITECTURA

- **1.2.1.** GLORIETA CENTRAL
- **1.2.2.** BOTADERO (TACHO DE BASURA)
- **1.2.3.** AREA VERDE
- **1.2.4.** MITIGACION AMBIENTAL

1.3. SISTEME ELECTRICAS (ELECTRIFICACION)

- **1.3.1.** GLORIETA CENTRAL
- **1.3.2.** ILUMINACION DE PLAZA

1.4. SISTEMA DE RIEGO

- **1.4.1.** SISTEMA RIEGO

1.5. PLAN COVID 19

- **1.5.1.** PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19

Al término de la verificación de los trabajos ejecutados, la comisión luego de la información del Residente de Obra y del Supervisor de Obra comunicaron de los Trabajos Culminados en su totalidad, de que lo ejecutado se ha ceñido a lo dispuesto por los planos y Especificaciones Técnicas aprobadas y salvo vicios ocultos que podrían presentarse posteriormente y no responsabilizarse frente a la Municipalidad Distrital de Bolognesi y/o ante terceros por imperfecciones, vicios, así como por la destrucción parcial o total de la obra.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BOLOGNESI
PROVINCIA PALLASCA
Ing. Gonzalo Sanchez Campos
GERENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BOLOGNESI
CPC. Ghoberto Javier Falvy Loli
JEFE DE LOGISTICA (e)

Ing. Juan Carlos Melgarejo Barriguete
CIP N° 139121
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SAN ANTONIO
Ing. Ada Alexandra Valenzuela Cerna
Residente de Obra
CIP N° 215006

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BOLOGNESI
PROVINCIA DE PALLASCA
Ing. Hernan David Barón Polo
ASISTENTE DE GERENCIA DE OBRAS

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

INCOGEZYB

INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B SAC

RUC: 20541624644

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BOLOGNESI
PROVINCIA PALLASCA-REGION ANCASH

Al término de la diligencia y estando de acuerdo de las partes señaladas de Conformidad, se suscribe la Presente acta de **VERIFICACCION Y ACTA DE RECEPION DE OBRA** en 06 juegos, se da por terminada la diligencia, a las 12.00 am del día y mes de junio del presente año, dejando constancia que el Acta consta de 03 hojas

POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BOLOGNESI.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BOLOGNESI
PROVINCIA PALLASCA
Ing. Gonzalo Sanchez Campos
GERENTE DE OBRA

Ing. GONGALO SANCHEZ CAMPOS
CIP 192208
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BOLOGNESI
PROVINCIA DE PALLASCA
Ing. Hernan David Barón Polo
ASISTENTE DE GERENCIA DE OBRAS

Ing. HERNAN DAVID BARON POLO
CIP 268137
Asistente Gerencia

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BOLOGNESI
CPC. Grhoberto Javier Falvy Loli
JEFE DE LOGISTICA (e)

GRHOBERTD JAVIER FALVY LOLI
Jefe (E) Logistica

Ing. Juan Carlos Melgarejo Iparraguirre
CIP N° 139721
SUPERVISOR DE OBRA

JUAN CARLOS MELGAREJO IPARRAGUIRRE
CIP 139721
Supervisor de Obra

POR EL CONSORCIO SAN ANTONIO

CONSORCIO SAN ANTONIO
Ing. Luis Alfredo Colona Veramatus
Residente de Obra
Cip N° 70600

LUIS ALFREDO COLONA VERAMATUS
CIP 70600
Residente - Consorcio San Antonio

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA

"Santa Maria de la Parrilla"

Jr. Marañon N° 227 - ☎ 294321 - SANTA

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA	: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS JOSE OLAYA EN EL P.H.U JAVIER HERAUD DEL DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**
PROCESO DE SELECCIÓN	: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°002-2022-MDS/CS-1
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	: A SUMA ALZADA
ENTIDAD CONTRATANTE	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: RECURSOS CANON Y SOBRE CANON
CONTRATO DE OBRA	: N° 011-2022-MDS/GM
FECHA DE CONTRATO	: 11 DE MARZO DEL 2022
EJECUTOR DE OBRA	: CONSORCIO JOSE OLAYA
MONTO REFERENCIAL	: S/ 1,106,285.39
MONTO CONTRACTUAL	: S/ 1,106,285.39
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 90 DÍAS CALENDARIO
INICIO DE OBRA	: 28 DE MARZO DEL 2022
TERMINO REAL DE OBRA	: 25 DE JUNIO DEL 2022

Municipalidad Distrital de Santa
Arq. Omar J. Vásquez Velarde
JEFE DE DESARROLLO URBANO RURAL Y CATASTRO
CAP N° 8070

Siendo las 10:00 am del día martes 09 de Agosto del 2022, se reúnen **POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA,** el COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRAS, integrado por el Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural **Ing. Juan Pablo Rebaza Serrano** en calidad de Presidente, el Jefe de la Oficina de Obras Públicas y Privadas **Ing. Juan José Julca Briceño** en calidad de Primer Miembro, el Jefe de la Oficina de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro **Arq. Omar J. Vásquez Velarde** en calidad de Segundo Miembro y el Supervisor de Obra **Ing. Oscar Enrique La Peña Matheus** en calidad de Asesor Técnico y de otra parte en representación del Contratista CONSORCIO JOSE OLAYA el **Sr. Arturo Raul Asunción Castañeda** con DNI N° 73470427 como Representante Común, y el **Ing. Carlos Walter Tahua Roque** como Residente de Obra, con la finalidad de proceder a la **RECEPCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS JOSE OLAYA EN EL P.H.U JAVIER HERAUD DEL DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, ejecutada bajo la modalidad de A SUMA ALZADA, para proceder a la verificación de la metas ejecutadas, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo N° 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Municipalidad Distrital de Santa
Ing. Juan P. Rebaza Serrano
GERENTE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
CIP N° 96071

Los miembros de la Comisión de Recepción, luego de la verificación del funcionamiento y operatividad así como de los planos de replanteo, pruebas y ensayos de laboratorio, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra ejecutada, determinan que no existe ningún inconveniente para su **RECEPCION DEFINITIVA**, salvo defectos o vicios ocultos, no eximiendo al contratista de su responsabilidad por la calidad de los trabajos, durante el periodo de garantía que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Carlos Walter Tahua Roque
INGENIERO CIVIL
CIP N° 96206

CONSORCIO JOSE OLAYA
Arturo R. Asunción Castañeda
DNI 73470427
REPRESENTANTE COMUN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
Ing. Juan José Julca Briceño
JEFE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS
CIP N° 144410

Oscar Enrique La Peña Matheus
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 171021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA

"Santa Maria de la Parrilla"

Jr. Marañon N° 227 - ☎ 294321 - SANTA

Al término de la diligencia se da como recepcionada la obra y en señal de conformidad se suscribe la presente **ACTA DE RECEPCION**, firmando ambas partes:

POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA:

Municipalidad Distrital de Santa
Ing. Juan P. Rebaza Serrano
GERENTE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
CIP. N° 50071

Ing. Juan Pablo Rebaza Serrano
Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural
PRESIDENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
Ing. Juan José Julca Briceño
JEFE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS
CIP N° 144410

Ing. Juan José Julca Briceño
Jefe de la Oficina de Obras Públicas y Privadas
PRIMER MIEMBRO

Municipalidad Distrital de Santa
Arq. Omar J. Vásquez Velarde
JEFE DE DESARROLLO URBANO RURAL Y CATASTRO
CAP N° 6010

Arq. Omar J. Vásquez Velarde
Jefe de la Oficina de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro
SEGUNDO MIEMBRO

Oscar Enrique La Peña Matheus
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 171021

Ing. Oscar Enrique La Peña Matheus
Supervisor de Obra
ASESOR TECNICO

POR EL CONSORCIO JOSE OLAYA:

CONSORCIO JOSE OLAYA
Arturo R. Asunción Castañeda
DNI 73404427
REPRESENTANTE COMÚN

Sr. Arturo Raul Asunción Castañeda
Representante Común

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Carlos W. Tahua Roque
INGENIERO CIVIL
CIP N° 96206

Ing. Carlos Walter Tahua Roque
Residente de Obra

INCOGEZYB

INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B SAC

RUC: 20541624644

EXPERIENCIA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO

A. Datos Personales

Apellidos y Nombres:	Deivis Junnior Solis Inocente		
Domicilio:	Av. Independencia N°131 Casma – Ancash		
Profesion (Titulo o Grado):	Ingeniero Civil	**REG C.I.P.**	181381
Telefono	988785563	**Consultor**	
DNI:	70400462	**Ruc**	10704004627
Fecha de Expedicion del Grado o Titulo			

B. Experiencia

N°	CLIENTE O EMPLEADOR	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN	TIEMPO ACUMULADO	CARGO
01	FAMILIA LITANO PAJUELO	CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE DOS NIVELES DE LA FAMILIA LITANO PAJUELO EN EL AA.HH. RAMIRO PRIABLE MZ B LT 7 CASMA, PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	05/12/2016	15/06/2017	193	RESIDENTE DE OBRA
02	FAMILIA BAUTISTA CERNA	CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE UN NIVEL DE LA FAMILIA BAUTISTA CERNA EN EL AA.HH. VISTA ALEGRE MZ B LT 9, NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	26/06/2017	28/10/2017	125	RESIDENTE DE OBRA
03	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA	SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS - GERENCIA DE GESTION URBANA Y RURAL DE LA PROVINCIA DE CASMA	24/05/2018	31/12/2018	222	SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS
04	Municipalidad distrital de Yautan	"Mejoramiento del camino vecinal en el sector de punchayhuaca del distrito de yautan – provincia de casma – departamento de ancash	21/01/2019	04/04/2019	74	SUPERVISOR DE OBRA
05	Municipalidad distrital de Yautan	"Renovacion de pistas; en el (la) pasaje fermin carrion de la localidad de yautan distrito de yautan, provincia de casma, departamento de Ancash"	24/04/2019	13/06/2019	51	SUPERVISOR DE OBRA
06	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAS	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL YURA - VILCABAMBA, SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE PAUCAS - HUARI - ANCASH	16/09/2019	31/10/2019	46	RESIDENTE DE OBRA
07	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTONIO RAYMONDI	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86267 DEL ANEXO DE JARACHACRA - DISTRITO DE ANTONIO RAYMONDI - PROVINCIA DE BOLOGNESI - ANCASH	04/11/2019	08/02/2020	97	RESIDENTE DE OBRA
08	CONSTRATISTAS GENERALES K&F S.A.C.	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL (LA) I.E. 2110 - CASCAS EN LA LOCALIDAD 9 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	10/02/2020	11/03/2020	31	RESIDENTE DE OBRA
09	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - MUNICIPALIDAD PRONINCIAL DE CARHUAZ	SERVICIOS DE CONTROL POSTEROPR Y RECOPILACION DE INFORMACION CONTEMPLADOS EN EL PLAN NACIONAL DE CONTROL 2020 DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ANCASH - JEFE DE COMISION DE CONTROL	17/08/2020	28/12/2020	134	JEFE DE COMISION DE CONTROL
10	CONSORCIO CASMA	REMODELACION DE AMBIENTES DE USOS MULTIPLES; EN EL MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE YAUTAN, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	14/01/2021	31/03/2021	77	RESIDENTE DE OBRA
11	CONTRATISTAS Y CONSULTORES J&M S.A.C.	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR SAN JOSE OBRERO Y EN LAS CALLES DE SAN MARTIN, BAMBAREN, ANCASH BAJO, CESAR VALLEJO, RICARDO PALMA Y POMABAMBA, DEL C.P. SAN JACINTO EN EL DISTRITO DE NEPEÑA SANTA ANCASH	23/06/2021	20/09/2021	90	RESIDENTE DE OBRA
12	Consorcio CENTRO CIVICO	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE PROGRESO, CALLE UNO, CALLE DOS Y PASAJES S/N DEL P.V.H.U CENTRO CÍVICO, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA – ANCASH"	15/10/2021	02/04/2022	170	RESIDENTE DE OBRA
13	CONSORCIO VALLEJO	"Rehabilitacion de Pistas y Veredas en el psje. Jose Olaya desde Ca. Panamericana hasta Ca. Nueva, distrito de huarmey, provincia Huarmey, Departamento Ancash"	13/04/2022	14/10/2022	185	RESIDENTE DE OBRA

LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA ES DE	1,495.00	Días
	49.15	Meses
	4.10	Años

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

El Decano Nacional:

Por cuanto **DEIVIS JUNNIOR SOLIS INOCENTE**

INGENIERO CIVIL

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito con registro N° **181381** en cumplimiento de la ley 28858, el **07/12/2015**

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley para ejercer la profesión de INGENIERO.

Miraflores, 07 de diciembre de 2015

Ing. CIP Jorge Elias Alva Hurtado
DECANO NACIONAL (a.i.)

Ing. CIP Doris Fanny Rojas Mendoza
DIRECTORA SECRETARIA GENERAL

LEY Nº 24648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Nº - A - 0242778

Certificado de Habilidad

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): SOLIS INOCENTE DEIVIS JUNNIOR

Adscrito al Consejo Departamental de: ANCASH-CHIMBOTE

Con Registro de Matrícula del CIP Nº: 181381 Fecha de Incorporación: 07/12/2015

Especialidad: ING. CIVIL

De conformidad con la Ley Nº 28858, Ley que complementa a la Ley Nº 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO	EJERCICIO PROFESIONAL
ENTIDAD O PROPIETARIO	NINGUNO
LUGAR	A NIVEL NACIONAL

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA		
DÍA	MES	AÑO
31	03	2024

Colegio de Ingenieros del Perú

Ing. CIP ROBERT FABIAN GUEVARA CHINCHAYAN
DIRECTOR SECRETARIO - CDACH

ANCASH-CHIMBOTE, 17 de MAYO del 20 23

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

Ing. María del Carmen Ponce Mejía
Decana Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú

Consejo Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú

NO VÁLIDO PARA FIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS NI PARA RESIDENTES DE OBRAS PÚBLICAS

REPÚBLICA DEL PERÚ

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

EN NOMBRE DE LA NACIÓN

El Rector de la Universidad César Vallejo de Trujillo

Por cuanto:

La Universidad, en la fecha, ha conferido el **TÍTULO PROFESIONAL** *de:*

INGENIERO CIVIL

a **Deivis Junior Solis Inocente**

Por tanto:

Le expide el presente **DIPLOMA** *para que se le reconozca como tal y se le otorgue los goces y privilegios que le confieren las leyes de la República.*

Trujillo, **22** *de* **JUNIO** *del* **2015**



Registrado en el libro N° 2
A fojas 733 bajo el N° 12

SECRETARIO GENERAL
Mg. VICTOR SANTISTEBAN CHÁVEZ

RECTOR
DR. FRANCISCO JOSÉ MIRÓ QUESADA RADA

DECANO
Mg. RICARDO MANUEL DELGADO ARANA

El Fedatario de la Universidad César Vallejo
Filial Chimbote
DA FE:
Que esta copia reproduce fielmente el documento original que ha tenido a la vista
Chimbote, 13 MAYO 2015
Dr. Carlos Alfredo Mendoza Hernández
FEDATARIO
Autorizado por RD Nº 080-2013/UCV

REPÚBLICA DEL PERÚ

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

EN NOMBRE DE LA NACIÓN

El Rector de la Universidad César Vallejo de Trujillo

Por cuanto:

La Universidad, en la fecha, ha conferido el GRADO ACADÉMICO *de:*

BACHILLER EN INGENIERÍA CIVIL

a: **Deivis Junnior Solis Inocente**

Por tanto:

Le expide el presente **DIPLOMA** *para que se le reconozca como tal y se le otorgue los goces y privilegios que le confieren las leyes de la República.*

Trujillo, 14 *de* ABRIL *del* 2015



Registrado en el libro N° 3
A fojas 896 bajo el N° 9

SECRETARIO GENERAL
MG. VÍCTOR SANTISTEBAN CHÁVEZ

RECTOR
DR. FRANCISCO JOSÉ MIRÓ QUESADA RADA

DECANO
MG. RICARDO MANUEL DELGADO ARANA

RUC N° 10704004627

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

SOLIS INOCENTE DEIVIS JUNNIOR

Domiciliado en: ANCASH - CASMA - CASMA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 25/04/2019

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 25/04/2019

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 08/06/2016

Especialidades Ley 30225 :
3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A
5 - Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoría B
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría B (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría A

FECHA IMPRESIÓN: 07/06/2023

Nota:
* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar Imprimir

FICHA RUC : 10704004627
SOLIS INOCENTE DEIVIS JUNNIOR

Número de Transacción : 51564690

CIR - Constancia de Información Registrada

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social	:	SOLIS INOCENTE DEIVIS JUNNIOR
Tipo de Contribuyente	:	02-PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
Fecha de Inscripción	:	26/02/2013
Fecha de Inicio de Actividades	:	01/02/2013
Estado del Contribuyente	:	ACTIVO
Dependencia SUNAT	:	0143 - O.Z.CHIMBOTE-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal	:	HABIDO
Emisor electrónico desde	:	02/12/2014
Comprobantes electrónicos	:	RECIBO POR HONORARIO (desde 02/12/2014),FACTURA (desde 01/04/2022)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	:	-
Tipo de Representación	:	-
Actividad Económica Principal	:	7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
Actividad Económica Secundaria 1	:	4210 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL
Actividad Económica Secundaria 2	:	9609 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	:	MANUAL
Sistema de Contabilidad	:	MANUAL
Código de Profesión / Oficio	:	34- INGENIERO
Actividad de Comercio Exterior	:	**SIN ACTIVIDAD**
Número Fax	:	-
Teléfono Fijo 1	:	43 - 412443
Teléfono Fijo 2	:	-
Teléfono Móvil 1	:	- - 988785563
Teléfono Móvil 2	:	-
Correo Electrónico 1	:	deivis.solis@hotmail.com
Correo Electrónico 2	:	-

Domicilio Fiscal

Actividad Economica	:	7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
Departamento	:	ANCASH
Provincia	:	CASMA
Distrito	:	CASMA
Tipo y Nombre Zona	:	A.H. VILLAHERMOSA ETAPA III
Tipo y Nombre Vía	:	-
Nro	:	-
Km	:	-
Mz	:	N2
Lote	:	1
Dpto	:	-
Interior	:	-
Otras Referencias	:	-
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	:	OTROS.

Datos de la Persona Natural

Documento de Identidad	:	DNI 70400462
Cond. Domiciliado	:	DOMICILIADO
Fecha de Nacimiento o Inicio Sucesión	:	16/04/1990
Sexo	:	Masculino
Nacionalidad	:	PERUANA
País de procedencia	:	-

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Exoneración

		Marca de Exoneración	Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	06/05/2017	-	-	-
RENTA-4TA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	01/02/2013	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	06/05/2017	-	-	-
SENCICO	06/05/2017	-	-	-

Importante

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás

Recuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Buzón Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las notificaciones e información de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.

Para ir a su Buzón Electrónico *Ingrese Aquí*

DEPENDENCIA SUNAT
Fecha:01/06/2023
Hora:20:33


REPUBLICA DEL PERU
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
DNI 70400462 - 7
CUI
Primer Apellido
SOLIS
Segundo Apellido
INOCENTE
Pre Nombres
DEIVIS JUNNIOR
Nacimiento: Fecha y Ubigeo
16 04 1990 020505
Sexo
M
Estado Civil
S
Fecha Inscripción
23 04 2008
Fecha Emisión
17 11 2020
Fecha Caducidad
16 06 2024
70400462
SOLIS
I<PER70400462<5<<<<<<<<<<<<<<<
9004160M2406167PER<<<<<<<<<<<0
SOLIS<<DEIVIS<JUNNIOR<<<<<<<<<


CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO
Indice Der.
Departamento
ANCASH
Provincia
CASMA
Distrito
CASMA
Dirección
ASENT.H. VILLA HERMOSA ETAPA III MZ. N2 LT. 1
Observaciones
Donación de Organos SI
Grupo de Votación 239375

El que suscribe, JAMIL LITANO PAJUELO; identificado con DNI Nº 70187591 propietario de la vivienda familiar CERTIFICA:

CERTIFICADO DE TRABAJO

Que el ingeniero ***DEIVIS JUNNIOR SOLIS INOCENTE*** con CIP N° 181381, identificado con el Nº DNI 70400462, y con domicilio legal AV LIBERTAD MZ KB LOTE 3, HUAQUILLABAJA – CASMA –ANCASH. Ha trabajado como ingeniero **Residente de la obra**:

"CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE DOS NIVELES DE LA FAMILIA LITANO PAJUELO EN EL AA.HH. RAMIRO PRIALE MZ. B LT. 7 CASMA, PROVINCIA DE CASMA-DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Los trabajos efectuados se iniciaron a partir del 05 de Diciembre del 2016 – 15 de Junio del 2017.

El ing. DEIVIS JUNNIOR SOLIS INOCENTE, desempeño sus funciones con honestidad, esmero y responsabilidad sin ningún inconveniente demostrando su efectividad y profesionalismo

Se emite el presente certificado a solicitud del interesado y para los fines que estime conveniente.

Casma, 19 de Junio del 2017

LITANO PAJUELO JAMIL
DNI: 70187591



CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, DARWIN POOL ROQUE BAUTISTA; identificado con DNI Nº 725641546 propietario de la vivienda familiar CERTIFICA:

Que el ingeniero ***DEIVIS JUNNIOR SOLIS INOCENTE*** con CIP N° 181381, identificado con el Nº DNI 70400462, y con domicilio legal AV LIBERTAD MZ KB LOTE 3, HUAQUILLABAJA – CASMA – ANCASH. Ha ejercido Labores como **INGENIERO RESIDENTE DE LA OBRA:**

"CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE UN NIVEL DE LA FAMILIA BAUTISTA CERNA EN EL AA.HH. VISTA ALEGRE MZ. B LT. 9, NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Los trabajos efectuados se realizaron del 26 de Junio del 2017 – 28 de Octubre del 2017.

En el desempeño como INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, ha demostrado eficiencia, responsabilidad y Puntualidad.

Se emite el presente certificado a solicitud del interesado y para los fines que estime conveniente.

Nvo Chimbote, 05 de Noviembre del 2017

DARWIN P. ROQUE BAUTISTA
DNI:725641546

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

"TIERRA DE LA CULTURA SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS" REGION ANCASH – PERU
PALACIO MUNICIPAL – PLAZA DE ARMAS S/N – TELEFAX (043) 712063

Casma@anc.mp.gob.pe

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

El Gerente de Gestión Urbana y Rural de la Municipalidad Provincial de Casma; que suscribe otorga:

CONSTANCIA DE TRABAJO

HACE CONSTAR:

Que la el Ing. **DEIVIS JUNNIOR SOLIS INOCENTE** con CIP **N°181381**, identificado con DNI **Nº 70400462**, ha laborado prestando sus servicios personales y laborales como **SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS-GERENCIA DE GESTION URBANA Y RURAL** que dirijo, desde el **(24 de mayo del 2018)** hasta el **(31 de Diciembre del 2018),** de forma permanente e interrumpida. Durante su permanencia ha demostrado responsabilidad, puntualidad y eficiencia en el cargo.

Se expide la presente constancia a petición del interesado, y para los fines que éste considere convenientes.

Casma, 31 de Diciembre del 2018.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
GERENCIA DE GESTIÓN URBANA Y RURAL

ING. NADIA PAZ JARA
CIP 183850

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN
"TIERRA DEL MAJESTUOSO ULLAMPASH"
CASMA – ANCASH – PERU

"Año de la lucha contra la Corrupción e impunidad"

Yautan, 08 de Abril del 2019

CERTIFICADO DE TRABAJO

La Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural,
Certifica que el Ingeniero:

DEIVIS JUNNIOR SOLIS INOCENTE

Ingeniero Civil con CIP N° 181381, ha ejercido labores de **INGENIERO SUPERVISOR** DE LA OBRA ***"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR DE PUNCHAYHUACA DEL DISTRITO DE YAUTAN – PROVINCIA DE CASMA – DEPARTAMENTO DE ANCASH".*** Los trabajos efectuados se iniciaron a partir del 21 de Enero del 2019 hasta el 04 de Abril del 2019.

- EJECUTOR : GRUPO ALMA E.I.R.L.
- PLAZO DE EJECUCION : 60 DIAS CALENDARIOS
- PRESUPUESTO BASE : S/. 85,000.00 (INCLUIDO IGV)
- FECHA DE INICIO DE OBRA : 21/01/2019
- FECHA DE RECEPCION : 04/04/2019

En el desempeño como Ingeniero Supervisor de la Obra, ha demostrado eficiencia, responsabilidad y Puntualidad.

Se expide el presente documento a solicitud del Interesado para fines que se estime conveniente.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN
ING HEYNER G. GUTIERREZ ESQUIBEL
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN
"TIERRA DEL MAJESTUOSO ULLAMPASH"
CASMA – ANCASH – PERU

"Año de la lucha contra la Corrupción e impunidad"

Yautan, 01 de Noviembre del 2019

CERTIFICADO DE TRABAJO

La Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural,
Certifica que el Ingeniero:

DEIVIS JUNNIOR SOLIS INOCENTE

Ingeniero Civil con CIP N° 181381, ha ejercido labores de **INGENIERO SUPERVISOR** DE LA OBRA "***RENOVACION DE PISTAS; EN EL (LA) PASAJE FERMIN CARRION DE LA LOCALIDAD DE YAUTAN DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH***". Los trabajos efectuados se iniciaron a partir del 24 de abril del 2019 hasta el 13 de junio del 2019.

- EJECUTOR : CONSORCIO FERMIN CARRION
- PLAZO DE EJECUCION : 60 DIAS CALENDARIOS
- PRESUPUESTO BASE : S/. 230,016.31 (INCLUIDO IGV)
- FECHA DE INICIO DE OBRA : 24/04/2019
- FECHA DE RECEPCION : 13/06/2019

En el desempeño como Ingeniero Supervisor de la Obra, ha demostrado eficiencia, responsabilidad y Puntualidad.

Se expide el presente documento a solicitud del Interesado para fines que se estime conveniente.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN
ING. HEYNER D. GUERRERO ESQUIBEL
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAS

"Oportunidad para todos"

"Año de la Universalizacion de la Salud"

El Gerente de la Gerencia de Acondicionamiento y Desarrollo Urbano y Rural, que suscribe otorga

CONSTANCIA DE TRABAJO

Mediante el presente documento se expresa constancia que el Ing. Deivis Junnior Solis Inocente con RUC N° 10704004627 y CIP N° 181381 ha Trabajado como INGENIERO RESIDENTE en la ejecución de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL YURA-VILCABAMBA, SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE PAUCAS - HUARI - ANCASH" a favor de la Municipalidad Distrital de Paucas, tal como se detalla a continuación:

CONTRATO	OBJETO	PERIODO
CONTRATACION DE SERVICIOS N°78 – 2019 – MDP/GM	INGENIERO RESIDENTE en la ejecución de la Obra: "CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL YURA-VILCABAMBA, SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE PAUCAS - HUARI - ANCASH"	DEL 16/09/2019 AL 31/10/2019

Cabe mencionar que el profesional ha demostrado eficiencia y responsabilidad en el tema contratado y no ha incurrido en penalidad alguna.

Se expide la presente a solicitud del interesado

Paucas, 20 de enero del 2020

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAS
Ing. Edwardo P. Alcantara De la Cruz
GERENTE DE GADUR

CONSTANCIA DE TRABAJO

Raquia, 25 de Mayo del 2020

Por medio de la presente hago constar *Que,* el Ing. DEIVIS JUNNIOR SOLIS INOCENTE, identificado con DNI Nº 70400462, con domicilio legal cal. Independencia Mza. E2 lote. 38 PV Casma Zona Este, Distrito de Casma, Provincia de Casma, ha trabajado como Ingeniero Residente de la obra:

"MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº86267 DEL ANEXO DE JARACHACRA - DISTRITO DE ANTONIO RAYMONDI - PROVINCIA DE BOLOGNESI - ANCASH"

Los trabajos efectuados se iniciaron a partir del 04 de Noviembre del 2019 hasta 08 de febrero del 2020.

El Ing. DEIVIS JUNNIOR SOLIS INOCENTE, identificado con DNI Nº 70400462, desempeño sus funciones con honestidad, esmero y responsabilidad sin ningún inconveniente demostrando su efectividad y profesionalismo.

Se expide la presente Certificado a solicitud de la interesada, para los fines que estime conveniente.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ANTONIO RAYMONDI
PROV. BOLOGNESI - ANCASH
Rolando Cueva Bautista
DNI 15597769
ALCALDE

CERTIFICADO

La que suscribe: Arq. Karla Fernanda Otiniano Plasencia, Representante legal de la empresa **K&F SAC**

Que el ingeniero **DEIVIS JUNNIOR SOLIS INOCENTE** , identificado con DNI. N° 70400462 y con CIP N° 181381 ha prestado sus servicios como Ingeniero Residente en la obra:

"CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL (LA) I.E. 2110 – CASCAS EN LA LOCALIDAD 9 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CASCAS – PROVINCIA GRAN CHIMU – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" en el periodo del 10 de febrero al 11 de marzo del 2020.

Siendo su desempeño durante la ejecución de la obra: eficiente, responsable y con honradez.

Se expide el presente certificado para sus fines que el interesado estime conveniente.

Trujillo, marzo del 2020

Arq. Karla F. Otiniano Plasencia
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. KARLA FERNANDA OTINIANO PLASENCIA
D.N.I. Nro. 41864844
REPRESENTANTE LEGAL K&F SAC

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CONSTANCIA DE TRABAJO

EL JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ

HACE CONSTAR:

Que el **Ing. Deivis Junnior Solis Inocente**, identificado con DNI Nº 7040462, ha prestado sus servicios personales como apoyo en los servicios de control posterior y recopilación de información contemplados en el Plan Nacional de Control 2020 de la Gerencia Regional de Control de Ancash, en conformidad a la orden de servicio n.° 0001445, en la Oficina de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Carhuaz desde el 17 de agosto de 2020 hasta el 28 de diciembre de 2020, participando como **Jefe de Comisión de Control** de las actividades siguientes:

- Servicio de Control Simultáneo en la modalidad de Visita de Control al proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Transitabilidad en ambos Márgenes de la Autopista Huaraz – Caraz Desde Jr. Aurora Hasta la Quebrada Bruja Armanán, Distrito de Carhuaz – Provincia De Carhuaz – Departamento De Ancash"

- Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, relacionado al "Mantenimiento del camino Vecinal Tramo: Tramo III: Puente Ecash, Auquipampa, Ampu, Quimish, Maya, Puente Lelis-Cruce Quemish, Llanllapu; Carhuaz – Ancash"

- Servicio de Control Simultáneo en la modalidad de Orientación de Oficio al "Mantenimiento del camino vecinal tramo: Tramo VI: Shilla, Curihuanca, Llipta, Yanarumi, San Gabriel – Cruce pista Carhuaz Chacas, Congar, Belen – Yanuna, Marcash, Cushicatac; Carhuaz – Ancash"

- Servicio de Control Simultáneo en la modalidad de Orientación de Oficio al proyecto: "Mejoramiento de los servicios de transitabilidad peatonal y vehicular en la calle principal del Sector Fundo Aco, Distrito de San Miguel de Aco – Carhuaz – Ancash"

En el desempeño como ingeniero, ha demostrado eficiencia, responsabilidad y puntualidad.

Se expide la presente **constancia** a petición del interesado, y para los fines que éste considere convenientes.

Carhuaz, 18 de enero de 2021.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - CARHUAZ

Ing. Ricardo Arturo Alberto Gamarra Caballero
Jefe del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Carhuaz
Código CGR n.° 71850

CONSORCIO CASMA

GRUPO ALMA E.I.R.L. RUC: 20600950801

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, representante legal del CONSORCIO CASMA certifica que el Ingeniero.:

DEIVIS JUNNIOR SOLIS INOCENTE

Identificado con el N° DNI: 70400462 - CIP: 181381, laboro en nuestra empresa como ingeniero residente de la obra: **"REMODELACION DE AMBIENTES DE USOS MULTIPLES; EN EL MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE YAUTAN, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, desde el 14 de enero del 2021 al 31 de marzo del 2021.

El Ing. Deivis Solis Inocente durante su permanencia demostró responsabilidad, honestidad y dedicación en las labores que le fueron encomendadas,

Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que crea conveniente.

Yautan, abril del 2021.

CONSORCIO CASMA

CARLOS ANDRES LOCKUAN MEJIA
REPRESENTANTE COMUN

J&M CONTRATISTAS y CONSULTORES S.A.C.
RUC: 20531704046
ELABORACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INGENIERIA, CIVILES, VIALES, SANEAMIENTO, ELECTRIFICACION
ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

CERTIFICADO DE TRABAJO

EL QUE SUSCRIBE, EN REPRESENTACION DE **CONTRATISTAS Y CONSULTORES J&M S.A.C.** con RUC N° **20531704046**

CERTIFICA:

Que, don **SOLIS INOCENTE DEIVIS JUNNIOR** IDENTIFICADO CON DNI N° 70400462 Y CON REGISTRO CIP N° 181381, HA LABORADO EN ESTA EMPRESA DESDE 23 DE JUNIO DE 2021 HASTA EL 20 DE SETIEMBRE DEL 2021 OCUPANDO EL CARGO DE RESIDENTE DE OBRA, EN LA OBRA DENOMINADA: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR SAN JOSE OBRERO Y EN LAS CALLES DE SAN MARTIN, BAMBAREN, ANCASH BAJO, CESAR VALLEJO, RICARDO PALMA Y POMABAMBA, DEL C.P. SAN JACINTO EN EL DISTRITO DE NEPEÑA-SANTA- ANCASH"**

SE EXPIDE EL PRESENTE DOCUMENTO, DE ACUERO A LEY, PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO CREA CONVENIENTE.

CHIMBOTE, 23 DE SETIEMBRE DEL 2021

J&M CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.
Villavicencio Iquiniche Miguel Angel
GERENTE GENERAL

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CENTRO CIVICO

El que suscribe, **JORGE LARS ONZALES BARRETO**; identificado con DNI N° 41140843, Representante Legal del Consorcio Centro Cívico, **CERTIFICA:**

CERTIFICADO DE TRABAJO

Que, el Ing. **DEIVIS JUNNIOR SOLIS INOCENTE,** identificado con DNI Nº 70400462, con domicilio legal en la Mz N2 Lote 1, del A.H Villahermosa etapa III, distrito de Casma, Provincia de Casma, Ancash, ha trabajado como Ingeniero Residente de Obra:

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE PROGRESO, CALLE UNO, CALLE DOS Y PASAJES S/N DEL P.V.H.U CENTRO CÍVICO, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA – ANCASH"

Los trabajos efectuados se iniciaron a partir del 15 de octubre del 2021 – 02 de abril del 2022.

El Ing. **DEIVIS JUNNIOR SOLIS INOCENTE,** identificado con DNI Nº 70400462, desempeño sus funciones con honestidad, esmero y responsabilidad sin ningún inconveniente demostrando su efectividad y profesionalismo.

Se expide la presente Certificado a solicitud de la interesada, para los fines que estime conveniente.

Casma, 11 de abril del 2022.

CONSORCIO CENTRO CIVICO
Jorge Lars Gonzales Barreto
REPRESENTANTE COMUN

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VALLEJO

"Año del fortalecimiento de la soberanía nacional"

El que suscribe, WILLIAM RICHARD GUEVARA REYES, identificado con DNI N° 32131956, en calidad de Representante Común del CONSORCIO VALLEJO, CERTIFICA:

CERTIFICADO DE TRABAJO

Que, el Ing. DEIVIS JUNNIOR SOLIS INOCENTE, identificado con DNI Nº 70400462, con domicilio legal en la Mz N2 Lote 1, del A.H Villahermosa etapa III, distrito de Casma, Provincia de Casma, Ancash, ha trabajado como Ingeniero Residente de la Obra:

"CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE BIENESTAR ESTUDIANTIL; EN LA I.E. 88101 CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA CASMA EN LA LOCALIDAD DE CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI N° 2535240".

Los trabajos efectuados se iniciaron a partir del 13 de abril del 2022 hasta el 14 de octubre del 2022.

El Ing. DEIVIS JUNNIOR SOLIS INOCENTE, identificado con DNI Nº 70400462, desempeño sus funciones con honestidad, esmero y responsabilidad sin ningún inconveniente demostrando su efectividad y profesionalismo.

Se expide la presente Certificado a solicitud de la interesada, para los fines que estime conveniente.

Casma, 08 de agosto del 2021.

CONSORCIO VALLEJO
WILLIAM R. GUEVARA REYES
DNI N° 32131956
REPRESENTANTE COMUN

RUC N° 10704004627

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

SOLIS INOCENTE DEIVIS JUNNIOR

Domiciliado en: CAL. INDEPENDENCIA MZA. E2 LOTE. 38 PV CASMA ZONA ESTE ANCASH CASMA CASMA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 25/04/2019

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 25/04/2019

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 08/06/2016

Especialidades Ley 30225 :
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría A (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría A
3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A
5 - Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoría A

FECHA IMPRESIÓN: 03/05/2019

Nota:
* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar Imprimir

CORPORACIÓN DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL
C.A.C.P. S.R.L.

CACP PERÚ
ASESORÍA Y CAPACITACIÓN

CERTIFICADO

Otorgado a:

Ing. DEIVIS JUNNIOR SOLIS INOCENTE

Por haber concluido y APROBADO satisfactoriamente el Curso Teórico-Práctico:

RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

Desarrollado en el Auditorio Central de la Consultora CACP PERÚ - Sede Nuevo Chimbote - Ancash, desde el 29 de Septiembre del 2019 hasta el 06 de Octubre del 2019, con una duración de 20 horas académicas y obteniendo una nota aprobatoria de 17 (Diecisiete).

Por tanto se expide el presente CERTIFICADO para que se le reconozca como tal.

Nvo. Chimbote, 07 de Octubre del 2019.

GERENTE GENERAL

Ing. Mijail André Núñez Gómez
GERENTE GENERAL
Reg. CBP Nº 13495

PONENTE

Mg. Luis Humberto Diaz Huiza
PONENTE C.A.C.P. S.R.L.
Reg. CIP Nº 36994

Registro Nº 07

TEMARIO:

TEMA 01: RESIDENCIA DE OBRAS.
- Funciones del Ing. Residente. Planeamiento y Organización de Obra.
- Gestión de Obra. Seguridad en Obras.
- Costos y presupuestos. Programación de Obra Ms Project.
- Mejorar la productividad y control en obra.
- Aplicar la programación y control de la obra.
- Analizar el contenido de un expediente técnico.
- Realizar el trazado, replanteo y niveles de obra.
- Hacer las cimentaciones de acuerdo al tipo de suelo.
- Controlar la calidad del concreto.
- Controlar los procedimientos constructivos de albañilería. Controlar los procedimientos constructivos de fierrería.
- Controlar el concreto en obra. Controlar los procedimientos constructivos de encofrado.
- Controlar las instalaciones eléctricas. Controlar las instalaciones de gas.
- Controlar las instalaciones sanitarias. Controlar los procedimientos constructivos de los acabados.
- Controlar los equipos y maquinarias de construcción. Organizar el control administrativo y legal de la obra

TEMA 02:SUPERVISIÓN DE OBRAS.
- Normas vigentes para la supervisión de obras en el sector público
- El Supervisor de Obras Públicas
- Requisitos para Supervisor en procesos de selección de obras públicas
- Control Técnico - Revisión del expediente técnico
- Control de obra: Control de materiales, concreto, refuerzo, calidad de obra, etc.
- Control económico.
- Control de la Obra y Cálculo de la ruta crítica con Ms Project.
- Adicionales de supervisión y normas de contraloría

CACP PERÚ
ASESORÍA Y CAPACITACIÓN

CORPORACIÓN DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL C.A.C.P. S.R.L.

CERTIFICADO DE ESTUDIOS

La Corporación de Asesoramiento y Capacitación Profesional C.A.C.P. S.R.L., organizador del Curso Teórico-Práctico en **RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS,** desarrollado del 29 de Septiembre del 2019 hasta el 06 de Octubre del 2019, en la ciudad de Nuevo Chimbote - Ancash certifica que:

Ing. DEIVIS JUNNIOR SOLIS INOCENTE

Descripción de la estructura curricular:

TEMA	ESTRUCTURA CURRICULAR	HORAS ACADÉMICAS
1	RESIDENCIA DE OBRAS.	10 Hrs.
2	SUPERVISIÓN DE OBRAS	10 Hrs.
	TOTAL	**20 Hrs.**

Ha concluido y **APROBADO** con las siguientes calificaciones:

CRITERIOS Y EVALUACIÓN	PESO	NOTA
TRABAJO FINAL	40 %.	17
EXÁMEN	60 %.	17
PROMEDIO FINAL		17

Así consta en los registros institucionales a los que nos remitimos.

CONSULTORIA C.A.C.P. S.R.L.

Libro: 02
Folio: 218
Registro: 07

CORPORACIÓN DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL C.A.C.P. S.R.L.

CACP PERÚ
ASESORÍA Y CAPACITACIÓN

TEMARIO:

TEMA 01: INTRODUCCIÓN.
- ✓Ciclo de inversión del proyecto según el INVIERTE.PE
- ✓Fase de ejecución del proyecto según el ciclo de inversión del INVIERTE.PE
- ✓Definición de Expediente Técnico o Estudio Definitivo
- ✓Elaboración del Expediente Técnico o documento equivalente de acuerdo al INVIERTE.PE
- ✓Consideraciones durante la elaboración del Expediente Técnico
- ✓Lineamientos generales para la elaboración de Expedientes Técnicos vinculando el INVIERTE.PE y la GESTION DE PROYECTOS (según la guía del PMBOK 6ta Edición).

TEMA 02: ORGANIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.
- ✓Procesos para dar inicio la elaboración del Expediente Técnico
  - -Conceptos básicos de la gestión de integración para el inicio de los proyectos.
  - -Desarrollo del Acta de Constitución del proyecto.
  - -Identificación de los interesados y su posicionamiento
- ✓Planificación para elaborar el Expediente Técnico (según el contenido del Expediente Técnico).
  - -Conceptos básicos sobre la gestión del alcance y creación del EDT.
  - -Conceptos básicos para la gestión del cronograma
  - -Conceptos básicos sobre la gestión de costos
  - -Conceptos básicos sobre la gestión de comunicaciones
  - -Conceptos básicos sobre la gestión de riesgos
  - -Planificación Utilizando el MS Project

TEMA 03: DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.
- ✓Resumen ejecutivo
- ✓Memoria descriptiva
- ✓Especificaciones técnicas
- ✓Costos y Presupuestos (aplicaremos el S10).
- ✓Cronogramas de Obra
- ✓Estudios básicos de ingeniería

TEMA 04: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y ADMINISTRATIVO.
- ✓Registro de avances según lo planificado
- ✓Actualización del progreso del proyecto
- ✓Seguimiento y control utilizando el MS Project
- ✓Aplicación de Last Planner al control de proyectos
- ✓Técnicas básicas de control de riesgos en proyectos
- ✓Relación entre el Invierte.pe

TEMA 05: CIERRE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.
- ✓Herramientas para el desarrollo de lecciones aprendidas
- ✓Metodologías para el cierre de proyectos.

CERTIFICADO

Otorgado a:

Ing. DEIVIS JUNNIOR SOLIS INOCENTE

Por haber concluido y APROBADO satisfactoriamente el Curso Teórico-Práctico:

ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

Desarrollado en el Auditorio Central de la Consultora CACP PERÚ - Sede Nuevo Chimbote - Ancash, desde el 25 de Agosto de 2019 hasta el 08 de Septiembre de 2019, con una duración de 40 horas académicas y obteniendo una nota aprobatoria de 17 (Diecisiete).

Por tanto se expide el presente CERTIFICADO para que se le reconozca como tal.

Nvo. Chimbote, 09 de Septiembre del 2019.

GERENTE GENERAL

Blgo. Milan André Núñez Gómez
C.A.C.P. GERENTE GENERAL
Reg. CBP Nº 13495

PONENTE

Mg. Kenny Zenon Castro Quispe
PONENTE C.A.C.P. S.R.L.
Reg. CIP N° 107964

Registro N° 40

CACP PERÚ
ASESORÍA Y CAPACITACIÓN

CORPORACIÓN DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL C.A.C.P. S.R.L.

CERTIFICADO DE ESTUDIOS

La Corporación de Asesoramiento y Capacitación Profesional C.A.C.P. S.R.L., organizador del Curso Teórico-Práctico en **"ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS,** desarrollado del 25 de Agosto de 2019 al 08 de Septiembre de 2019, en la ciudad de Nuevo Chimbote-Ancash certifica que:

Ing. DEIVIS JUNNIOR SOLIS INOCENTE

Descripción de la estructura curricular:

TEMA	ESTRUCTURA CURRICULAR	HORAS ACADÉMICAS
1	INTRODUCCIÓN	08 Hrs.
2	ORGANIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	08Hrs.
3	DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	08 Hrs.
4	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO).	08 Hrs.
5	CIERRE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	08 Hrs.
TOTAL		**40 Hrs.**

Ha concluido y **APROBADO** con las siguientes calificaciones:

CRITERIOS Y EVALUACIÓN	PESO	NOTA
TRABAJO FINAL	40 %.	17
EXÁMEN	60 %.	17
PROMEDIO FINAL		**17**

Así consta en los registros institucionales a los que nos remitimos.

CONSULTORIA C.A.C.P. S.R.L.

Libro: 02
Folio: 199
Registro: 70

Colegio de Economistas de Lima

Escuela Global de Educación Continua | EGEC PERÚ

DIPLOMA

Se otorga el presente a:

DEIVIS JUNNIOR SOLIS INOCENTE

Por haber concluido y aprobado el diplomado en

GESTIÓN PÚBLICA

Realizado del 04 de mayo al 06 de julio de 2020, con una duración de doscientos cuarenta horas académicas.

Lima, 07 de julio de 2020

Ms. Econ. Carlos Alfredo Castro Gao
Decano
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA

Lic. Zoila Socorro Jamanca Amez
Directora Académica
EGEC PERÚ

MÓDULOS DEL PROGRAMA	
MÓDULO I	PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PÚBLICO
MÓDULO II	TEORÍA POLÍTICA Y GOBERNABILIDAD
MÓDULO III	NORMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL
MÓDULO IV	ÉTICA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Duración: 2 meses

Horas académicas: 240

El presente diploma consta en los registros institucionales a los que nos remitimos.

Libro N°: 51

Folio N°: 051

Registro N°: 07

Colegio de Economistas de Lima

Escuela Global de Educación Continua | EGEC PERÚ

DIPLOMA

Se otorga el presente a:

DEIVIS JUNNIOR SOLIS INOCENTE

Por haber concluido y aprobado el diplomado en

CONTRATACIONES DEL ESTADO

Realizado del 04 de mayo al 06 de julio de 2020, con una duración de doscientos cuarenta horas académicas.

Lima, 07 de julio de 2020

Ms. Econ. Carlos Alfredo Castro Gao
Decano
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA

Lic. Zoila Socorro Jamanca Amez
Directora Académica
EGEC PERÚ

MÓDULOS DEL PROGRAMA	
MÓDULO I	ASPECTOS GENERALES
MÓDULO II	ACTOS PREPARATORIOS
MÓDULO III	PROCESOS DE SELECCIÓN
MÓDULO IV	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Duración: 2 meses

Horas académicas: 240

El presente diploma consta en los registros institucionales a los que nos remitimos.

Libro N°: 51

Folio N°: 051

Registro N°: 08
