ID de actividad	Nombre de actividad	Duración original	Inicio	Finalización	Predecesor	Sucesores	Costo total presupuestado
RC SUMINISTRO DE ROCA PARA EL SUB-PROYECTO A2-1 Y A		125.00	20-Feb-25	24-Jun-25			S/.14,140,612.38
A1000	CARTA DE ADJUDICACIÓN (LOA) | KOM	0.00	20-Feb-2			A1010	S/.0.00
RC.1 MOVILIZACIÓN DEL SUBCONTRATISTA		4.00	20-Feb-2	23-Feb-25			S/.749,452.45
A1010	PRESENTACIÓN DE CAMOS A MÉDICO OCUPACIONA	1.00	20-Feb-2	20-Feb-25	A1000	A1020	S/.28,281.22
A1020	PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PERSONA	1.00	21-Feb-2	21-Feb-25	A1010	A1030	S/.21,210.92
A1030	HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS	1.00	22-Feb-2	22-Feb-25	A1020	A1040, A	S/.21,210.92
A1040	INDUCCIÓN DE PERSONAL	1.00	23-Feb-2	23-Feb-25	A1030		S/.14,140.61
A1090	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1.00	23-Feb-2	23-Feb-25	A1030	A1100, A	S/.664,608.78
RC.2 ROCA EN DIQUES		120.00	24-Feb-2	23-Jun-25			S/.12,726,551.15
RC.2.1 SUBPROYECTO A3		120.00	24-Feb-2	23-Jun-25			S/.12,726,551.15
A1100	DIQUE A3-D-01	17.00	24-Feb-2	12-Mar-25	A1090	A1110	S/.1,414,061.24
A1110	DIQUE A3-D-02	103.00	13-Mar-2	23-Jun-25	A1100	A1070	S/.5,656,244.95
A1120	DIQUE A3-I-01	17.00	24-Feb-2	12-Mar-25	A1090	A1130, A	S/.1,414,061.24
A1130	DIQUE A3-I-02	20.00	13-Mar-2	01-Abr-25	A1120	A1140	S/.1,414,061.24
A1140	DIQUE A3-I-03	83.00	02-Abr-2	23-Jun-25	A1130, A		S/.2,828,122.48
RC.3 ACTIVIDADES DE DESMOVILIZACIÓN		1.00	24-Jun-2	24-Jun-25			S/.664,608.78
A1070	DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1.00	24-Jun-2	24-Jun-25	A1110	A1080	S/.664,608.78
A1080	FIN DE PROYECTO	0.00		24-Jun-25	A1070		S/.0.00

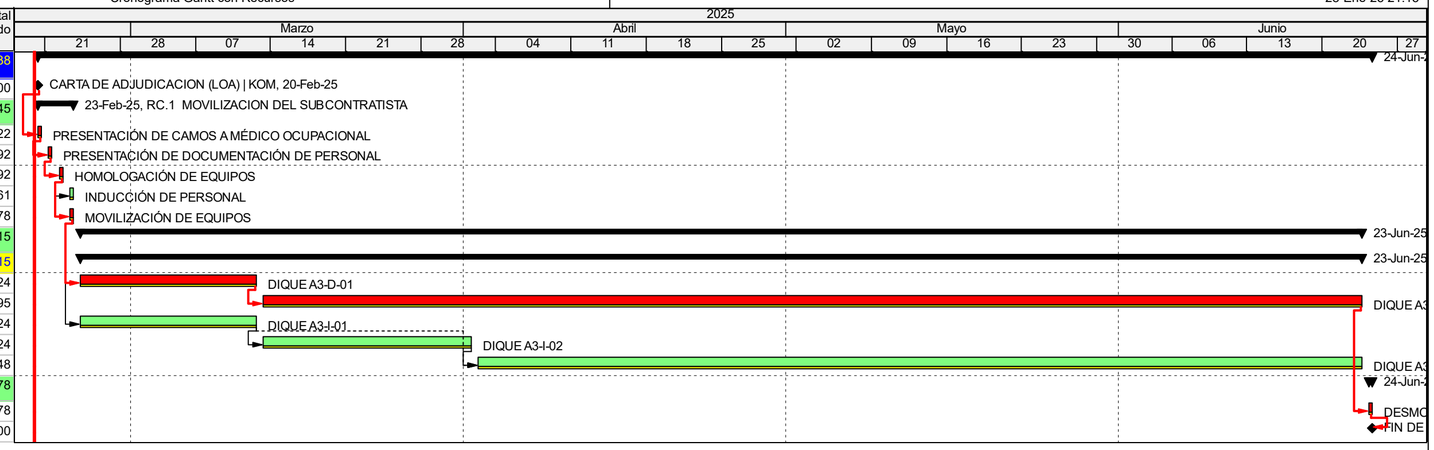

Actual Level of Effort | Actual Work | Critical Remaining Work | summary
Primary Baseline | Remaining Work | Milestone

TASK filter: Todas las actividades

© Oracle Corporation
